



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.1.0.-114

L'anno 2023 il giorno 08 del mese di Novembre il sottoscritto Arch. Emanuela Torti in qualità di Dirigente di Attuazione Opere Pubbliche, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

Patto per la Città di Genova finanziato con risorse F.S.C. Programmazione 2014-2020. Restauro e manutenzione straordinaria dei serramenti esterni del Museo di Sant'Agostino, sito in Genova, Piazza Sarzano 35r - 2° stralcio relativo a quattro serramenti di grandi dimensioni che insistono sul prospetto principale di Piazza Sarzano.

Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

CUP: B34E17000490001 –MOGE: 15482 – CIG 95206332E5.

Contratto d'Appalto Rep. 217 del 08/02/2023 per un importo di Euro 133.788,60 oltre IVA.

Adottata il 08/11/2023

Esecutiva dal 29/11/2023

08/11/2023	TORTI EMANUELA
------------	----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.1.0.-114

Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Patto per la Città di Genova finanziato con risorse F.S.C. Programmazione 2014-2020. Restauro e manutenzione straordinaria dei serramenti esterni del Museo di Sant'Agostino, sito in Genova, Piazza Sarzano 35r - 2° stralcio relativo a quattro serramenti di grandi dimensioni che insistono sul prospetto principale di Piazza Sarzano.

CUP: B34E17000490001 –MOGE: 15482 – CIG 95206332E5

Contratto d'Appalto – Rep. n. 217 del 08/02/2023 per un importo di Euro 133.788,60 oltre I.V.A.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Su proposta del R.U.P. Arch. Silvia Toccafondi

Premesso che:

- il D.lgs. 31/05/2011, n 88, e in particolare l'art 4, dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art 61 della legge 27/12/2002, n 289 (legge finanziaria 2003) e s.m.i., sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
- la L. 27/12/2013, n 147 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., ed in particolare il comma 6 dell'art 1, individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;
- la Delibera CIPE n 25 del 10/08/2016 definisce le aree tematiche e le relative dotazioni finanziarie in base alle quali devono articolarsi i Patti per lo sviluppo, nonché le regole di funzionamento del FSC;
- con Deliberazione n 67 del 07/04/2017 la Giunta Comunale ha preso atto della stipula, in data 26/11/2016, del "Patto per la Città di Genova - Interventi per lo sviluppo economico, la coesione

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

sociale e territoriale della Città di Genova”, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco della Città di Genova;

- il suddetto Patto, sulla base dell’art 2, comma 203, della L 23/12/1996, n 662 è da intendersi come accordo tra Amministrazione Centrale e Città attraverso cui le Parti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione degli obiettivi d'interesse comune o funzionalmente collegati;

- la Delibera CIPE n 56 del 01/12/2016 assegna le risorse del FSC per la realizzazione di ciascun Patto e, nello specifico, per la realizzazione del Patto per la Città Metropolitana di Genova viene assegnata una dotazione finanziaria di Euro 110.000.000;

- per la gestione dei finanziamenti, con Deliberazione della Giunta Comunale n 87 del 20/04/2017 è stato approvato il Protocollo operativo siglato in data 31/03/2017 tra il Comune di Genova e la Città Metropolitana per la realizzazione del Patto, che attribuisce al Comune di Genova risorse pari ad Euro 69.000.000;

- con Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 26 febbraio 2020, è stato approvato il Programma Triennale 2020-2022, che prevede nell’annualità 2020, il titolo: “Museo di Sant’Agostino: interventi di prevenzione incendi e messa in sicurezza” (MOGE n. 15482) per l’importo complessivo di euro 1.500.000,00 (di cui euro 1.495.404,00 di fondo pluriennale vincolato anno 2020, euro 375,00 di avanzo vincolato 2020 ed euro 4.221,00 di spese antecedenti il triennio);

- con delibera della Giunta Comunale n. 286 del 17 ottobre 2019, la Civica Amministrazione ha fornito, per la struttura museale di che trattasi, specifici indirizzi per l'utilizzo delle risorse afferenti al finanziamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) Programmazione 2014-2020 (Patto per la Città di Genova) nell'ambito delle attività di messa a norma degli edifici istituzionali, individuando come prioritaria la manutenzione straordinaria dei serramenti, ed altresì la messa a norma impiantistica ai fini della prevenzione incendi e la messa in sicurezza della struttura museale.

Premesso altresì che:

- a seguito del suddetto provvedimento sono stati appaltati e conclusi due distinti lavori per il restauro e manutenzione straordinaria di una parte dei serramenti esterni, ed altresì la messa a norma impiantistica ai fini della prevenzione incendi e la messa in sicurezza della struttura museale;

- nell’ambito dei lavori di “Restauro e manutenzione straordinaria dei serramenti esterni del museo di Sant’Agostino” iniziati nell’ottobre 2020 e collaudati nel novembre 2021 ed eseguiti dall’impresa CO.GE.AS s.r.l., aggiudicataria dei lavori, è rimasta pendente la necessità di mettere in sicurezza i quattro grandi serramenti che insistono sulla facciata principale del museo in Piazza Sarzano e sono stati giudicati da sostituire come di seguito s’illustra per motivi di pericolo;

- il Comune in relazione alla stabilità e sicurezza dei serramenti albiniani suddetti ha commissionato al DICCA Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale, uno studio sulla sicurezza dei vetri “monolastra temprati” impiegati nei serramenti del museo. In data 2/11/2021 il DICCA fornisce uno studio sulla materia specifica, corredato da prove di laboratorio in galleria del vento

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

giungendo alla conclusione che i serramenti del tipo “a tutto vetro” non rispettano gli standard di sicurezza richiesti dalle normative vigenti;

- a seguito di tutto quanto sopra, con Determinazione Dirigenziale 2022/212.1.0.-38 del 10/08/2022, è stata affidato l’incarico a professionista esterno arch. Mario Battistrada per la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere in oggetto;

- in ossequio al succitato avviso di estensione del vincolo di tutela del 26/01/2021 si è provveduto si è provveduto a richiedere il parere alla competente Soprintendenza con nota prot. 29/09/2022.0369156.U;

- la Soprintendenza, ha espresso parere favorevole alla sostituzione ex novo dei quattro serramenti albiniani con prescrizioni con nota prot .15/11/2022.0434232.E;

- le opere a progetto sono state previste nel Programma Triennale 2022-2024, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22/12/2021 inseriti nella 5 variazione approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n 71.del 29/11/2022 per l’importo di **euro 161.156,52**, e sono finanziati nel programma “Patto Per La Città Di Genova Finanziato Con Risorse F.S.C. Programmazione 2014-2020” come da Determinazione Dirigenziale n. 2022-212.1.0.-62 adottata il 10/11/2022;

- il progetto definitivo relativo ai quattro serramenti di grandi dimensioni del Museo di Sant’Agostino posizionati sulla facciata che insiste su Piazza Sarzano è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.2022/272 del 24/11/2022 per una cifra complessiva di quadro economico pari ad € **161.156,52**;

- con determinazione dirigenziale della Direzione Attuazione Opere Pubbliche 2022-212.1.0.-82 del 14.12.2022 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del “Patto per la Città di Genova finanziato con risorse F.S.C. Programmazione 2014-2020 - Restauro e manutenzione straordinaria dei serramenti esterni del Museo di Sant’Agostino, sito in Genova, Piazza Sarzano 35r - 2° stralcio relativo a quattro serramenti di grandi dimensioni che insistono sul prospetto principale di Piazza Sarzano” per un importo complessivo dei lavori stessi , “a misura”, da porre a base di gara, confermando il quadro economico di Euro 161.156,52, di cui Euro 136.300,26 per lavori a misura e Euro 4.748,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA al 10%;

- in virtù dell’importo dei lavori inferiore a 150.000,00 si è proceduto all’affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 120 del 11/09/2020, e con la medesima Determinazione Dirigenziale della Direzione Attuazione Opere Pubbliche 2022-212.1.0.-82 del del 14.12.2022, esecutiva in data 27/12/2022 sono stati aggiudicati i lavori di “Restauro e manutenzione straordinaria dei serramenti esterni del Museo di Sant’Agostino, sito in Genova, Piazza Sarzano 35r - 2° stralcio relativo a quattro serramenti di grandi dimensioni che insistono sul prospetto principale di Piazza Sarzano” a favore ditta Panzetta S.r.l., con sede legale in Torino, Via F. Cigna 44 – C.A.P. 10152 - C.F. e P. I.V.A. 04240520017, con il ribasso offerto del 5% per un importo contrattuale risultante di Euro per un importo complessivo di Euro 134.233,61 di cui Euro 4.748,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A. al 10% di legge;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- in data 08/02/2023 è stato stipulato il Contratto d'appalto con Rep. n. 217/2023 per un importo di Euro 134.233,61 di cui Euro 4.748,36 per oneri della sicurezza oltre IVA al 10%.

Rilevato che:

- i lavori sono stati consegnati in data 15.02.2023, con Verbale Prot. NP 16/02/2023.0000380.I, senza riserva alcuna da parte dell'Impresa;

- nel corso dei lavori l'appaltatore ha presentato un'istanza di proroga (Prot. 14/04/2023.0165924.E), e conseguentemente è stato assegnato un maggior tempo utile al termine di ultimazione dei lavori (Rep. NP 17/04/2023.0000823.I) di 10 giorni naturali, successivi e consecutivi per completare i lavori;

- in data 20/04/2023 i lavori sono stati conclusi nella loro essenzialità, come risultante da verbale prot. NP 28/04/2023.0000908.I, redatto in pari data dal Direttore dei Lavori, concedendo 25 giorni per opere di finitura marginali non incidenti all'uso ed alla funzionalità dei lavori stessi, quindi sino al 15/05/2023; conclusione poi confermata con atto prot. NP 19/05/2023.0001079.I;

- nel corso della visita di collaudo del 15.05.2023, effettuata dal Direttore dei Lavori per la verifica delle opere di finitura richieste nel verbale di fine lavori, e la presa d'atto della fornitura dei vetrocamera con serigrafia anch'essi richiesti con Ods n.1.

Considerato che:

- l'importo netto dei lavori risulta inferiore a 1.000.000,00 di Euro ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, è prevista la redazione del certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori;

- il conto finale, redatto dal Direttore dei Lavori in data 21/06/2023 e firmato senza riserve dall'Appaltatore in pari data, ammonta complessivamente, al netto dell'IVA e al lordo delle trattenute di garanzia, ad Euro 133.823,30 così suddivisi:

LAVORI A MISURA.....	Euro	125.775,17
ONERI DELLA SICUREZZA.....	Euro	4.709,36
Noleggi	Euro	3.338,77
<u>Manodopera in economia</u>	<u>Euro</u>	<u>0,00</u>
TOTALE (IVA esclusa)	Euro	133.823,30
A dedurre:		
Importo totale dell'acconto pagato all'impresa (SAL N. 1) al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni (Euro 669,12):	Euro	- 106.389,52
<u>Recupero del 20% dell'anticipazione contrattuale.....</u>	<u>Euro</u>	<u>- 26.846,72</u>
Credito netto all'impresa quale rata di saldo (IVA esclusa)	Euro	587,06

- in data 06/10/2023 il Direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione (prot NP. 13/10/2023.0002253.I allegato quale parte integrante del presente provvedimento), dal quale risulta, come indicato nelle premesse, l'ordine in sede di collaudo di ulteriori lavori di dettaglio risultanti

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

utile al completamento dell'opera, tali maggiori lavori hanno comportato i seguenti importi aggiuntivi ritenuti congrui dalla DL:

A sommare:

serigrafia su vetrocamera di cui ad Ordine di Servizio n. 1.....Euro	5.340,00
<u>noleggjo piattaforma aerea</u> Euro	<u>633,28</u>
TOTALE INTERVENTI ORDINATI IN SEDE DI COLLAUDO: Euro	5.973,28

restano da corrispondere nella rata di saldo:

a credito netto dell'impresa quale rata di saldo risultante dallo stato finale Euro	587,06
<u>importo riconosciuto a corpo, in sede di collaudo /CRE</u> Euro	<u>5.973,28</u>
Totale a credito dell'impresa quale rata di saldo (IVA esclusa) Euro	6.560,34

il quale credito include le trattenute dello 0,50 % ex art. 30 D.lgs. 50/2016 per un totale di Euro 587,06 oltre IVA al 10% esclusa da restituire all'impresa:

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI Euro 139.796,58

- l'importo eccedente le disponibilità impegnate si può attingere dai residui derivanti dal quadro economico approvato con Determinazione Dirigenziale 2022-212.1.0.-82, in data 14/12/2022 e appostati a Bilancio 2023 al Capitolo 73403 C.d.C. 1500.8.04. "Musei, Monumenti, Pinacoteche Comunali - Ristrutturazione e Ampliamento" del Bilancio 2023, - P.d.C. 2.2.1.10.8 - Crono 2018/307;
- nel corso dei lavori non è stato necessario occupare in modo temporaneo o permanente proprietà private e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti ai beni di proprietà privata, come risultante dalla Dichiarazione del Direttore dei Lavori Prot. 07/07/2023.0001605.E;
- come risultante dalla comunicazione Prot. 25/07/2023.0335246.I, a firma dell'Area CFO, Direzione Gestione Contabile e Controlli del Comune di Genova, non sono segnalate notifiche di cessioni di crediti da parte dell'Impresa appaltatrice, nonché procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento;
- l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione senza riserve.

Dato atto che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Silvia Toccafondi, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
- il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 come da allegato.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Visti:

- Il D.lgs. 50/2016 e il D.lgs. 120/2020;
- gli artt. 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;
- gli artt. 4, 16, 17 del D.lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 84, 88, 92 e 94 del D. Lgs. n. 159/2011;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il Regolamento di contabilità, approvato con Delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996 n. 34 e ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018 n.2;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;
- il provvedimento del Sindaco n. 2023-112 del 05/04/2023 per il conferimento di incarichi dirigenziali, con conseguente potere di assunzione dei provvedimenti di aggiudicazione in capo all'Arch. Emanuela Torti.

IL DIRIGENTE DETERMINA

- 1) di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 06/10/2023 (prot. NP. 13/10/2023.0002253.I) dal Direttore dei Lavori Arch. Sabrina Pipino, con il quale si dichiarano collaudati i lavori di: **“Restauro e manutenzione straordinaria dei serramenti esterni del Museo di Sant’Agostino, sito in Genova, Piazza Sarzano 35r - 2° stralcio relativo a quattro serramenti di grandi dimensioni che insistono sul prospetto principale di Piazza Sarzano”**, finanziati con Patto per la Città di Genova - risorse F.S.C. Programmazione 2014-2020, e realizzati dall'Impresa Panzetta S.r.l., con sede legale in Torino, Via F. Cigna 44 – C.A.P. 10152 - C.F. e P. I.V.A. 04240520017 (**codice benf 60690**) in base al contratto rep. n. 217 del 08/02/2023;
- 2) di dichiarare da liquidare in complessivi Euro 587,06 oltre I.V.A. al 10%, a titolo di ritenute di garanzia, secondo le risultanze del Collaudo, corrispondendo la suddetta cifra alle citate trattenute di garanzia dello 0,50% ex art. 30 D.lgs. 50/2016 per Euro 587,06 oltre IVA al 10% per euro 58,70 per un totale di **Euro 645,77**;
- 3) di autorizzare i maggiori lavori, ordinati in sede di collaudo, per le motivazioni citate in premessa, e per l'importo a corpo di Euro 5.973,28 oltre I.V.A. al 10% per Euro 597,32 per un totale di **Euro 6.570,60**;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 4) di procedere alla liquidazione dei pagamenti degli importi di cui ai precedenti punti 2 e 3, in favore dell'Impresa **Panzetta S.r.l.**, previa emissione della relativa fattura elettronica;
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, la Panzetta S.r.l. ha presentato polizza fideiussoria rilasciata dalla Compagnia "ALLIANZ S.p.A. Milano – Agenzia Torino Francia 212 Corso Trapani 108, 10141 Torino (PEC: cauzioni@pec.allianz.it) – numero 733729103, emessa in data 27/10/2023, della durata di ventiquattro mesi dalla data del Certificato di Regolare Esecuzione;
- 6) conseguentemente di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale all'Impresa Panzetta S.r.l., relativo alla polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia "ALLIANZ S.p.A. Milano – Agenzia Torino Francia 212 Corso Trapani 108, 10141 Torino – numero. 733345897, emessa in data 13/12/2022, per l'importo di Euro 14.048,62;
- 7) di mandare a prelevare la somma di **Euro 7.216,37** dei quali Euro 6.560,34 per imponibile ed Euro 656,03 per I.V.A. al 10%, come segue:
- a) **Euro 6.570,60** per quota lavori ordinati in sede di collaudo (di cui Euro 5.973,28 per imponibile ed Euro 597,32 per I.V.A. al 10%) in questo modo:
- **Euro 5.427,31** dal Capitolo 73403 C.d.C. 1500.8.04. "Musei, Monumenti, Pinacoteche Comunali - Ristrutturazione e Ampliamento" del Bilancio 2022, - P.d.C. 2.2.1.10.8 - Crono 2018/307 mediante riduzione dell'IMP 2023/6457 e creazione di nuovo **IMP 2023/17557**;
 - **Euro 451,34** dal Capitolo 73403 C.d.C. 1500.8.04. "Musei, Monumenti, Pinacoteche Comunali - Ristrutturazione e Ampliamento" del Bilancio 2023, - P.d.C. 2.2.1.10.8 - Crono 2018/307 mediante riduzione dell'IMP 2023/6455 e creazione di nuovo **IMP 2023/17559**;
 - **Euro 331,11** dal Capitolo 73403 C.d.C. 1500.8.04. "Musei, Monumenti, Pinacoteche Comunali - Ristrutturazione e Ampliamento" del Bilancio 2023, - P.d.C. 2.2.1.10.8 - Crono 2018/307 mediante riduzione dell'IMP 2023/6458 e creazione di nuovo **IMP 2023/17564**;
 - **Euro 360,84** dal Capitolo 73403 C.d.C. 1500.8.04. "Musei, Monumenti, Pinacoteche Comunali - Ristrutturazione e Ampliamento" del Bilancio 2023, - P.d.C. 2.2.1.10.8 - Crono 2018/307 mediante riduzione dell'IMP 2023/6459 e creazione di nuovo **IMP 2023/17568**;
- b) **Euro 645,77** per svincolo trattenute a garanzia (di cui Euro 587,06 per imponibile ed Euro 58,70 per I.V.A. al 10%) dal Capitolo 73403 C.d.C. 1500.8.04. "Musei, Monumenti, Pinacoteche Comunali - Ristrutturazione e Ampliamento" del Bilancio 2023, - P.d.C. 2.2.1.10.8 - Crono 2018/307 mediante riduzione dell'IMP 2023/6455 e creazione di nuovo **IMP 2023/17560**;
- 8) di dare atto che l'importo complessivo di **Euro 7.216,37** del presente provvedimento è finanziato mediante contributi agli investimenti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Patto per la Città di Genova (ACC 2023/1460);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 9) di procedere, a cura della Direzione Lavori Pubblici - Attuazione Opere Pubbliche, alla liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
- 10) di notificare all'Impresa Panzetta S.r.l. il presente provvedimento, ai sensi della vigente normativa;
- 11) l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Silvia Toccafondi, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
- 12) con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;
- 13) il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 come da allegato;
- 14) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990;
- 15) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Arch. Emanuela Torti

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.1.0.-114
AD OGGETTO

Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Patto per la Città di Genova finanziato con risorse F.S.C. Programmazione 2014-2020. Restauro e manutenzione straordinaria dei serramenti esterni del Museo di Sant'Agostino, sito in Genova, Piazza Sarzano 35r - 2° stralcio relativo a quattro serramenti di grandi dimensioni che insistono sul prospetto principale di Piazza Sarzano.

CUP: B34E17000490001 –MOGE: 15482 – CIG 95206332E5

Contratto d'Appalto – Rep. n. 217 del 08/02/2023 per un importo di Euro 133.788,60 oltre I.V.A.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (acc.to 2023/1460).

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese



COMUNE DI GENOVA



LAVORI PUBBLICI
ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

APPALTO: PATTO PER LA CITTÀ DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020” - RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERRAMENTI ESTERNI DEL MUSEO DI SANT’AGOSTINO, SITO IN GENOVA, PIAZZA SARZANO 35R - 2° STRALCIO RELATIVO A QUATTRO SERRAMENTI DI GRANDI DIMENSIONI CHE INSISTONO SUL PROSPETTO PRINCIPALE DI PIAZZA SARZANO.

CUP: B34E17000490001 - CIG: 95206332E5 – MOGE: 15482

APPROVAZIONE LAVORI: D.G.C. n. 272 del 24.11.2022

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, LAVORI E AFFIDAMENTO

DIRETTO: D.D. 2022-212.1.0.-82 del 27.12.2022

AGGIUDICAZIONE: D.D. 2022-212.1.0.-82 del 27.12.2022

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA: Euro 141.048,62 (oltre IVA 10%) di cui Euro 4.478,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

RIBASSO D’ASTA: -5,000 % (esclusi oneri della sicurezza).

IMPORTO NETTO DEI LAVORI: Euro 134.233,61 (oltre IVA al 10%), di cui Euro 4.748,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

IMPRESA APPALTATRICE: PANZETTA S.r.l., con sede legale in Torino, Via F. Cigna 44 – C.A.P. 10152 - C.F. e P. I.V.A. 04240520017

CONTRATTO: Rep. n. 217 del 08.02.2023

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto e istruzione appalto

L'appalto venne approvato ed aggiudicato secondo il seguente iter:

c_9969 . Comune di Genova - Rep. NP 13/10/2023 . 0002253 . I



COMUNE DI GENOVA

LAVORI PUBBLICI

ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

- nell'ambito dei lavori di "Restauro e manutenzione straordinaria dei serramenti esterni del museo di Sant'Agostino" iniziati nell'ottobre 2020 e collaudati nel novembre 2021 ed eseguiti dall'impresa CO.GE.AS srl, aggiudicataria dei lavori, è rimasta pendente la necessità di mettere in sicurezza i quattro grandi serramenti che insistono sulla facciata principale del museo;

- l'esigenza di procedere con la messa in sicurezza dei serramenti esterni del tipo "tutto vetro" progettati dal maestro Albini, è emersa nell'ottobre 2018 a seguito di un evento a carattere eccezionale che ha provocato la rottura di una delle quattro specchiature in vetro monolastra di una vetrata del prospetto principale, crollata verso l'interno del museo frantumandosi;

- il Comune in relazione a questo evento ha commissionato al DICCA Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale, uno studio sulla sicurezza dei vetri "monolastra temprati" impiegati nei serramenti del museo. In data 2/11/2021 il DICCA fornisce uno studio sulla materia specifica, corredato da prove di laboratorio in galleria del vento giungendo alla conclusione che i serramenti del tipo "a tutto vetro" non rispettano gli standard di sicurezza richiesti dalle normative vigenti;

- a seguito di quanto sopra con Determinazione Dirigenziale n. 2022/212.1.0.-38 del 10/08/2022, l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere in oggetto è stata affidato all'architetto Mario Battistrada con studio in Genova, Piazza Brignole 2/4 - CAP 16122, P.IVA 01473610994, per una spesa complessiva pari ad Euro 161.156,52, come da quadro economico allegato al provvedimento;

- con Deliberazione della Giunta Comunale DGC n. 272 del 24.11.2022 è stato approvato il Progetto Definitivo relativo ai lavori in oggetto che ha ottenuto parere



COMUNE DI GENOVA

LAVORI PUBBLICI

ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

favorevole dalla competente Soprintendenza A.B.A.P di Genova con nota prot. 18441 del 14/11/2022 pervenuta con PEC 15/11/2022.04342.E;

- il progetto esecutivo per i lavori *“Patto per la Città di Genova finanziato con risorse F.S.C. Programmazione 2014-2020. Restauro e manutenzione straordinaria dei serramenti esterni del Museo di Sant’Agostino, sito in Genova, Piazza Sarzano 35r - 2° stralcio relativo a quattro serramenti di grandi dimensioni che insistono sul prospetto principale di Piazza Sarzano”* è stato verificato ai sensi dell’art.26 del Codice degli Appalti con Rapporto Conclusivo di Verifica prot. NP 01/12/2022.0002166.I. Il progetto esecutivo ha confermato il quadro economico di Euro **161.156,52**, di cui Euro 136.300,26 per lavori a misura e Euro 4.748,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA al 10%;

- con medesima Deliberazione della Giunta Comunale DGC n. 272 del 24.11.2022 si è inoltre stabilito di procedere all’affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’art. 1 della Legge 120 del 11.09.2020, così come modificata dall’Art.51, comma 1), lettera b) del D.L. n. 77/2021, per un importo totale pari ad Euro 161.156,52 finanziato dal programma *“Patto Per La Città di Genova Finanziato con risorse F.S.C. Programmazione 2014-2020”* come da Determinazione Dirigenziale n. 2022-270.0.0.-62 adottata il 10/11/2022;

- con Determinazione Dirigenziale 2022-212.1.0.-82 si è quindi provveduto all’aggiudicazione definitiva dell’esecuzione dei lavori alla ditta Panzetta S.r.l., con sede legale in Torino, Via F. Cigna 44 – C.A.P. 10152 - C.F. e P. I.V.A. 04240520017, per un importo complessivo di Euro 141.048,62 di cui Euro 136.300,26 per lavori ed Euro 4.748,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A. al 10%, tramite contratto *“a misura”* ai sensi dell’art. 59,



COMUNE DI GENOVA

LAVORI PUBBLICI

ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

comma 5-bis, del Codice. I lavori a misura rientrano tutti nella categoria OS6: *finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;*

Quadro economico

Per i lavori di "Patto per la Città di Genova finanziato con risorse F.S.C. Programmazione 2014-2020. Restauro e manutenzione straordinaria dei serramenti esterni del Museo di Sant'Agostino, sito in Genova, Piazza Sarzano 35r - 2° stralcio relativo a quattro serramenti di grandi dimensioni che insistono sul prospetto principale di Piazza Sarzano" l'importo complessivo risultante dal Quadro Economico del progetto esecutivo approvato con D.D. 2022-212.1.0.-82 del 27.12.2022 era così ripartito (vedere pagina seguente):



COMUNE DI GENOVA



LAVORI PUBBLICI

ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

MUSEO SANT'AGOSTINO, PIAZZA SARZANO 35 R, INTERVENTO SUI QUATTRO SERRAMENTI DI GRANDI DIMENSIONI SUL PROSPETTO PRINCIPALE DI PIAZZA SARZANO			
QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
A. IMPORTO PER LAVORI	A.1	Importo dei lavori	136.300,26 €
		di cui importo dei lavori a misura	136.300,26 € 100,00%
		di cui importo dei lavori a corpo	0,00 € 0,00%
	Totale importo lavori		136.300,26 €
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	4.748,38 €	
A.3	Lavori in economia	0,00 €	
Totale (A.1+A.2+A.3)			141.048,62 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B	Somme a disposizione dell'Amministrazione (comprendenti di I.V.A. ed eventuali altre imposte ove dovute per legge)	
	B.1	Lavori in economia, previsti a progetto, esclusi dall'appalto	0,00 €
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	0,00 €
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi	0,00 €
	B.4	Imprevisti (max. 10%)	5.457,31 €
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servizi, occupazioni	0,00 €
	B.6	Accantonamento di cui all'articolo 113 c.3 del D.Lgs.50/2016 (incentivo)	0,00 €
	B.7	Spese di cui agli articoli 24, comma 4, del D.Lgs.50/2016, spese per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione	0,00 €
	B.8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0,00 €
	B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00 €
	B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00 €
	B.12	Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione lavori) e oneri diretti e indiretti (min 8% max 8%)	0,00 €
	B.13	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale	0,00 €
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+....+B.13)			5.457,31 €
C. I.V.A.	C	I.V.A.	€
	C.1	I.V.A. su Lavori	10% 14.850,50 €
	C.1	I.V.A. su somme a disposizione escluso B.6	0,00 €
	Totale IVA		14.850,50 €
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			161.156,52 €

Aggiudicazione

In virtù dell'importo dei lavori inferiore a 150.000,00 si è proceduto all'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 120 del 11/09/2020, per un importo totale di Quadro Economico di Euro 161.156,52.

Vista l'urgenza di procedere con l'affidamento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e del criterio di



COMUNE DI GENOVA

LAVORI PUBBLICI

ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

rotazione degli inviti e degli affidamenti, l'affidamento è stato espletato mediante trattativa diretta su piattaforma Maggioli. L'operatore economico individuato, in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per i lavori in oggetto, Panzetta srl, il giorno 01/12/2022 è stato invitato a presentare offerta su piattaforma – con nota prot. 01/12/2022.0460494.U. Nei termini della scadenza della presentazione dell'offerta, la Ditta Panzetta S.r.l. ha offerto un ribasso percentuale del 5% impegnandosi ad eseguire i lavori sulle quattro finestrate di grandi dimensioni del Museo di Sant'Agostino poste sulla facciata che insiste su Piazza Sarzano.

Con Determinazione Dirigenziale n. 2022-212.1.0.-82 esecutiva dal 27.12.2022 i lavori sui quattro serramenti di grandi dimensioni del museo di Sant'Agostino posizionati sulla facciata che insiste su Piazza Sarzano sono stati aggiudicati alla ditta Panzetta S.r.l. con sede in Torino, C.F., P.I.V.A. e Iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia di TORINO 04240520017, iscritta nel registro Ditte n. TO-620065, con il ribasso del 5% così da ridurre il preventivato importo lavori da Euro 141.048,62 di cui Euro 4.748,36 per oneri della sicurezza ad Euro 134.233,61 di cui Euro 4.748,36 per oneri della sicurezza oltre IVA al 10% pari ad Euro 13.423,36 per un totale di Euro 147.656,97.

La ditta Panzetta S.r.l. in qualità di affidataria ha dichiarato di voler affidare in subappalto opere riconducibili alla categoria OS6 nella percentuale del 10% rispetto al valore complessivo del contratto.

Contratto

Il contratto è stato stipulato in data 08/02/2023 CON Rep. n. 217/2023 per un importo di Euro 134.233,61 di cui Euro 4.748,36 per oneri della sicurezza oltre IVA al 10% pari ad Euro 13.423,36 per un totale di Euro 147.656,97.



COMUNE DI GENOVA

LAVORI PUBBLICI

ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

Cauzione

L'impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dell'appalto e dell'osservanza di tutti i patti contrattuali, ha presentato polizza fidejussoria (garanzia definitiva) n. 733345897, emessa in data 13.12.2022, per l'importo di Euro 14.048,62, pari al 10,466% dell'importo di contratto, presso la Compagnia "ALLIANZ S.p.a." – Agenzia 212 Torino Francia, Corso Trapani 108, 10141 Torino.

Responsabile del Procedimento

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016, sono state svolte dall'Arch. Silvia Toccafondi, F.S.T. dei Lavori Pubblici, Attuazione Opere Pubbliche, con decorrenza dal 03.02.2021 (nomina RUP con atto datoriale prot. 30/11/2022.0459696.I).

Ufficio Direzione Lavori

L'ufficio di Direzione dei Lavori è stato composto dal Direttore dei Lavori, Arch. Sabrina Pipino, F.S.T. dei Lavori Pubblici, Attuazione Opere Pubbliche, coadiuvata dal Geom. Raffaele Pessina, in forza alla stessa Direzione, in qualità di Direttore Operativo, entrambi nominati con Atto Datoriale Prot. 25/01/2023.0034157.I.

Con Determinazione Dirigenziale N. 2023-212.1.0.-28 del 30.03.2023, esecutiva dal 04.04.2023, è stato affidato l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione all'Ing. Lorenzo Magrassi, professionista esterno all'Ente, con Studio in Genova, Via Maddaloni 6/2, - P.IVA 02028220065 - C.F. [REDACTED]

[REDACTED] Codice beneficiario 52334, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n° 1547A con decorrenza dal 2000.

Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati con "Verbale di Consegna dei Lavori" in data



COMUNE DI GENOVA

LAVORI PUBBLICI

ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

15.02.2023, Prot. NP 16/02/2023.0000380.I, senza riserva alcuna da parte dell'Impresa.

Tempo previsto per l'esecuzione - penali in caso di ritardo

Il Contratto d'Appalto prevedeva che i lavori fossero completati in 60 giorni naturali e consecutivi e perciò cessanti il 15 aprile 2023.

L'art. 5 del Contratto d'Appalto, registrato con Rep. n. 217 del 08 febbraio 2023, prevede una penale pecuniaria, stabilita nella misura dello 0,1% dell'importo contrattuale da applicarsi per ogni giorno di ritardo nella fase di realizzazione dei lavori, pari ad Euro 134,23.

Varianti

Non sono state necessarie varianti ai lavori.

Approvazione di Nuovi Prezzi

Non è stato necessario approvare nuovi prezzi.

Sospensione e ripresa dei lavori

Nel corso delle attività non sono stati emessi provvedimenti di sospensione dei lavori in appalto.

Proroghe

A seguito di istanza di proroga presentata dalla ditta Panzetta S.r.l. (Prot. 14/04/2023.0165924.E), è stato assegnato un maggior tempo utile al termine di ultimazione dei lavori (Rep. NP 17/04/2023.0000823.I) di 10 giorni naturali, successivi e consecutivi per completare i lavori.

Scadenza definitiva del tempo utile

Per effetto della proroga concessa, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è stato ridefinito al 25 aprile 2023.



COMUNE DI GENOVA



LAVORI PUBBLICI

ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

Subappalti – Adempimenti antimafia

Nel corso dei lavori l'appaltatore ha inoltrato richiesta di autorizzazione al subappalto autorizzato su proposta del R.U.P., dal Dirigente Responsabile Arch. Emanuela Torti, con Atto Datoriale Rep. NP 06/04/2023.0000740.I del 06.04.2023.

La direzione lavori, che conserva agli atti la documentazione prescritta dalla Legge 55/90, ha adempiuto alle norme ed alle disposizioni vigenti in materia

L'appaltatore ha subappaltato/sub-affidato i seguenti lavori:

- 1) lavori ricadenti nella categoria OS6 (finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi) per assistenza alla posa in opera con camion gru delle vetrate, alla ditta BIVETRO S.r.l., con sede legale in Milano, Galleria Buenos Aires 13, CAP 20124, C.F., P. I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Milano, Monza, Brianza, Lodi al numero 08612320013; la stessa azienda inoltre ha fornito alla ditta Panzetta srl, i vetri dei serramenti. Il trasporto e la posa in opera con camiongru (nolo a caldo) sono quantificati in Euro 1.600,00 rientranti nel 10% del subappalto dichiarato in sede di gara.

Ordini di servizio

Durante il corso dei lavori è stato emesso l'Ordine di Servizio n. 1 del 14.02.2023 (Prot. 16/02/2023.0070269.U), relativo alla necessità di realizzare la sabbatura dei cristalli in corso di realizzazione al fine di richiamare le partizioni delle specchiature dei serramenti originali così come concordato con gli uffici della Soprintendenza. Per la determinazione del costo di tale intervento si è preso a riferimento l'offerta presentata dall'appaltatore allegata all'O.d.S. di cui sopra pari ad un importo complessivo di Euro 5.340,00 al netto del ribasso offerto in sede di gara ed al netto del



COMUNE DI GENOVA

LAVORI PUBBLICI

ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

10% di I.V.A. La somma necessaria per le lavorazioni comprese nell'O.d.S., che trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'intervento, sarà impegnata nel provvedimento di approvazione del CRE e liquidato con il Certificato di Regolare Esecuzione.

Ultimazione dei lavori

I lavori sono stati dichiarati ultimati in data 20.04.2023, così come risultante dal Certificato di Ultimazione dei Lavori, Rep. NP 28/04/2023.0000908.I.

Constatata la fine lavori delle opere principali nella loro essenzialità, si è ritenuto necessario, in accordo con il R.U.P., di assegnare un termine aggiuntivo di giorni 25 per il completamento di attività marginali non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il termine ultimo per il completamento di tali attività è, conseguentemente, slittato al 15.05.2023. In data 15.05.2023 il Direttore dei Lavori e l'impresa esecutrice Panzetta S.r.l., hanno effettuato sopralluogo congiunto presso i luoghi di intervento constatando il completamento delle attività residuali di finitura. In tale occasione è stato controfirmato il verbale di conferma del predetto certificato di ultimazione lavori (Rep. NP 19/05/2023.0001079.I) attestante l'effettivo completamento delle opere in appalto alla data del 20.04.2023.

Penali e compensazioni

I lavori sono stati ultimati entro le tempistiche contrattuali e non si sono dovute pertanto applicare penali e/o compensazioni.

Verbali di danno per forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati accertati danni di forza maggiore.

Anticipazione



COMUNE DI GENOVA

LAVORI PUBBLICI

ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Contratto d'Appalto l'appaltatore ha richiesto l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale; a tal fine l'impresa ha trasmesso, in data 22.03.2023, apposita polizza fideiussoria n. 733562330, emessa in data 17.03.2023 dalla Compagnia "ALLIANZ S.p.a." – Agenzia 212 Torino Francia, Corso Trapani 108, 10141 Torino, a garanzia dell'importo dell'anticipazione pari ad Euro 26.846,73.

Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, ed alle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori.

Stati d'Avanzamento

E' stato emesso dalla sottoscritta D.L. n. 1 Stato di Avanzamento Lavori, unico, al completamento dei lavori medesimi di cui al certificato Prot. 249033 del 05.06.2023:

SAL n. 1 del 08.05.2023 per lavori a tutto il 20.04.2023 per Euro 133.823,30, al lordo della ritenuta dello 0,5% ed al recupero dell'anticipazione, il tutto oltre IVA.

A fronte di suddetto SAL è stata applicata la ritenuta pari allo 0,5% per infortuni.

E' stato conseguentemente emesso il seguente Certificato di Pagamento oltre IVA e al netto delle ritenute di legge dello 0,5%:

- Certificato di pagamento n.1 del 08.05.2023, Prot. 249033 del 05.06.2023, pari ad Euro 106.389,52 IVA esclusa.

A fronte del suddetto SAL 1 sono state applicate le seguenti ritenute:

- Euro 669,12 (importo progressivo) pari allo 0,5 % per infortuni;
- Euro 26.764,66 (importo progressivo) per il recupero del 20% dell'anticipazione contrattuale.

Certificati d'acconto



COMUNE DI GENOVA

LAVORI PUBBLICI

ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

Non sono stati emessi certificati di acconto.

Conto Finale

L'ammontare complessivo delle opere eseguite, pari a € 133.823,30, è così ripartito:

Lavori a misura Euro 125.775,17

Noleggi Euro 3.338,77

Oneri sicurezza Euro 4.709,36

Opere in economia:

Provviste Euro 0,00

Noli Euro 0,00

Operai Euro 0,00

TOTALE (IVA ESCLUSA) Euro 133.823,30

A dedurre:

- Importo totale dell'acconto pagato all'impresa (SAL N. 1) al netto della ritenuta dello 0,5%: Euro - 106.389,52

- Recupero del 20% dell'anticipazione contrattuale Euro - 26.846,72

CREDITO NETTO DELL'IMPRESA QUALE RATA DI SALDO (IVA ESCLUSA)

.....Euro **587,06**

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa

L'importo netto autorizzato per lavori, IVA esclusa, risulta di Euro 134.233,61.

L'importo netto dei lavori eseguiti, IVA esclusa, risultante dallo stato finale, è di Euro 133.823,30 e, pertanto, con una minor spesa di Euro 410,00.

Riserve dell'impresa

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza avanzare riserve.



COMUNE DI GENOVA

LAVORI PUBBLICI

ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE



Assicurazione degli operai

L'Impresa esecutrice PANZETTA S.r.l., ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. sede di Torino con polizza assicurativa territoriale PAT n. 032150722/64 con decorrenza continuativa, codice ditta 620065.

Assicurazioni sociali

L'Impresa esecutrice PANZETTA S.r.l., ha regolarmente assicurato i propri operai contro le malattie presso l'I.N.P.S. sede di Torino, con matricola aziendale n. 8119062612.

Regolarità contributiva – DURC - A seguito delle verifiche effettuate in corso d'opera mediante richiesta di DURC, sia l'impresa esecutrice sia l'impresa affidataria dei lavori, sono sempre risultate in regola.

Prima dell'emissione del presente atto è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Panzetta S.r.l. mediante DURC emesso il 07/08/2023 (protocollo INAIL 39892985) con validità a tutto il 05/12/2023.

Infortuni nel corso dei lavori

Durante l'appalto non si sono verificati infortuni sul lavoro a conoscenza della Direzione Lavori.

Tempo stabilito per il collaudo

In base all'art. 11 del Contratto d'Appalto, il Certificato di Regolare Esecuzione avrebbe dovuto essere emesso entro 3 mesi a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, verbalizzata il 20.04.2023, pertanto entro il 20/07/2023; tale tempistica è stata interrotta in attesa dell'acquisizione delle documentazioni/certificazioni complete da parte dell'Impresa appaltatrice (nello specifico per le certificazioni relative alla linea



COMUNE DI GENOVA

LAVORI PUBBLICI

ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

vita), pervenute in data 06.07.2023; da quest'ultima data decorrerebbero pertanto le tempistiche stabilite per il collaudo, pertanto entro il 06.10.2023.

Avvisi ad opponendum

Non occorre procedere alla pubblicazione degli "avvisi ai creditori" in quanto per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare in modo temporaneo o permanente proprietà private e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti ai beni di proprietà privata, come risultante da Dichiarazione del Direttore dei Lavori Rep. NP 07/07/2023.0001605_I

Cessione dei crediti

Come risultante dalla comunicazione Prot. 25/07/2023.0335246.I, a firma dell'Area C.F.O. (Servizi Finanziari), Gestione Contabile e Controlli Direzione del Comune di Genova, non risultano segnalate notifiche di cessioni di crediti da parte dell'Impresa appaltatrice, nonché procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento.

Collaudatore

Atteso che l'importo netto dei lavori risulta inferiore a 1.000.000,00 di Euro ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, è prevista la redazione del certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori (come previsto all'art. 11 del Contratto d'appalto).

Sopralluogo certificazione ultimazione lavori

In data 20.04.2023 si è proceduto al sopralluogo di fine lavori.
Alla visita erano presenti, oltre alla sottoscritta D.L., il D.O. Geom. Raffaele Pessina ed il Sig. Angelo Panzetta, Direttore Tecnico dell'impresa esecutrice Panzetta S.r.l.
In tale occasione il Direttore dei Lavori ha verificato e constatato l'effettiva



COMUNE DI GENOVA

LAVORI PUBBLICI

ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

ultimazione delle opere eseguite secondo le indicazioni contrattuali ed in base alle istruzioni operative fornite all'Impresa nel corso delle lavorazioni. Si è preso atto della realizzazione delle serigrafie di cui all'O.D.S. disposto, da corrispondere in sede di collaudo. Nel corso della visita di fine lavori la scrivente D.L. ha ritenuto che alcune rifiniture dovessero essere migliorate, soprattutto le sigillature esterne del telaio al controtelaio ed il serraggio di alcuni bulloni, insieme ad altri piccoli aggiustamenti e ritocchi; inoltre tutte le vetrate dovevano essere ripulite dalle impronte delle ventose di sollevamento dei vetri ai piani di posa.

In seguito a quanto espressamente richiesto nel verbale di fine lavori Rep. NP 28/04/2023.0000908.I, è stato concesso un ulteriore tempo di circa 25 giorni naturali e consecutivi, fissando il termine ultimo in data 15.05.2023 (verbale Rep. NP 19/05/2023.0001079.I).

Sopralluogo finale di conferma ultimazione lavori

Nel corso della visita del 15.05.2023, sulla scorta degli elaborati grafici e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei Lavori, congiuntamente agli altri intervenuti, ha percorso la zona dei lavori per un esame generale dei lavori stessi, conducendo verifiche e deducendo che le opere eseguite corrispondono, per gli effetti contabili, in tutto e per tutto a quanto registrato nei libretti delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale. In tutte le opere eseguite si è constatato che la qualità dei materiali impiegati e la lavorazione svolta a regola d'arte rispettano le prescrizioni contrattuali; di tali opere erano state in ogni modo verificate la corretta esecuzione e la corrispondenza, per gli effetti contabili, a quanto registrato nei documenti contabili stessi, in sede di visita di fine lavori.



COMUNE DI GENOVA

LAVORI PUBBLICI

ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

Per l'emissione del CRE la scrivente D.L., sentito il RUP, ha convocato l'impresa Panzetta S.r.l. per la visita finale di collaudo dei lavori.

Visita finale di collaudo

La convocazione è stata fissata in data 01/08/2023. Alla visita oltre alla sottoscritta D.L. era presente il RUP, architetto Silvia Toccafondi e il Direttore Tecnico dell'impresa, Sig. Angelo Panzetta.

In tale occasione si è proceduto ad un'approfondita verifica generale dei lavori eseguiti, constatando quanto era già emerso nel corso del precedente sopralluogo di conferma fine lavori. Sono stati ulteriormente verificati i serraggi delle viti nei montanti verticali dei serramenti, riscontrando che alcune viti, in zone specifiche, non risultavano pienamente infisse nel supporto verticale. E' stato richiesto all'impresa di ricontrollare il serraggio delle viti per tutti e quattro i serramenti e dove necessario provvedere alla sostituzione con nuove viti di lunghezza maggiore e verificare ulteriormente la sigillatura del telaio per il riempimento di zone che inficiano la prestazione acustica del serramento. La richiesta, accettata dall'impresa, è stato verbalizzata e sarà svolta entro trenta giorni dalla data di emissione del verbale Rep. NP 02/08/2023.0001804.I. Avendo l'impresa già provveduto al disallestimento delle opere provvisionali del cantiere alla data del 15.05.2023 (sopralluogo di conferma della fine dei lavori), si concorda che per l'esecuzione degli interventi in esterno venga utilizzata una piattaforma aerea il cui noleggio verrà riconosciuto all'impresa secondo le voci di elenco prezzi di contratto. Le opere provvisionali interne saranno invece a carico dell'impresa. La Nuova Lavorazione ordinata e la messa a punto di altri aspetti emersi durante la visita di collaudo comporta maggiori oneri ricadenti nelle voci di CME.



COMUNE DI GENOVA

LAVORI PUBBLICI

ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE



Tutto quanto sopra premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto da cui risulta:

- a) che i lavori vennero eseguiti secondo il progetto e le indicazioni della D.L.;
- b) che l'ammontare dei lavori, secondo quanto contabilizzato, al netto dell'IVA ed al lordo delle trattenute di garanzia ammonta ad **Euro 133.823,30**;
- c) che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali prescritte dalla legge;
- d) che i lavori sono stati completati nei tempi indicati dal contratto e non si sono pertanto applicate le eventuali penali previste all'art. 5 del Contratto;
- e) che i prezzi applicati sono quelli di cui al CME, ai quali vanno aggiunte le somme di lavorazioni previste nell'Ordine di Servizio n. 1 del 14.02.2023 (Prot. 16/02/2023.0070269.U) per un ulteriore importo di Euro 5.340,00 e l'importo di Euro 633,28 ordinato in sede di collaudo per il noleggio di piattaforma aerea, utilizzando la voce di CME: AT.N06.C20.010 relativa ai noleggi, per ulteriore verifica e serraggio dei bulloni dei serramenti, il tutto oltre IVA di Legge;
- f) che sono stati adempiuti gli obblighi di legge in materia di "antimafia" riguardo al subappalto, ai piani di sicurezza, alla certificazione annuale;
- g) che lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità, dimensione, categoria e numero alle annotazioni riportate nei registri di contabilità e nello stato finale;
- h) che, come precedentemente specificato, i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Sulla base degli interventi ordinati in sede di collaudo il nuovo Conto Finale dell'intervento è il seguente:

Lavori a misura	Euro 125.775,17
-----------------	-----------------



COMUNE DI GENOVA

LAVORI PUBBLICI

ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

Noleggi	Euro	3.338,77
Oneri sicurezza	Euro	4.709,36
Opere in economia:		
Provviste	Euro	0,00
Noli	Euro	0,00
Operai	Euro	0,00
TOTALE (IVA ESCLUSA)	Euro	133.823,30

A sommare:

INTERVENTI ORDINATI IN SEDE DI COLLAUDO:

- Realizzazione di sabbiatura sulle vetrate al fine di imitare le partizioni delle specchiature originali, così come concordato con gli uffici della Soprintendenza di cui all'O.d.S. n. 1 del 14/02/2023	Euro	5.340,00
- Noleggio piattaforma aerea	Euro	633,28
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI:	Euro	139.796,58

A dedurre:

- Importo totale dell'acconto pagato all'impresa (SAL N. 1) al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni (Euro 669,12):	Euro	- 106.389,52
- Recupero del 20% dell'anticipazione contrattuale	Euro	- 26.846,72

CREDITO NETTO DELL'IMPRESA QUALE RATA DI SALDO (IVA ESCLUSA): Euro **6.560,34**

I lavori di cui sopra trovano capienza nel Quadro Economico della Commessa.

Preso atto delle certificazioni acquisite,

La sottoscritta D.L. Arch. Sabrina Pipino

CERTIFICA REGOLARMENTE ESEGUITI



COMUNE DI GENOVA

LAVORI PUBBLICI

ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

Per i lavori effettuati dalla ditta PANZETTA S.r.l., con sede legale in Torino, Via F. Cigna
44 – C.A.P. 10152 - C.F. e P. I.V.A. 04240520017, contratto Rep, n. 217 del
08.02.2023, in relazione all'appalto "Patto per la Città di Genova finanziato con
risorse F.S.C. Programmazione 2014-2020. Restauro e manutenzione straordinaria dei
serramenti esterni del Museo di Sant'Agostino, sito in Genova, Piazza Sarzano 35r -
2° stralcio relativo a quattro serramenti di grandi dimensioni che insistono sul
prospetto principale di Piazza Sarzano", e riconosce liquidabile, secondo le risultanze
della contabilità e dello stato finale, pari a Euro 133.823,30 al netto dell'IVA,
l'importo di Euro 587,06 quale svincolo delle ritenute di garanzia ed Euro 5.973,28
quale importo per maggiori lavori, il tutto oltre IVA.

Certifica pertanto di potersi liquidare all'Impresa Panzetta S.r.l. l'importo di Euro
6.570,60 per lavori, ed Euro 597,32 per IVA al 10%.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo delle ritenute di Legge sono subordinati ai
sensi dell'art. 103, comma 6, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., alla costituzione di una
cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, pari all'importo della rata di
saldo maggiorato di interesse legale vigente per 2 anni, a decorrere dalla data di
emissione del presente certificato.

Genova, lì 06 ottobre 2023

L'IMPRESA PANZETTA S.r.l.

(Sig. Angelo Panzetta)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Arch. Sabrina Pipino)



COMUNE DI GENOVA

LAVORI PUBBLICI

ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

Visto il RUP

(Arch. Silvia Toccafondi)

[Handwritten signature]
[Redacted signature]

Allegati:

Documentazione tecnica-amministrativa

Certificazioni

Altri documenti tecnici

ALLEGATI AL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

MUSEO DI SANT'AGOSTINO, PIAZZA SARZANO 35R, INTERVENTO SU 4 SERRAMENTI
POSTI SUL PROSPETTO PRINCIPALE

ELENCO SCHEDE TECNICHE E DICHIARAZIONI

DOCUMENTAZIONE TECNICA - AMMINISTRATIVA			
1	DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA ALLE NORME ASSEMBLAGGIO PROFILI	PANZETTA SRL	
2	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALLA POSA IN OPERA	PANZETTA SRL	
3	DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE VETRATE	BIVETRO SRL	
4	<ul style="list-style-type: none">• VERBALE CONSEGNA LAVORI• RICHIESTA DI PROROGA• CONCESSIONE PROROGA• VERBALE DI VISITA DI COLLAUDO FINALE• ORDINE DI SERVIZIO N. 1	UFFICIO D.L.	

CERTIFICAZIONI			
5	CERTIFICATO DI COLLAUDO SCATOLATO 100X100X10	MARCEGAGLIA	CERTIFICATO DI CONFORMITA'
6	CERTIFICATO TUBOLARE 100X20X2 (controtelaio)	MARCEGAGLIA	CERTIFICATO DI CONFORMITA'
7	VITI A TESTA SVASATA FILETTATE	SPEED BOLT	CERTIFICATO DI CONFORMITA' ALL'ORDINE
8	SCHEDA TECNICA VITI A TESTA SVASATA FILETTATE A PASSO GROSSO	VITERIA EUGANEA	SCHEDA TECNICA UNI 5933
9	NASTRO SIGILLANTE MULTI TAPE	FISCHER	SCHEDA TECNICA CONFORME UNI 11673-1
10	SILICONE SERRAMENTI NEUTRO SNF	FISCHER	SCHEDA TECNICA

			CERTIFICAZIONE CE - CONFORME UNI 11673-1
--	--	--	--

ALTRI DOCUMENTI			
11	FORMULARIO IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI E DDT	PANZETTA SRL	
12	SCHEDE AS BUILT SERRAMENTI FISSI	MOGS	
13	SCHEDA DI DETTAGLIO PROFILO T42TB	MOGS	
14	SCHEDA DI DETTAGLIO FERMAVETRO	MOGS	
15	SCHEDA DI DETTAGLIO SCHIUMA EPDM	MOGS	CODICE G99102-61
16	SCHEDA DI DETTAGLIO SCHIUMA EPDM	MOGS	CODICE G99202-61
17	MANUALE D'USO E MANUTENZIONE	PANZETTA SRL	

ALLEGATO 1



OGGETTO: RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERRAMENTI ESTERNI DEL MUSEO DI SANT'AGOSTINO, SITO IN GENOVA, PIAZZA SARZANO 35R - 2° STRALCIO RELATIVO A QUATTRO SERRAMENTI DI GRANDI DIMENSIONI CHE INSISTONO SUL PROSPETTO PRINCIPALE DI PIAZZA SARZANO

Il sottoscritto ANGELO PANZETTA, AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA' PANZETTA SRL, domiciliato in: [REDACTED] con riferimento alla fornitura di n. 4 serramenti in oggetto,

DICHIARA

avendo eseguito i lavori di:

ASSEMBLAGGIO PRESSO PROPRIA OFFICINA, DI PROFILI IN ACCIAIO FORNITI DALLA SOCIETA' MOGS S.r.l E VETRO FORNITO DALLA SOCIETA' BIVETRO SRL, per la produzione di n. 4 serramenti esterni fissi in "ferrofinestra" su misura, di tipo: "MOGS" T42TB, ASSEMBLATI CON VETROCAMERA: 10 mm. TEMP. +pvb 1,52+10 mm TEMP. + 24 +6 mm. TEMP. + 6 mm. TEMP., sulla base del progetto esecutivo contrattuale a firma dell'arch. Mario Battistrada e dell'ing. Marco Gavagnin, e posa in opera (vd. dichiarazione di conformità alla posa in opera),

CHE

i serramenti rispondono alle caratteristiche di cui alla norma di prodotto armonizzata UNI-EN 14351-1:2016 (G.U. Unione Europea del 28 ottobre 2016).

Data 21/07/23.....

FIRMA

PANZETTA s.r.l.

Sede [REDACTED] Cigna, 44

TORINO/P.I. 04240520113

ALLEGATO 2

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALLA POSA IN OPERA DI SERRAMENTI**

Cliente COMUNE DI GENOVA

Data 06/07/2023

Rif. Commessa MOGE 15482

Ordine del 14/12/2023

D. Trasporto N. 41/23

Modello serramento assemblato: SERRAMENTI FISSI IN FERRO FINESTRA A PROFILO "MOGS" T42TB ASSEMBLATI CON VETROCAMERA: 10 mm. TEMP. +pvb 1,52+10 mm TEMP. + 24 +6 mm. TEMP. + 6 mm. TEMP.

Io sottoscritto ANGELO PANZETTA, AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA' PANZETTA SRL, domiciliato in:

In qualità di produttore e installatore della Ditta: PANZETTA SRL

con sede in via

Avendo eseguito i lavori di:

fornitura e installazione di n. 4 serramenti esterni fissi in ferro - finestra su misura, assemblati presso officina PANZETTA SRL, certificati secondo UNI EN 14351:2016:

-Trasmittanza termica (Uw) dei serramenti sostituiti: non dichiarato W/m2K

-Trasmittanza termica (Uw) dei nuovi serramenti: 1,1 W/m2K

- Resistenza agli urti: AVCP SYSTEM classe 3 Prestazione 1B1/1B1 (vd. dich. di prestazione BIVETRO)

- Resistenza a carichi di vento: AVCP SYSTEM classe 4 Prestazione 120/120 (vd. dich. di prestazione BIVETRO)

Cantiere di proprietà del COMUNE DI GENOVA – MUSEO DI SANT'AGOSTINO situato in Piazza Sarzano N. 35 r C.A.P. 16121 Comune GENOVA Città GENOVA

DICHIARO

DI AVER ESEGUITO CORRETTAMENTE LA POSA IN OPERA E DI ESSERMI ATTENUTO AL PROGETTO ESECUTIVO E ALLE DISPOSIZIONI DEI FORNITORI DEI PROFILI DEI SERRAMENTI E DEI VETRI,

in accordo con le procedure di installazione fornitemi.

Vedere allegati di posa in opera e schede per posizionamento ferramenta.

Data 21/07/23.....

FIRMA INSTALLATORE


PANZETTA s.r.l.
Via Cigna, 44
TORINO - P.I. 04240520017

ALLEGATO 3

Bivetro

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

D.o.P. n° 1156 secondo allegato III del regolamento UE 305/2011



10mmTEMP SABBIATO+pvb 1,52+10mmTEMP SN70/35 / 24 Argon 90% / 6mmTEMP+ pvb 1,52+6mmTEMP

Vetrare isolanti per uso in edilizia e costruzioni

Bivetro s.r.l.
Via Torino, 182
Leini (TO)

UNI EN 1279-5:2005 + A2:2010

Caratteristiche essenziali	AVCP System	Prestazione
Sicurezza in caso di incendio		
Resistenza al fuoco	1	NPD
Reazione al fuoco	3,4	NPD
Reazione al fuoco proveniente dall'esterno	3,4	NPD
Sicurezza nell'uso		
Resistenza ai proiettili	1	NPD
Resistenza all'esplosione	1	NPD
Resistenza agli attacchi manuali	3	P4A
Resistenza agli urti (prova del pendolo)	3	1B1/1B1
Resistenza agli sbalzi improvvisi di temperatura e alle differenze di temperatura	4	NPD
Resistenza a carichi di vento, neve e ai carichi permanenti	4	120/120
Protezione contro il rumore		
Isolamento al rumore aereo diretto ⁽¹⁾ (EN 12758) – Rw (C;Ctr): dB	3	43(-1;-4)
Proprietà termiche		
Emissività dichiarata	3	NPD
Valore Ug (W/(m²K)) (EN 673)	3	1,1
Proprietà di irraggiamento		
Trasmissione luminosa	3	65
Riflessione luminosa	3	13,8
Caratteristiche energetiche		
Trasmissione energetica	3	27,9
Riflessione energetica	3	21,3
Fattore solare g	3	31,8

NPD = No Performance Determined (Caratteristica non dichiarata)

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

(1) Valore stimato. L'indice acustico fornito, è riferito ad una vetrata avente dimensione 1,23m x 1,48m, installata in particolari condizioni, presso uno specifico laboratorio. Le effettive prestazioni in opera possono variare in funzione delle reali dimensioni della vetrata e della stanza, delle sorgenti di rumore etc. Quando il valore fornito è stimato, ossia non deriva da un certificato ufficiale rilasciato da un laboratorio specializzato, la tolleranza sul dato sarà di +/- 2 dB.

Nome e funzioni	Luogo e data del rilascio	Firma
Giacone Carlo titolare	Leini 06/06/2023	

ALLEGATO 4



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

SETTORE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE



c_d969.Comune di Genova - Rep. NP 16/02/2023.0000380.1

APPALTO: RESTAURO E MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DEI SERRAMENTI ESTERNI DEL MUSEO

DI SANT'AGOSTINO, SITO IN GENOVA, PIAZZA SARZANO

35R - 2° STRALCIO RELATIVO A QUATTRO SERRAMENTI DI

GRANDI DIMENSIONI CHE INSISTONO SUL PROSPETTO

PRINCIPALE DI PIAZZA SARZANO.

CUP: B34E17000490001 - MOGE: 15482- CIG 95206332E5

APPROVAZIONE LAVORI: D.D. n. 2022-212.1.0-82 del 27/12/2022

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: determinazione dirigenziale della

Direzione Attuazione Opere Pubbliche n. 2022-212.1.0.-82 del 14/12/2022 ed

esecutiva dal 27/12/2022.

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA: Euro 136.300,26 (oltre IVA 10%) di

cui Euro 4.748,36 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).

RIBASSO D'ASTA: -5,00 % (esclusi oneri sicurezza).

IMPORTO NETTO DEI LAVORI: Euro 134.233,31 (oltre IVA al 10%), Euro

4.748,36 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).

IMPRESA APPALTATRICE: PANZETTA S.R.L. con sede in Torino, Via F.

Cigna, 44 - CAP 10152 - C.F. e P. I.V.A. 04240520017

CONTRATTO: rep. 0000217/2023 del 13/02/2023

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno **2023**, il giorno **15** del mese di **febbraio**, alle ore 14,30 su disposizione

del R.U.P., in seguito a congruo preavviso dato dal sottoscritto Direttore dei



Lavori, si sono trovati in Genova presso l'area di cantiere sita in Piazza

Sarzano 35r, i Signori:

- 1) Arch. Sabrina Pipino, Direttore dei Lavori (Comune di Genova);
- 2) Geom. Raffaele Pessina, ~~Direttore Operativo (Comune di Genova)~~;
- 3) Angelo Panzetta, Direttore Tecnico dell'impresa
- 4) Ing. Lorenzo Magrassi, Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Alla presenza degli intervenuti, **il sottoscritto Direttore dei Lavori**, premesso che:

- il Progetto esecutivo veniva approvato dal Comune di Genova ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 con determinazione dirigenziale D.D. n. 2022-212.1.0-82;
- il Contratto è stato stipulato e registrato con rep. 0000217/2023;

ha proceduto alla consegna dei lavori di che trattasi e altresì:

- sulla scorta del progetto, ha verificato la corrispondenza fra i dati del progetto esecutivo e le attuali condizioni e circostanze locali;
- ha indicato le aree destinate alla logistica di cantiere, in accordo con le autorizzazioni rilasciate e con le disposizioni impartite dal Coordinatore della Sicurezza;
- ha indicato i siti d'impianto e l'ubicazione delle varie opere da eseguire, con riferimento alle previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti specialmente in relazione alla materiale struttura delle opere ed alla qualità e tipo dei materiali da impiegare;
- ~~ha consegnato~~ ^{sarà consegnata} copia della Notifica Preliminare che dovrà tenersi in cantiere.

Inoltre, si indicano alcuni adempimenti da considerarsi prioritari:

- che l'impresa esecutrice consegni il proprio "Programma di



COMUNE DI GENOVA

esecuzione lavori” come definito ai sensi dell’art. 1 lett. f del Decreto 07/03/2018 n. 49, con particolare attenzione al coordinamento delle interferenze;

- che l’impresa esecutrice attivi la cantierizzazione sulle aree preventivamente concordate, avendo cura di relazionarsi con il CSE in merito alle scelte organizzative operate;
- che i lavori, in riferimento agli aspetti della sicurezza circa l’organizzazione del cantiere e l’eventuale gestione delle interferenze, vengano eseguiti secondo le modalità concordate con il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione e secondo le previsioni, prescrizioni e direttive contenute nel P.S.C. e nel POS dell’impresa esecutrice ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché del rispetto dei protocolli di sicurezza per l’emergenza COVID-19 laddove vigenti.

IL Sig. Angelo Panzetta nella sua qualità di Direttore Tecnico dell’impresa esecutrice PANZETTA S.R.L. dichiara:

- di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti all’esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi posti a carico dal precitato C.S.A.;
- di confermare che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori;
- di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, senza sollevare riserva od eccezione alcuna.

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.M. n. 49/2018, dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in **giorni 60 (sessanta)** naturali, cosicché l’ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il



15/04/2023.

Le operazioni di consegna di cui al presente verbale terminano alle ore 19.00
dello stesso giorno 15/02/2023.

Letto, confermato, sottoscritto

Note:

(A large diagonal line is drawn across the page, likely indicating a signature or cancellation.)



COMUNE DI GENOVA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Sabrina Pipino

[Redacted signature]

IL DIRETTORE OPERATIVO

Geom. Raffaele Pessina

L'IMPRESA PANZETTA S.R.L. (impresa esecutrice dei lavori)

Sig. Angelo Panzetta

[Redacted signature]

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Ing. Lorenzo Magrassi

[Redacted signature]

V.TO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Silvia Toccafondi

[Redacted signature]



c_1969.Comune di Genova - Rep. NP 16/02/2023.000038011



Firmato digitalmente da
PANZETTA
ANGELO
C=IT



**FACTORY
ARCHITECTURE
PORTE E DESIGN**

PANZETTA SRL

Oggetto: Museo di Sant'Agostino, Piazza di Sarzano 35r, "Restauro e manutenzione straordinaria dei serramenti esterni" I Stralcio. MOGE 15482.
Istanza proroga contrattuale.

Il sottoscritto Sig. Angelo Panzetta in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa PANZETTA SRL con sede Legale in TORINO(TO)

alla data di ultimazione dei lavori in oggetto prevista per il 15/04/2023, viste le condizioni atmosferiche durante l'esecuzione dei lavori che non permettono la prosecuzione delle lavorazioni in sicurezza.

CHIEDE

la proroga di giorni 10 (dieci) sulla data di ultimazione dei lavori.

Considerando anche il ritardo nel versamento dell'acconto non ancora ricevuto ma previsto entro i primi 15 giorni .

Cordiali saluti

P.F. 4240520017





COMUNE DI GENOVA

OGGETTO LAVORI DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERRAMENTI ESTERNI DEL MUSEO DI SANT'AGOSTINO, SITO IN GENOVA, PIAZZA SARZANO 35R - 2° STRALCIO RELATIVO A QUATTRO SERRAMENTI DI GRANDI DIMENSIONI CHE INSISTONO SUL PROSPETTO PRINCIPALE DI PIAZZA SARZANO.

CUP B34E17000490001 -MOGE 15482 - CIG 95206332E5

Contratto: cronologico n. 217 del 08/02/2023

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEI LAVORI E DELLE MODALITA' DI GARA: D.D. prot. n. 2022-212.1.08-82 del 27.12.2022

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: D.D. prot. n. 2022-212.1.0-82 del 14/12/2022 esecutiva dal 27/12/2022

APPALTATORE: impresa PANZETTA S.r.l. - pec: panzetta@pec.it

Concessione di proroga del termine previsto per l'ultimazione dei lavori

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 272 del 24/11/2022, è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto redatto dagli uffici della Direzione Attuazione Opere Pubbliche, per una spesa complessiva di Q.E. pari ad Euro 161.156,52;
- con determinazione dirigenziale della Direzione Attuazione Opere Pubbliche 2022-212.1.08-82 del 14.12.2022 esecutiva in data 27/12/2022 sono stati approvati il progetto esecutivo ed i lavori di: "Restauro e manutenzione straordinaria dei serramenti esterni del museo di Sant'Agostino, sito in Genova, piazza Sarzano 35r - 2° stralcio relativo a quattro serramenti di grandi dimensioni che insistono sul prospetto principale di piazza Sarzano " per un importo complessivo dei lavori valutati "a misura", da porre a base di gara, di complessivi Euro 141.048,62, di cui Euro 4.748,36 per oneri per la sicurezza, già predeterminati e non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA al 10%;
- con il medesimo provvedimento si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto a favore dell'impresa Panzetta S.r.l. con il ribasso offerto del 5,00%, per un importo contrattuale risultante di Euro 134.233,61 di cui Euro 4.748,36 per oneri per la sicurezza, già predeterminati e non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA al 10%, secondo le risultanze dell'affidamento diretto gestito su piattaforma Maggioli;
- il contratto d'appalto è stato stipulato in data 08/02/2023 al cronologico n. 217;



COMUNE DI GENOVA

- i lavori sono stati consegnati in data 15/02/2022 con durata prevista di 60 giorni naturali, successivi e continui, con scadenza al 15/04/2023 (verbale di consegna lavori prot. NP 16/00/2023.0000380.I);
- l'appaltatore con nota inviata per posta certificata in data 14/04/2023 (ha richiesto una proroga di 10 (dieci) giorni per l'ultimazione dei lavori motivandola per avverse condizioni atmosferiche;

Visto:

- la relazione del D.L. prot. NP.14/04/2023.0000808.I del 14/04/2023 che dichiara la necessità di una proroga per l'ultimazione dei lavori tenuto in conto delle difficoltà legate alle condizioni atmosferiche che non hanno reso possibile la prosecuzione delle attività in piena sicurezza;
- l'articolo 107, comma 5, del decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, si ritiene di accogliere le motivazioni riportate nella nota sopra citata, pertanto, sulla scorta delle previsioni normative e regolamentari, nonché dei provvedimenti di seguito riportati:
 - artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
 - art. 4 del D. Lgs. 165/2001;

CONCEDE

la proroga per 10 (dieci) giorni naturali, successivi e consecutivi al termine di ultimazione dei lavori che viene così a definirsi entro e non oltre il **25/04/2023**.

Il Responsabile unico del Procedimento

(arch. Silvia Toccafondi)

Il Dirigente Attuazione Opere Pubbliche

(arch. Emanuela Torti)



COMUNE DI GENOVA

ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

APPALTO PER LA CITTA' DI GENOVA FINANZIATO CON RISORSE

F.S.C. PROGRAMMAZIONE 2014-2020 – RESTAURO E MANJTENZIONE

STRAORDINARIA DEI SERRAMETI ESETRNI DEL MUSEO DI

SANT'AGOSTINOSITO IN GENOVA, PIAZZA SARZANO 35 R- 2°

STRALCIO RELATIVO A QUATTTRO SERRRAMENTI DI GRANDI

DIMENSIONI CHE INSISTONO SUL PROSPETTO PRINCIPALE DI

PIAZZA SARZANO

CUP: B34E17000490001 - CIG: 95206332E5 – MOGE: 15482

VERBALE DI VISITA DI COLLAUDO FINALE

L'anno 2023, il giorno 01 del mese di agosto, alle ore 10,00 in seguito a congruo

preavviso, oltre alla sottoscritta architetto Sabrina Pipino, Direttore dei Lavori, si

sono trovati in Genova, in Piazza Sarzano 35 R, presso il museo di Sant'Agostino, i

Signori:

1) Angelo Panzetta, direttore Tecnico dell'impresa esecutrice dei lavori Panzetta srl;

2) Architetto Silvia Toccafondi, Responsabile Unico del Procedimento.

Svolgimento della visita

Alla presenza degli intervenuti, la sottoscritta D.L., incaricata della redazione del

CRE, ha proceduto alla ricognizione dei lavori di cui trattasi sulla scorta degli

elaborati grafici del progetto esecutivo redatto dall'Architetto Mario Battistrada e dei

documenti contabili.

Si procede con la verifica delle opere di completamento richieste nel certificato di

ultimazione lavori NP 28/04/2023.0000908.I, allegato1, necessarie al buon esito del

collaudo e di seguito indicate:

finestra 1° piano lato ingresso museo:

1) serraggio di alcune viti sul traverso superiore

2) allineamento mascherina coibentata a rivestimento del traverso intermedio
alto;

3) ritocchi vari con smalto finitura RAL

4) pulizia vetri da tracce ventose movimentazione serramenti

finestra 1° piano lato PIAZZA Sarzano:

1) verifica del serraggio di alcune viti

2) ritocchi vari con smalto finitura RAL

3) pulizia vetri da tracce ventose movimentazione serramenti

finestra 2° piano lato ingresso museo:

1) revisione, allineamento e sigillatura della fascetta a mascheramento del
traverso orizzontale tra le due specchiature;

2) ritocchi vari con smalto finitura RAL

3) revisione della siliconatura irregolare su tutto il serramento

4) pulizia vetri da tracce ventose movimentazione serramenti

finestra 2° piano lato PIAZZA Sarzano:

1) revisione difetti rivestimento del traverso intermedio orizzontale con lamiera
coibentata (siliconature/sigillature, fissaggi, complanarità, pinzature) e
sigillatura della fascetta a mascheramento del traverso orizzontale tra le due
specchiature;

2) allineamento guarnizione espandente perimetrale lato muro

3) pulizia vetri da tracce ventose movimentazione serramenti

Su tutti i serramenti era richiesta la revisione della sigillatura esterna del controtelaio
laddove vi era penetrazione di luce e aria, anche ai fini di una possibile infiltrazione
d'acqua e della tenuta al passaggio del rumore; inoltre il ritocco di alcune zone in



COMUNE DI GENOVA

metallo con smalto finitura RAL e la revisione dell'incollaggio dei dissuasori

antivolatili alla piana davanzale.

In data 15/05/2023 previo concordamento con l'impresa Panzetta srl, si è proceduto

all'intervento di messa in atto di quanto richiesto nel verbale di ultimazione lavori.

Nella stessa data è stato redatto il certificato di *conferma ultimazione dei lavori* di cui

al Rep. NP 19/05/2023.0001079.I.

Si prende atto che l'impresa Panzetta srl ha fornito la seguente documentazione a

completamento dell'iter amministrativo:

- schede tecniche di tutti i materiali usati per la realizzazione dei serramenti e

dichiarazioni di conformità CE;

- dichiarazione di prestazione della vetrata 10mmTEMP SABBIATO+pvb

1,52+10mmTEMP SN70/35 / 24 Argon 90% / 6mmTEMP+ pvb 1,52+6mmTEMP

fornita dalla società BIVETRO srl;

- dichiarazione di corretta posa dei serramenti da parte dell'impresa Panzetta srl;

- dichiarazione di corretto assemblaggio di tutti gli elementi che formano i

serramenti, da parte dell'impresa Panzetta srl;

- manuale d'uso e manutenzione dei serramenti;

- elaborati grafici AS BUILT;

- DDT dei materiali utilizzati;

- formulario di identificazione dei rifiuti - FIR

La documentazione richiesta è stata fornita all'ufficio D.L. datata, timbrata e

sottoscritta dai soggetti responsabili del rilascio delle dichiarazioni.

Esito della visita di collaudo finale

Per quanto si può osservare a lavori ormai ultimati, si constata la buona qualità dei

materiali impiegati e l'esecuzione della lavorazione secondo le prescrizioni



COMUNE DI GENOVA

contrattuali; si conferma inoltre che le richieste avanzate nell'allegato 1 al verbale di fine lavori riguardanti le finiture, in data odierna soggette a verifica, sono state soddisfatte.

Si esprime la seguente richiesta:

verifica e controllo del serraggio delle viti e
ove necessario sostituzione su viti più
adeguate sui montanti verticali delle finestre
L'Impresa accetta



COMUNE DI GENOVA

La visita si conclude alle ore 11.00 ..


L'IMPRESA


Panzetta Srl


IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Sabrina Pipino


V.TO IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Arch. Silvia Toccafondi




COMUNE DI GENOVA

Addì 15.02.2023

OGGETTO: RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERRAMENTI ESTERNI DEL MUSEO DI SANT'AGOSTINO, SITO IN GENOVA, PIAZZA SARZANO 35R - 2° STRALCIO RELATIVO A QUATTRO SERRAMENTI DI GRANDI DIMENSIONI CHE INSISTONO SUL PROSPETTO PRINCIPALE DI PIAZZA SARZANO.

CUP: B34E17000490001- MOGE: 15482 - CIG: 95206332E5

Spett.le Impresa affidataria
ed Esecutrice dei lavori
PANZETTA S.R.L.
Via F. Cigna 44
CAP 10152 (TO)

E p.c.
D.O. Geom. Raffaele Pessina

ORDINE DI SERVIZIO N°1 del 14.02.2023

**Gentile appaltatore,
con il presente Ordine di Servizio si chiede:**

- di prevedere nell'ordine della fornitura del materiale per i quattro serramenti di grandi dimensioni da porre in opera presso il Museo di Sant'Agostino, sulla base del progetto redatto dall'architetto Mario Battistrada coerentemente con il computo metrico estimativo dallo stesso redatto, il costo del supplemento di sabbiatura dei vetri, in modo tale da riproporre la partizione verticale delle lastre vetrate dei serramenti attualmente esistenti.

Il costo del supplemento sabbiatura farà riferimento alla Vs. offerta di mercato qui allegata e pertanto assommerà a € 1335/cad X n. 4 serramenti per un totale di € 5.340,00 (diconsi euro cinquemilatrecentoquaranta/00) al netto del ribasso offerto del 5% (oltre IVA) come da contratto rep. n. 217/2023.

Distinti saluti

Il R.U.P. (arch. Silvia Toccafondi)

Il Direttore dei Lavori (arch. Sabrina Pipino)

PER ACCETTAZIONE E PRESA CONOSCENZA AD OGNI
EFFETTO

L'IMPRESA: PANZETTA S.R.L.



La tua vita merita sicurezza

VIA CIGNA NR.44-10152-TORINO
P.I.04240520017 info@panzetta.it

Spett.le
MUSEO S.AGOSTINO

GENOVA

PREVENTIVO

Protocollo N° P00653/22 del 26-10-2022

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	PREZZO	SCONTO	IVA
010	ABBIAMO IL PIACERE DI SOTTOPORRE ALLA VOSTRA CORTESE ATTENZIONE LA NOSTRA MIGLIORE OFFERTA PER LA REALIZZAZIONE DI :		1,00	0,00		22
	NR.4 MODULI VETRATI FISSI A PROFILO MOGS T42TB MIS.3450 X 3740 MM.	NR.	1,00	40.400,00		22
	VERNICIATURA A TINTA RAL	NR.	1,00	3.600,00		22
	VETRI 10+10,4 FG TEMPERATO /24 GAS /6+6.4 BE FG TEMPERATO	NR.	1,00	39.000,00		22
	MOVIMENTAZIONE VETRI	NR.	1,00	4.800,00		22
	TRASPORTO ,POSA ,SMONTAGGIO DEL VECCHIO E SMALTIMENTO (ESCLUSI EVENTUALI PERMESSI SUOLO OCCUPAZIONE PUBBLICO) EVENTUALE SUPPLEMENTO VETRO SELETTIVO +€ 3240,00 CAD.A MODULO EVENTUALE SUPPLEMENTO SABBIAATURA (PARTIZIONI DEI VETRI ESISTENTI) € 1335,00 CAD.A MODULO	NR.	1,00	3.900,00		22

Totale Preventivo: 91.700,00

CONDIZIONI DI FORNITURA:
- I.V.A. VS. CARICO

NOTE:
ESCLUSO QUANTO NON ESPRESSAMENTE SPECIFICATO

PAGAMENTO : 40% ACCONTO ALL'ORDINE ,40% AL PRONTO E SALDO ALLA CONSEGNA .

ALLEGATO 5



Scala Legale e amministrativa:
Via Brascon 15
40040 Gazzolo degli Ippoliti
Immunovalenza 885 1
Tel. +39 - 0576 985.600
www.marcegaglia.com

Cliente
SICAM SPA
Via Fatebenefratelli 15
20121 MILANO IT

Destinatario Merco
SICAM SPA
VIA MARZIANA 21
27020 PARONA LOMELLINA IT

Tipo 3.1 CERTIFICATO DI COLLAUDO EN10204
Numero 10322342034
Creato il 19/05/2022
N° Consegna 8263637535
De 19/05/2022
N° doc. di trasp. 1003007006
Ufficio Qualità
Valid. A.Ferrari
Stab. Cassinmaggiore

Pagine 1/2

N° Perla	Classe	Colore	C (%)	Mn (%)	Si (%)	P (%)	S (%)	Al (%)	CEV (%)	Rr (N/mm²)	Rrh (N/mm²)	A (%)	Kv1 (J)	Kv2 (J)	Kv3 (J)	Kv4 (J)
----------	--------	--------	-------	--------	--------	-------	-------	--------	---------	------------	-------------	-------	---------	---------	---------	---------

58006870 TNQ021 100.0x 100.0x10(E)x 12000 S355J2H EN10219-1 1191465509/20 133 Data 06/05/2022
TUBO NERO QUADRO SALDATO ERW


22C2014255	3637 KG	SU69248	.200	1.451	2.130	.0121	.0021	.035	.441	590	500	21.0	90	85	85	86
22C2014256	3642 KG	SU69248	.200	1.451	2.130	.0121	.0021	.035	.441	590	500	21.0	90	85	85	86
22C2014257	3628 KG	SU69248	.200	1.451	2.130	.0121	.0021	.035	.441	590	500	21.0	90	85	85	86

58006870 TNQ021 100.0x 100.0x10(E)x 12000 S355J2H EN10219-1 1191475317/80 269 Data 31/05/2022
TUBO NERO QUADRO SALDATO ERW


22C2014253	3640 KG	SU69248	.200	1.451	2.130	.0121	.0021	.035	.441	590	500	21.0	90	85	85	86
22C2014254	3646 KG	SU69248	.200	1.451	2.130	.0121	.0021	.035	.441	590	500	21.0	90	85	85	86

58007741 TNH021 150.0x 100.0x10(E)x 12000 S355J2H EN10219-1 1191475317/140 269 Data 31/05/2022
TUBO NERO RETTANGOLO SALDATO ERW

22C2009554	3596 KG	SQ77701	.207	1.452	.2030	.0128	.0009	.047	.448	590	498	21.5	87	93	82	87
22C2009552	3588 KG	038418	.165	1.503	.0100	.0154	.0017	.037	.415	574	487	22.5	83	88	78	83



CERTIFICATO VALIDO PER: SCATOLATO 100X100X10
FORNITO ALLA DITTA: PANZETTA SRL
CON NS. D.D.T. 290 DEL 20.01.2023
ORBASSANO II 20.01.23



0474
13
MARCcegaglia
CARBON STEEL
S.p.A. 429 Subbionda
Cassina Italia
EN 10219-1:2006

Note:
Certifichiamo che i prodotti sopra elencati sono conformi alle prescrizioni dell'ordine

Controllo visivo e dimensionale OK

Prova di resistenza a -20° C

Controllo non distruttivo sec. ISO 10893-1-2 100 % OK

La Dichiarazione di Prestazione è disponibile sul sito Marcegaglia:

http://www.marcegaglia.com/cassinmaggiore-dcp/

Mod. 055M Rev. 3 Data 29-06-09

Spett. CHIAVASSA ANTONIO & FIGLI SRL
Certificato emesso il 20/07/2022 Fatt. n° 11519-7 del 20/07/2022
Dimensioni: 100 x 100 x 10 620 KG Pezzi: 2 Col./Entr.: SU69248

F. ZAMBRUNO

SICAM SPA

THIS DOCUMENT IS REPRODUCED BY A COMPUTERIZED SYSTEM
AND IS CONFORM TO THE ORIGINAL.



Scala Legale e amministrativa:
Via Brascani 15
40040 Gazoldo degli Ippoliti
Varese (VA) - Italia
Tel. +39 - 0376 885.800
Fax. +39 - 0376 885.800
www.marcegaglia.com

Cliente
SICAM SPA
Via Fatebenefratelli 15
20121 MILANO IT

Destinatario Merco
SICAM SPA
VIA MARZIANA 21
27020 PARONA LOMELLINA IT


Tipo	3.1 CERTIFICATO DI COLLAUDO EN10204
Numero	10322342034
Creato il	19/05/2022

N° Consegna	8263637535	Ufficio Qualità	Paigine
De	19/05/2022	Valid. A.Ferrari	2/2
N° doc. di trasp.	1003007006	Stab. Cassalmaggiore	

N° Perfillo	Classe	Coilata	C (%)	Mn (%)	Si (%)	P (%)	S (%)	Al (%)	CEV (%)	Rr	Rsh	A	Kv1 [J]	Kv2 [J]	Kv3 [J]	Kv4 [J]
-------------	--------	---------	-------	--------	--------	-------	-------	--------	---------	----	-----	---	---------	---------	---------	---------

580125669	TNCO21	140.0x	140.0x	6(E)X	12000	S355J2H	EN10219-1	1191	475317	300	269	Data	01/03/2022				
22C2009590	3423	KG	221208	.190	.920	.0300	.0020	.024	.343	532	461	25.5	60	56	63	59	


TUBO NERO QUADRO SALDATO ERW



CERTIFICATO VALIDO PER: SCATOLATO 100X100X10
FORNITO ALLA DITTA: PANZETTA SRL
CON NS. D.D.T. 290 DEL 20.01.2023
ORBASSANO Ii 20.01.23



Note:
Certifichiamo che i prodotti sopra elencati sono conformi alle prescrizioni dell'ordine
Controllo visivo e dimensionale OK
Prova di resistenza a -20° C
Controllo non distruttivo sec. ISO 10893-1-2 100 % OK
La Dichiarazione di Prestazione è disponibile sul sito Marcegaglia:
<http://www.marcegaglia.com/cassalmaggiore-dcp/>



0474
13
MARCCEGAGLIA
CARBON STEEL
S.p.A. 429 Subbionzana
Cassalmaggiore (VA)
Città di Cremona - Italia
EN 10219-1:2006

ALLEGATO 6

Cliente
CHIAVASSA ANTONIO & FIGLI S.R.L.
VIA CIRCONVALLAZIONE INTERNA 1
10043 ORBASSANO IT

Destinatario/Merci
CHIAVASSA ANTONIO & FIGLI S.R.L.
VIA CIRCONVALLAZIONE INTERNA 1
10043 ORBASSANO IT

N° Consegna
Del
N° doc. di trasp.

8291808858
11/10/2022
1021006452

Controllo Qualità
RESP. D. Cottino
Slab. Dusino

Pagine
2/3

N° Partita Q.tà Colata C (%) Si (%) Mn (%) P (%) S (%) Al (%) CEV (%) Re (N/mm²) Rm (N/mm²) A5 (%)

58002288 TNR 80.0x 40.0x 2(E)x 6000 S235JRH - S235JRH EN10219-1.1191545485/20 TELEF. 0710222GIOVAN Data 11/10/2022

TUBO NERO RETTANGOLO

22P7020522 1 PAC .104 .026 .447 .0089 .0059 .035 .189 371 405 31.4

58003766 TNR 50.0x 40.0x 2(E)x 6000 S235JRH - S235JRH EN10219-1.1191545485/40 TELEF. 0710222GIOVAN Data 02/11/2022


TUBO NERO RETTANGOLO

22P5020445 1 PAC .111 .003 .387 .0120 .0100 .033 .175 343 382 33.7

58003773 TNR 100.0x 20.0x 2(E)x 6000 S235JRH - S235JRH EN10219-1.1191545605/20 TELEF. 0710222GIOVANN Data 07/10/2022

TUBO NERO RETTANGOLO


22P7025840 1 PAC .092 .018 .364 .0109 .0121 .030 .161 357 392 32.4



CERTIFICATO VALIDO PER: TUBOLARE 100X20X2
FORNITO ALLA DITTA: PANZETTA SRL
CON NS. D.D.T. 290 DEL 20.01.2023
ORBASSANO IT 20.01.23



Note:
Controllo visivo e dimensionale OK
Certifichiamo che i prodotti sopra elencati sono conformi alle prescrizioni dell'ordine.
La Dichiarazione di Prestazione è disponibile sul sito Marcegaglia:
<http://www.publications.marcegaglia.com/dusino-dop/>



ALLEGATO 7



SPEED BOLT S.r.l. con socio unico

Soggetta a direzione e coordinamento di Max S.r.l.

Sede: Via Santi Grisante e Daria, 86/B

42124 Reggio Emilia (RE)

Tel. 0522 757522 - 0522 272898 - Fax 0522 926115

speedbolt@legalmail.it

Capitale sociale € 50.000,00 inter. versato

R.E.A. Reggio Emilia 281702

Codice Fiscale e Partita Iva IT02441990351



CERTIFICATE

Nr. 230582

07-03-23

Page 1 / 1

AZZI FAUSTO SRL

VIA V. ALFIERI 80

26036 VILLANOVA-RIVAROLO DEL RE CR

ITALIA

DICHIARAZ. DI CONFORMITA' ALL' ORDINE 2.1 UNI EN 10204

ORDER COMPLIANCE DECLARATION TYPE 2.1 EN 10204

Delivery Note: 230582

07-03-23

Item	Description	Batch	Quantity
Your order:	Mail	27-02-23	
1	35933 8X30 VITI TUTTO FIL. 10.9 TSPEI UNI 5933 8X30 Grezzo ISO 898/1	38178 N.	200
2	35933 8X40 VITI TUTTO FIL. 10.9 TSPEI UNI 5933 8X40 Grezzo ISO 898/1	38179 N.	200

Attestiamo che i prodotti forniti e indicati nella presente dichiarazione sono conformi all'ordine.

We declare that the products supplied and mentioned in the following declaration comply to the order.



SPEED BOLT S.r.l. socio unico
Sede: Via Santi Grisante e Daria, 86/b
42124 Reggio Emilia (RE)
Tel 0522 757 522 - 0522/272 898 - Fax 0522 926 115
Codice Fiscale e Partita Iva IT02441990351



SPEED BOLT S.r.l. con socio unico

Soggetta a direzione e coordinamento di Max S.r.l.

Sede: Via Santi Grisante e Daria, 86/B

42124 Reggio Emilia (RE)

Tel. 0522 757522 - 0522 272898 - Fax 0522 926115

speedbolt@legalmail.it

Capitale sociale € 50.000,00 inter. versato

R.E.A. Reggio Emilia 281702

Codice Fiscale e Partita Iva IT02441990351



CERTIFICATE

Nr. 230740

22-03-23

Page 1/1

AZZI FAUSTO SRL

VIA V. ALFIERI 80

26036 VILLANOVA-RIVAROLO DEL RE CR

ITALIA

DICHIARAZ. DI CONFORMITA' ALL' ORDINE 2.1 UNI EN 10204

ORDER COMPLIANCE DECLARATION TYPE 2.1 EN 10204

Delivery Note: 230740

22-03-23

Item	Description	Batch	Quantity
Your order:	1283110	22-03-23	
1	35933 8X30 VITI TUTTO FIL. 10.9 TSPEI UNI 5933 8X30 Grezzo ISO 898/1	38305 N.	200

Attestiamo che i prodotti forniti e indicati nella presente dichiarazione sono conformi all'ordine.

We declare that the products supplied and mentioned in the following declaration comply to the order.




SPEED BOLT S.r.l. con socio unico
Sede: Via Santi Grisante e Daria, 86/b
42124 Reggio Emilia (RE)
Tel. 0522 757 522 - 0522 272 898 - Fax 0522 926 115
Codice Fiscale e Partita Iva IT02441990351

ALLEGATO 8


UNI 5933
DIN 7991
passo grosso

Viti a testa svasata piana con cava esagonale interamente filettate

Hexagon socket countersunk head cap screws



Tolleranze di lavorazione	UNI ISO 4759-1 Categoria A
Caratteristiche meccaniche	UNI 3740-3
Norme di collaudo	UNI 3740-8
Materiale	Acciaio ad altissima resistenza
Classe	010.9
Resistenza alla rottura per trazione	1000 N/mm ²
Limite di elasticità	900 N/mm ²
Allungamento min	9%
Filettatura metrica ISO grado medio	6g UNI 5541
Finitura superficiale	Annerite
Codice	031001

Dimensioni in mm

d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	(M14)	M16	M20
D	6	8	10	12	16	20	24	27	30	36
K	1,7	2,3	2,8	3,3	4,4	5,5	6,5	7	7,5	8,5
S	2	2,5	3	4	5	6	8	10	10	12
b	12	14	16	18	22	26	30	34	38	46

 PER 1000 PEZZI ~ kg

L = 6	0,38	0,77								
8	0,47	0,92	1,60	2,35						
10	0,56	1,07	1,85	2,70	5,47					
12	0,65	1,23	2,10	3,05	6,10	10,1				
(14)	0,72	1,42	2,22	3,25	6,40	11,0				
16	0,83	1,53	2,59	3,76	7,35	12,1				
(18)	0,89	1,76	2,70	3,95	7,64	12,9				
20	1,00	1,84	3,09	4,46	8,60	14,1	21,2			
25	1,35	2,23	3,71	5,34	10,2	16,6	24,8	32,6		
30	1,63	2,90	4,33	6,22	11,7	19,1	28,5	37,6	51,8	
35		3,40	5,43	7,10	13,3	21,6	32,1	42,5	58,4	91,4
40		3,90	6,20	8,83	14,8	24,1	35,7	47,4	65,1	102
45			6,35	9,00	16,5	26,3	37,9	52,3	70,7	110
50			7,74	11,0	19,9	30,1	43,0	57,3	78,4	123
55				13,0	22,5	32,0	45,1	62,2	84,0	131
60				15,2	25,0	35,7	54,0	67,1	91,7	143
70					30,1	41,2	62,9	72,0	111	164
80					35,2	46,7	71,8	76,9	130	185
90						52,2	80,7	86,7	149	206
100						57,7	89,6	96,5	169	227
	1000	500	200	100	50					

- Per viti a Passo Fine e per misure non indicate chiedere offerta.
- Le misure all'esterno della parte retinata possono essere fornite anche parzialmente filettate.

- Si deve evitare l'impiego di viti con dimensioni tra parentesi.
- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm³.

ALLEGATO 9

Nastro sigillante MULTI TAPE

Il nastro sigillante autoespandente per giunti interni ed esterni con multifunzionalità BG1/BGR.



Sigillatura di serramenti



Nastro di tenuta per l'isolamento dei giunti di pannelli isolanti.

MATERIALI DI SUPPORTO

Aderisce a tutti i materiali da costruzione standard, come:

- Calcestruzzo
- Fibrocemento
- Muratura
- Lastre di cartongesso
- Legno
- Plastiche (non su PE, PP, Teflon e silicone)
- Elementi anodizzati
- Metalli
- Vetro

CERTIFICAZIONI



VANTAGGI

- Prodotto conforme alla UNI 11673-1
- Testato secondo i requisiti della Normativa Tedesca DIN 18542. Il nastro Multi Tape risponde alle prescrizioni del Gruppo di Sollecitazione BG1/BGR.
- Unico prodotto per la gestione dei tre piani funzionali del giunto secondario a favore di un montaggio semplice, veloce ed economico.
- Nastro sigillante a multi-funzione: freno vapore lato interno, permeabile all'umidità nella sua profondità e a tenuta alla pioggia battente sul lato esterno.
- Resistente ai raggi UV.
- Ottima resistenza al flusso di calore e alla pressione sonora.
- Elasticità permanente.
- Idoneo su tutte le superfici edili, non macchia e non sporca.
- Aderisce anche su superfici non speculari riempiendo le cavità.

APPLICAZIONI


- Nastro autoespandente a tripla funzione per giunti soggetti a carichi statici e dinamici. Con un unico prodotto si garantisce la sigillatura di giunti di porte e finestre: tenuta all'aria all'interno; isolamento termico e acustico nella zona centrale; tenuta alla pioggia battente all'esterno.

FUNZIONAMENTO

- Nastro autoespandente in schiuma di poliuretano impregnato con tecnopolimeri.
- Le superfici devono essere asciutte, pulite e senza olio, grasso e polvere.
- Scegliere il nastro adatto in funzione delle dimensioni del giunto: lo spessore iniziale del nastro non espanso deve essere sempre inferiore alla larghezza del giunto, la sua larghezza inferiore alla profondità del giunto.
- Considerare 10 mm di nastro in più per ogni metro di giunto da sigillare/riempire.
- Togliere la pellicola protettiva e incollare il nastro su una delle due superfici. Utilizzare una spatola se necessario.
- Posizionare il lato del nastro di colorazione grigio chiaro oppure con logo fischer stampato verso l'interno del serramento.
- Realizzare le giunzioni a "L", "T", e "X" senza piegare il nastro contro gli spigoli del serramento, ma accostando le sue estremità tagliate ad angolo retto. Nel giunto a "L" una delle sezioni del nastro deve essere prolungata oltre lo spigolo del serramento per una lunghezza pari allo spessore della fuga S_g .

Nastro sigillante MULTI TAPE

DATI TECNICI

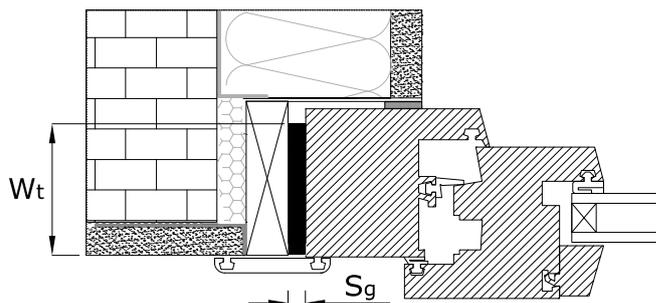

Nastro sigillante **Multi Tape**

Prodotto	Art. n°	Larghezza nastro W_t [mm]	Larghezza fuga S_g [mm]	Lunghezza nastro [m]	Stoccaggio [mesi]	Contenuto per imballo	Confezione [pz]
Multi Tape 30/7-15	560543	30	7 ÷ 15	4,3	12	5 Nastri Multi Tape 30/7-15	1
Multi Tape 54/5-10	536487	54	5 ÷ 10	5,6	12	5 Nastri Multi Tape 54/5-10	1
Multi Tape 64/5-10	536488	64	5 ÷ 10	5,6	12	4 Nastri Multi Tape 64/5-10	1
Multi Tape 64/7-15	537066 1)	64	7 ÷ 15	4,3	12	4 Nastri Multi Tape 64/7-15	1
Multi Tape 74/5-10	536838 1)	74	5 ÷ 10	5,6	12	4 Nastri Multi Tape 74/5-10	1

1) Prezzi e tempi di consegna disponibili su richiesta.


CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristica tecnica	Unità di misura	Normativa di riferimento test	Valore
Base	[-]	[-]	dispersione polimerica ignifuga
Consistenza	[-]	[-]	schiuma morbida PUR impregnata
Colore	[-]	[-]	nero (est.), grigio chiaro/logo fischer stampato (int.)
Gruppo di sollecitazione	[-]	[DIN 18542]	BG1 e BGR
Permeabilità all'aria	$[m^3/(h \cdot m (daPa)^{2/3})]$	[DIN EN 12114]	$a \leq 0,1$
Tenuta alla pioggia battente	[Pa]	[DIN EN 1027]	$\Delta p \geq 600$
Tenuta alla pioggia battente nell'incrocio delle fughe	[Pa]	[DIN EN 18542]	$\Delta p \geq 600$
Resistenza alle variazioni di temperatura	[°C]	[DIN 18542]	-30 ÷ +80
Resistenza alla luce e agli agenti atmosferici	[-]	[DIN 18542]	conforme
Compatibilità con materiali edili adiacenti	[-]	[DIN 18542]	conforme
Classificazione resistenza al fuoco materiali edili	[-]	[DIN 4102]	B1
Conducibilità termica	$[W/(m \cdot K)]$	[DIN 12667]	$\lambda = 0,046$
Resistenza alla diffusione di vapore	[-]	[DIN EN ISO 12572]	$\mu \leq 100$
Gradiente di pressione del vapore	[-]	[-]	freno vapore lato interno traspirante lato esterno
Isolamento acustico $R_{ST,w}$	[dB]	[DIN EN ISO717-1]	41 non intonacato 57 intonacato su un lato 59 intonacato su entrambi i lati
Valore-U (profondità profilo finestra 75 mm)	$[W/(m^2 \cdot K)]$	[DIN 4108-3]	0,056
Emissione di sostanze volatili (VOC - COV)	$\mu g/m^3$	ISO 16000	TVOC < 5
Range temperatura di stoccaggio	[°C]	[-]	+5 ÷ +20
Tempo di stoccaggio	[-]	[-]	12 mesi

ALLEGATO 10

Silicone serramenti neutro SNF

Sigillante siliconico neutro a base alcoxi e a basso modulo, per l'installazione di serramenti.

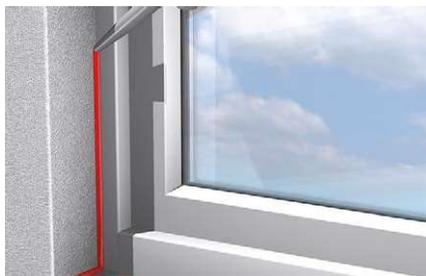

Sigillatura interna ed esterna di serramenti



Sigillatura di vetrate

MATERIALI DI SUPPORTO

- Calcestruzzo
- Muratura
- Legno
- Plastiche (non su PE, PP, Teflon)
- Metalli (anche alluminio)
- Vetro
- Superfici smaltate
- Ceramiche

Non idoneo per:

- Pietra naturale e specchi
- Substrati bituminosi

CERTIFICAZIONI

			
EN 15651-1 F EXT-INT CC EN 15651-2 G CC EN 15651-3 XS1 EN 15651-4 PW EXT-INT CC		EN 15651-1 F EXT-INT CC EN 15651-2 G CC EN 15651-4 PW INT	
SNF TR e BI		SNF COLORATI	



VANTAGGI

- Marcato CE per sigillatura di facciate (lato interno e/o esterno, anche per clima freddo) e vetrate (anche per clima freddo).
- Prestazioni conformi alla UNI 11673-1.
- Buona adesione su supporti porosi e non porosi.
- Elevata elasticità, ideale per giunti altamente flessibili.
- Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV in condizioni di irraggiamento standard.
- Non odora e non contiene solventi. Non corrosivo.
- Non verniciabile.
- Bassissime emissioni EC1 PLUS.

APPLICAZIONI

Certificato per la sigillatura non strutturale di:

- Facciate in ambito edile F EXT-INT CC, lato interno e/o esterno, anche per clima freddo (es. pannelli prefabbricati in calcestruzzo)
- Vetrate G CC, anche per clima freddo
- Ambito sanitario XS1 (solo trasparente e bianco)
- SNF TR e BI: Pavimentazioni calpestabili PW EXT-INT CC
- SNF COLORATI: Pavimentazioni calpestabili PW INT
- SNF TR e BI: Resistenza alla muffa XS1

Adatto anche per la sigillatura di:

- Finestre
- Porte
- Telai e controtelai
- Giunti di costruzione in genere

FUNZIONAMENTO


- Eliminare dalle superfici sporco, polvere, olio e ruggine. Smerigliare o sabbare le superfici porose. Pulire vetro e metalli con solvente.
- Tagliare l'estremità di estrusione, applicare il beccuccio alla cartuccia tagliare la punta per adattarla alle dimensioni del giunto ed inserire in un dispenser per silicone fischer KPM 2 PLUS o KPM 3.
- Applicare il nastro adesivo ai margini del giunto e quindi il prodotto lungo lo stesso. Livellare con spatola. Rimuovere il nastro dai bordi del giunto.
- Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR 500, salviette multiuso SAL 70 o acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

Silicone serramenti neutro SNF

DATI TECNICI

Prodotto	Art. n°	Colore	Stoccaggio [mesi]	Contenuto	Confezione [pz]
				V [ml]	
SNF TR	009391	Trasparente	15	310	25
SNF BI	009379	Bianco RAL 9010	15	310	25
SNF GR	009374	Grigio RAL 7004	12	310	25
SNF AV	009375	Avorio RAL 1013	12	310	12
SNF MA	009380	Marrone RAL 8017	12	310	12
SNF NE	009392	Nero RAL 9005	12	310	25
SNF TM	009376	Testa di moro RAL 8014	12	310	25
SNF AL	009378	Alluminio RAL 9006	12	310	12
SNF VEM	071317	Verde metallizzato	12	310	12
SNF GRM	071318	Grigio metallizzato	12	310	12
SNF MAM	071319	Marrone metallizzato	12	310	12
SNF DO	571330	Douglas	12	310	12
SNF RO	571331	Rovere	12	310	12
SNF MC	571332	Mogano/ciliegio	12	310	12
SNF CA	009381	Camoscio RAL 8007	12	310	12

INSTALLAZIONE



CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristica tecnica	Unità di misura	Normativa di riferimento test	SNF TR e BI	SNF COLORATI
Classe di reazione al fuoco	[-]	EN 13501-1	F	F
Classe di reazione al fuoco	[-]	DIN 4102-2	B3	B3
Base	[-]	-	Alcolica neutra	Alcolica neutra
Consistenza	[-]	-	Pasta stabile	Pasta stabile
Sistema di polimerizzazione	[-]	-	Monocomponente con umidità	Monocomponente con umidità
Colore	[-]	-	Trasparente e Bianco	Colori vari
Densità	[g/ml]	-	1,02 ± 0,01	1,02 ± 0,01
Resistenza a scorrimento	[mm]	ISO 7390	Non cola	Non cola
Durezza Shore A	[-]	ISO 868	~24	~20
Resistenza a trazione	[MPa]	ISO 8339	0,7	0,5
Modulo elastico 100%	[MPa]	ISO 8339	0,35	0,32
Allungamento a rottura	[%]	ISO 8339	250 ÷ 350	250 ÷ 350
Variazione di volume	[%]	ISO 10563	<10	<10
Recupero elastico	[%]	ISO 7389	≥70	≥70
Tempo di formazione della pelle	[min]	-	~30 (+23 °C / 50% R.H.)	~30 (+23 °C / 50% R.H.)
Velocità di indurimento	[mm/giorno]	-	2 (+23 °C / 50% R.H.)	2 (+23 °C / 50% R.H.)
Range temperatura di applicazione	[°C]	-	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40
Range temperatura di esercizio	[°C]	-	-40 ÷ +150	-40 ÷ +180
Range temperatura di stoccaggio	[°C]	-	+5 ÷ +25	+5 ÷ +25

AVVERTENZE

- Consultare la scheda di sicurezza (SDS) prima di utilizzare il prodotto.
- Data la varietà di vernici e plasticizzanti in commercio, si consiglia una prova preliminare in caso di dubbi.

STOCCAGGIO / SMALTIMENTO

- Il prodotto deve essere stoccato in luogo fresco e asciutto in contenitori integri e al riparo da agenti atmosferici.
- La cartuccia in polietilene (PE) può essere smaltita come plastica riciclabile se completamente vuota.
- Il prodotto non indurito deve essere smaltito come rifiuto speciale.
- Il prodotto indurito deve essere smaltito come rifiuto secco non riciclabile.
- fischer raccomanda di smaltire i rifiuti sempre in conformità alle normative vigenti.

ALLEGATO 11

FORMULARIO RIFIUTI

NUMERO REGISTRO

DATA EMISSIONE FORMULARIO

11-05-23

JDSL 000013 S

PRIMA SEZIONE

1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale

PANZETTA SRL

Unità Locale

CORSO TOSCANA 17 10078 USMATE

Codice Fiscale

04240520017

Numero Autorizzazione/Albo

T031657

del 16-03-23

2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale

AP TRADE SRL

Luogo di Destinazione

VIA OCCIDENTO 4 TORINO

Codice Fiscale

12679170016

Numero Autorizzazione/Albo

239-23059

del 01-06-18

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale

PANZETTA SRL

Indirizzo

[Redacted address]

Codice Fiscale

04240520017

Numero Autorizzazione/Albo

T031657

del 16-03-23

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento

Situato in:

ANNOTAZIONI

CE39035 GRATUITA

SECONDA SEZIONE

4 CARATTERISTICHE del RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del Rifiuto

METALLI FUSI

CODICE del RIFIUTO

170-402

STATO FISICO

① ② ③ ④

SOLIDO

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

NON PERICOLOSO

N. COLLETTORI/CONTENITORI

1500

5 DESTINAZIONE del RIFIUTO

Recupero Smaltimento

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

NON PERICOLOSO

6 QUANTITÀ

p. Lordo:

litri

Tara:

litri

Peso da verificarsi a destino

7 PERCORSO

Se diverso dal più breve:

8

TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID

9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE o DETENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

10 MODALITÀ e MEZZO di TRASPORTO

Targa automezzo

60276 XK

Targa rimorchio

Cognome e Nome del Conducente

ITALIS NICOLA

INIZIO Trasporto

Data:

11-05-23

Ora:

09.30

11 RISERVATO al DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:

Accettato per intero:

X

Accettato per le seguenti quantità:

litri

804

Respinto per le seguenti motivazioni:

Data:

11-5-23

Ora:

10:41

Firma del Destinatario:

AP TRADE SRL P.I.: 12679170014



Vid. Virt. del 10/05/2023 09:14:21 per conto della Camera di Commercio di Torino, rich. da 04240520017 - PANZETTA S.R.L.

JDSL 000013 S

Copia Produttore Destinatario Stampare in duplice copia. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.

FORMULARIO RIFIUTI

NUMERO REGISTRO

DATA EMISSIONE FORMULARIO

12/05/23

JDSL 000015 N

1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale

PANZETTA SRL

Unità Locale

C. SO. TOSCANA NR. 19 - 10048 VENARIA

Codice Fiscale

04240520017

Numero Autorizzazione/Albo

TO31657

del

16/03/23

2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale

CASETTA PIETRO di CASETTA ALDO

Luogo di Destinazione

[Redacted]

Codice Fiscale

087697460015

Numero Autorizzazione/Albo

M/6981-17

del

16/05/17

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale

PANZETTA SRL

Indirizzo

[Redacted]

Codice Fiscale

04240520017

Numero Autorizzazione/Albo

TO31657

del

16/03/23

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento

Situato in:

C. SO. TOSCANA NR. 19 - VENARIA

ANNOTAZIONI

4 CARATTERISTICHE del RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del Rifiuto:

VETRO

CODICE del RIFIUTO

170 202

STATO FISICO

SOLIDO

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

NESSUNA

N. COLLI/CONTENITORI

SPUNTO

5 DESTINAZIONE del RIFIUTO

Recupero

Smaltimento

R13

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

6 QUANTITÀ

p. Lordo:

500 litri

Tara:

Peso da verificarsi a destino

7 PERCORSO

Se diverso dal più breve

TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID

SI

NO

9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE o DETENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

10 MODALITÀ e MEZZO di TRASPORTO

Targa automezzo

GE276 X K

Targa rimorchio

Cognome e Nome del Conducente

GRITAUDI RAFFAELE

Inizio Trasporto

Data:

12/05/23

Ora:

14.40

11 RISERVATO al DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:

Accettato per intero

Accettato per le seguenti quantità:

800 litri

Respinto per le seguenti motivazioni:

Data:

12/05/2023

Ora:

16.30

Firma del Destinatario:

[Redacted]

Vid. Virt. del 12/05/2023 13:00:04 per conto della Camera di Commercio di Torino, rich. da 04240520017 - PANZETTA S.R.L.

Via Torino, [Redacted] IASCO (TO)
Tel. 011 9790123 Fax 011 9790472
Partita IVA 0897450015
Aut. Dip. Del. 111 - JDSL 000015 N
Aut. Trasporto: TO 00497 del 08/09/2022



Stampare in duplice copia. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto alla destinazione.

Pesatura eseguita con apparecchio Imprimente Mod. IM. 65 - DITTA BURONI OPESSI S.p.A. - PINEROLO (TO)

0	3	6	6L
0	2	2	6L
			50

LORDO	Automezzo	MANZETTA
TARA	Merce	besto mite
NETTO	Data	12/05/23 N.

CASETTA PIETRO sas
di Casetta Aldo & C.
RECUPERO VETRO
LOMBRIASCO TO
011 9790123
C.B. S.Panzetta (RA) - Tel. 0543324245



La tua vita merita sicurezza

P.I.04240520017 info@panzetta.it

FATTURA/D.D.T. ART. 1,3° COMMA D.P.R. 472/96 DEL 14.08.96

Spett.le
COMUNE DI GENOVA
VIA GARIBALDI 9
16100 GENOVA GE

DESTINAZIONE
MUSEO ST.AGOSTINO GENOVA
PIAZZA SARZANO 35R
16100 GENOVA GE

DDT

Table with 6 columns: N.E DATA DOCUMENTO, CLIENTE, CODICE FISCALE, PARTITA IVA, RIFERIMENTO, N.PAG.

Table with 2 columns: AGENTE, MODALITA' DI PAGAMENTO, BANCA D'APPOGGIO:


Main table with 8 columns: CODICE, DESCRIZIONE, U.M., Q.TA', PREZZO UNIT., SCONTI, IMPORTO, IVA. Contains detailed description of window modules.

Table with 4 columns: TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE, CAUSALE DEL TRASPORTO, INIZIO TRASPORTO O RITIRO, FIRMA DEL CONDUCENTE.

Table with 4 columns: VETTORE, FIRMA DEL DESTINATARIO, ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA, PORTO, N.COLLI, PESO (KG), CUBATURA, DATA E ORA DELLA CONSEGNA.


ALLEGATO 12

Item: 1 Serramento fisso

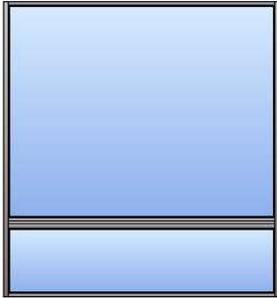


View:	Internal
Type:	2
Prof.Serie:	_T42TB / _MOGS_COM
Qty: 2, Dimension (WxH): 3450x3740	
Total surface: 2x12,9 mq = 25,8 mq	
Perimeter: 2x14,38 m = 28,76 m	
Exter.Color:	, ,
Inter.Color:	, ,
Fit.Color:	, , +CROMO SATINATO, ,
Glasses:	10-10-24-66.2
Panels:	
Location:	

Item: 2 Serramento fisso

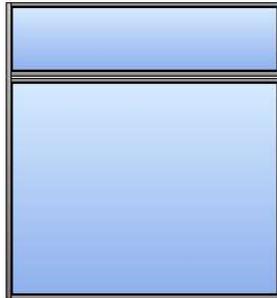

View:	Internal
Type:	3
Prof.Serie:	_T42TB / _MOGS_COM
Qty: 2, Dimension (WxH): 3450x3740	
Total surface: 2x12,9 mq = 25,8 mq	
Perimeter: 2x14,38 m = 28,76 m	
Exter.Color:	, ,
Inter.Color:	, ,
Fit.Color:	, , +CROMO SATINATO, ,
Glasses:	10-10-24-66.2
Panels:	
Location:	

Totals	
Area:	51,61 mq
Perimeter:	57,52 m





Item: 1 Type: 2 Size: 3450x3740 Area: 12,9 mq
 Description: Serramento fisso
 Pieces: 2 Serie: _T42TB / _MOGS_COM
 Treatment: , ,
 Fitting: _MOGS-2018
 Variables:

(1) 10-10-24-66.2 - 3418 x 873 ** (2) 10-10-24-66.2 - 3418 x 2733

SECTION AA


SECTION BB

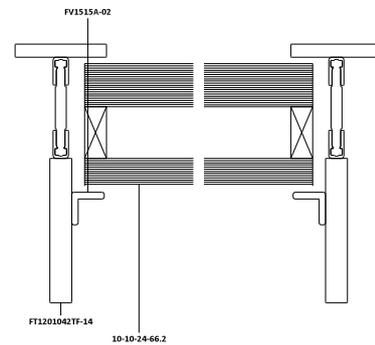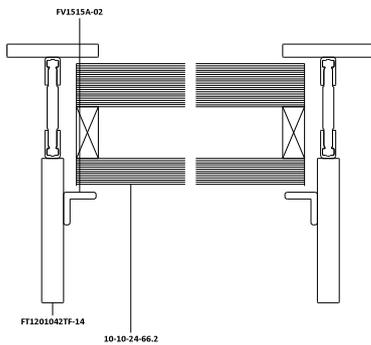


INTERNAL SIDE


INTERNAL SIDE

SECTION CC

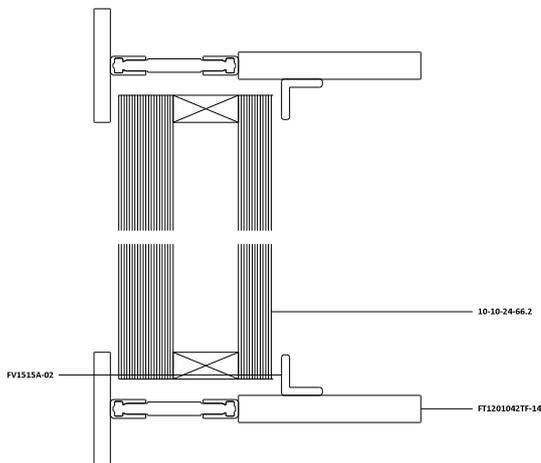

800 P. 17/08/2017







Item: 2 **Type:** 3 **Size:** 3450x3740 **Area:** 12,9 mq
Description: Serramento fisso
Pieces: 2 **Serie:** _T42TB / _MOGS_COM
Treatment: , ,
Fitting: _MOGS-2018
Variables:

(1) 10-10-24-66.2 - 3418 x 2733 ** (2) 10-10-24-66.2 - 3418 x 873

SECTION AA


SECTION CC

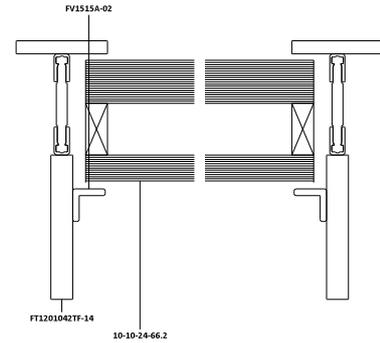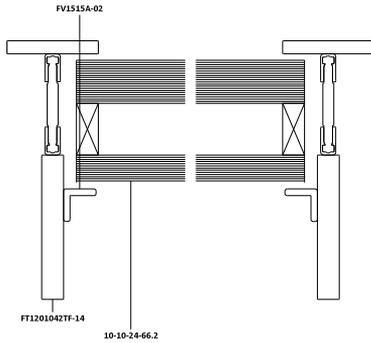

INTERNAL SIDE

INTERNAL SIDE

SECTION BB

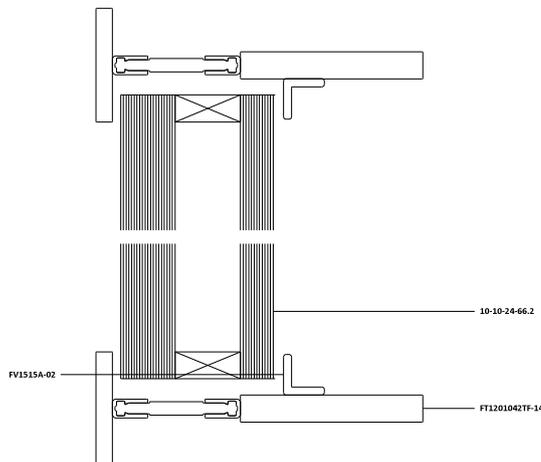

INTERNAL SIDE



Job/Group: 1GE005AE Delivery date: User: apagotto


OTTOSTUMM

Client/Site:

MOGS

Description: W75 TB

Manufacturing List (1 of 2)

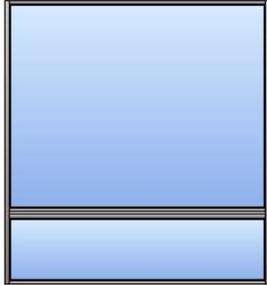

Item:	1
Type:	2
Size:	3450x3740 (Maximum Extension: 3482x3772 mm)
Area:	12,9 mq
Description:	Serramento fisso
Qty	2
Serie:	_T42TB / _MOGS_COM
Treatment	''
Fitting	_MOGS-2018
Glass	10-10-24-66.2
Panel	
Quotes	H=900.0 H=980.0
Glass weight	0 kg
Struct weight	0 kg
Total Weight	0 kg
Notes:	

Profiles-CLASS

Code	Description	Qty	Tot.Lengt
FT1201042TF-14	Frame	8	28680
FT1201042TF-14	Separating Rail	4	13720
FV1515A-02	Fermavetro angolare 15x15 mm	16	41960

ACC. PEZZO

Code	Description	Qty
D99867-03	Viti TSCE inox	224 PC

GUARNIZIONE


G99102-61	Guarnizione adesiva	46,16 m
G99202-61	Guarnizione adesiva	46,16 m

GLASSES

Code	Description	Shape	Qty	Dimensio
10-10-24-66.2	Glass	R	2	3418x873
10-10-24-66.2	Glass	R	2	3418x2733



Manufacturing List (2 of 2)

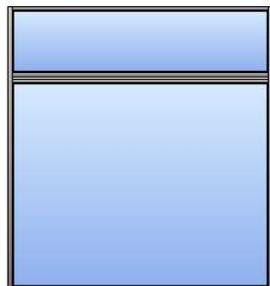

Item:	2
Type:	3
Size:	3450x3740 (Maximum Extension: 3482x3772 mm)
Area:	12,9 mq
Description:	Serramento fisso
Qty	2
Serie:	_T42TB / _MOGS_COM
Treatment	,,
Fitting	_MOGS-2018
Glass	10-10-24-66.2
Panel	
Quotes	H=2840.0 H=2760.0
Glass weight	0 kg
Struct weight	0 kg
Total Weight	0 kg
Notes:	

Profiles-CLASS

Code	Description	Qty	Tot.Lengt
FT1201042TF-14	Frame	8	28680
FT1201042TF-14	Separating Rail	4	13720
FV1515A-02	Fermavetro angolare 15x15 mm	16	41960

GLASSES

Code	Description	Shape	Qty	Dimensio
10-10-24-66.2	Glass	R	2	3418x2733
10-10-24-66.2	Glass	R	2	3418x873

ACC. PEZZO

Code	Description	Qty
D99867-03	Viti TSCE inox	224 PC

GUARNIZIONE

G99102-61	Guarnizione adesiva	46,16 m
G99202-61	Guarnizione adesiva	46,16 m



OTTOSTUMM **Job/Group:** 1GE005AE **Delivery date:** **User:** apagotto
Client/Site:
Description: W75 TB

mogs

Fittings List (1 of 1)

PIECE BASED FITTINGS

Brand	Code - Colour	Quantity	Description:
MOGS	D99867-03	448	Viti TSCE inox


GASKETS


Brand	Code - Colour	Quantity	Description:
MOGS	G99102-61	92,31 m	Guarnizione adesiva 10x3 mm
MOGS	G99202-61	92,31 m	Guarnizione adesiva 8x4 mm

ZETA s.r.l.


Bars Optimization Report (1 of 1)

Class:

	Serie: _MOGS_COM	Code: FV1515A-02	Bars: 20 x 5800
	Treatment:		
	Description: Fermavetro angolare 15x15 mm in acciaio zincato		
	Total length: 116 m	Total Weight: 71,9 kg	
	Waste: 19 kg	Stock Code:	73,56%  2,46%  23,98% 

	Serie: _T42TB	Code: FT1201042TF-14	Bars: 24 x 5800
	Treatment:		
	Description:		
	Total length: 139,2 m	Total Weight: 0 kg	
	Waste: 0 kg	Stock Code:	61,81%  0%  38,19% 

Weight 71,9 kg

 Usage
 Recoverable waste

Total Weight 71,9 kg

ZETTA s.r.l.


ALLEGATO 13

1

2

3

4

A

A

B

B

C

C

D


D

E

E

F

F

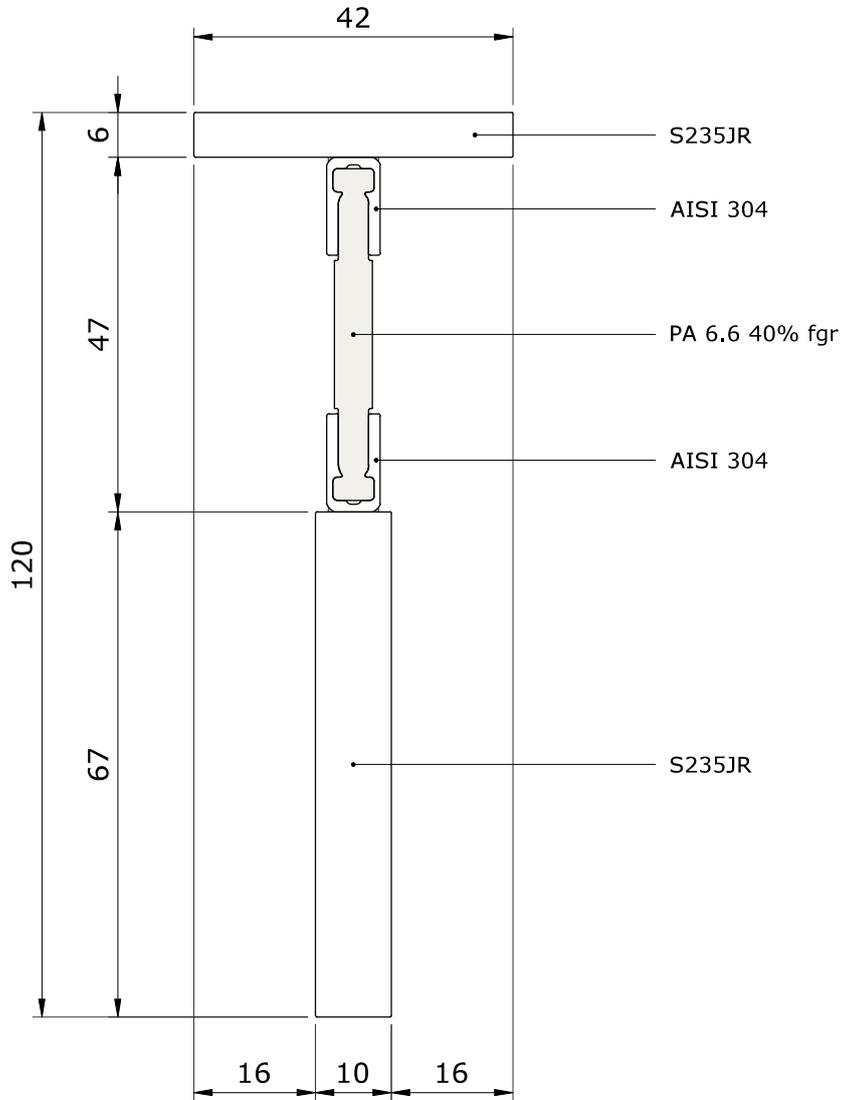

 www.mogs.it	Date / Data 30.05.2023	Rev. 00	Designed GP	Checked ---	Approved ---
	Legend / Legenda				
 <small>visible surface</small>	 <small>satin diection</small>	 <small>view</small>	 <small>scale</small>	 <small>paper</small>	1:1 A4
Series - Project / Serie - Progetto T42TB			Code / Codice FT1201042TF-14		
File name / Nome file tds_ft1201042tf-14.dwg					
Drawing description / Descrizione disegno ---					

1

2

3

4

ALLEGATO 14

1

2

3

4

A

A

B

B

C

C

D


D

E

E

F

F

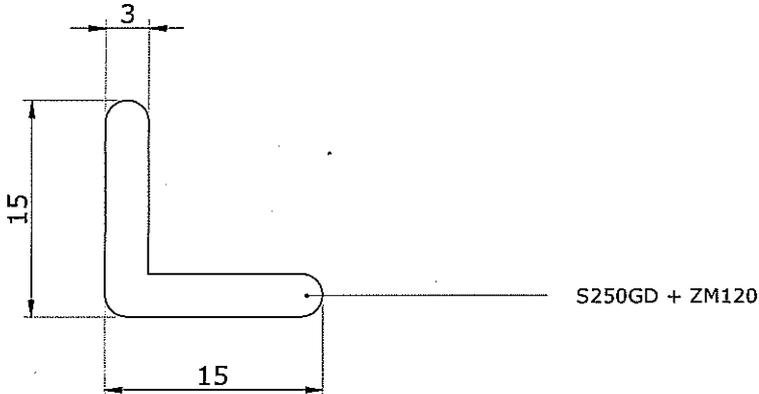

 www.mogs.it	Date / Data		Rev	Designed	Checked	Approved
	30.05.2023		00	GP	---	---
Legend / Legendi						
visible surface	salin direction	view	2:1	A4	scale	paper
Series - Project / Serie - Progetto			Code / Codice			
Glazing beads			FV 1515A-02			
File name / Nome file						
tds_fv 1515a-02.dwg						
Drawing description / Descrizione disegno						

1

2

3

4

ALLEGATO 15

1

2

3

4

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F



 www.mogs.it	Date / Data	Rev.	Designed	Checked	Approved
	03.02.2020	00	GP	---	---
Legend / Legenda					
 visible surface	 satin direction	 view	 2:1 scale	 A4 paper	
Series - Project / Serie - Progetto			Code / Codice		
			G99202-61		
File name / Nome file					
tds_g99202-61.dwg					
Drawing description / Descrizione disegno					

1

2

3

4

ALLEGATO 16

1

2

3

4

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F



 www.mogs.it	Date / Data 03.02.2020	Rev. 00	Designed GP	Checked ---	Approved ---
	Legend / Legenda				
Series - Project / Serie - Progetto	Code / Codice				
File name / Nome file tds_g99102-61.dwg	visible surface	satin direction	view	2:1	A4
Drawing description / Descrizione disegno ---				scale	paper
				G99102-61	

1

2

3

4

ALLEGATO 17



La tua vita merita sicurezza



MANUTENZIONE ED USO




La tua vita merita sicurezza



È necessario che queste pagine siano lette con la massima attenzione prima dell'uso dei serramenti per poter così comprendere esattamente come:

- eseguire la manutenzione più efficace e razionale e individuare eventuali guasti ed i rimedi da apportare.
- evitare i rischi derivanti nell'uso del serramento per la mancata osservanza delle norme di sicurezza.
- comprendere i limiti d'uso per la conservazione delle condizioni igienico
- ambientali e per la salute. Il presente manuale costituisce parte integrante del prodotto e deve essere conservato per una facile e pronta consultazione.



1. Istruzioni per la manutenzione

1.1 Manutenzione pulizia interna vetrocamera temperato

Spolverare prima delicatamente con un panno soffice, lavare con acqua a temperatura ambiente e prodotti detergenti neutri, idonei e non abrasivi, utilizzando una miscela al 50% di alcool e acqua o di ammoniaca e acqua seguita da un risciacquo tiepido, prevenendo così abrasioni accidentali.

Non utilizzare mai detersivi o liquidi anticalcare per vetri satinati o sabbiati, ad esempio i vetri del box doccia. Non usare prodotti a base di petrolio quali benzina, diesel o fluidi leggeri.

Per una corretta pulizia interna non utilizzare prodotti che possono compromettere l'aria dell'ambiente circostante; evitare qualunque prodotto che possa recare danno a persone o beni circostanti.

Per un risultato più efficace pulire il vetro in un momento in cui è ombreggiato e non esposto alla luce diretta del sole. Anche il lavaggio del vetro deve avvenire in maniera tale da ridurre al minimo le sollecitazioni; va quindi evitato l'utilizzo di acqua eccessivamente calda (o eccessivamente fredda d'estate) e di vapore ad alta pressione per un tempo prolungato su di una zona circoscritta della lastra.

Eventuali impurità sulla superficie del vetro, causate dal processo di produzione, dall'installazione della finestra, dagli adesivi e dai distanziatori di sughero possono essere rimosse cautamente con una spugna morbida o una spatola di plastica e acqua calda saponata. Materiali da costruzione alcalini come il cemento, malta calcarea, finché non abbiano ancora legato, possono essere sciacquati con molta acqua.

Per una successiva pulitura ed asportazione di residui di colla molto aderenti, impurità o sigillature con silicone sui vetri isolanti, è possibile utilizzare prodotti quali comuni emulsioni per il lavaggio delle cucine. Le operazioni di pulizia e lavaggio del vetro devono avvenire in maniera tale da ridurre al minimo le sollecitazioni termiche;



PERICOLO: Da evitare l'utilizzo di acqua eccessivamente calda (o eccessivamente fredda d'estate) e di vapore ad alta pressione per un tempo prolungato su di una zona circoscritta della lastra. Gli sbalzi termici possono produrre rotture per shock termico.

Nella progettazione e nella realizzazione di edifici di elevata altezza, nonché in quelli caratterizzati dalla presenza di estese superfici vetrarie, è opportuno prevedere la possibilità di accesso alle superfici da pulire, anche facendo ricorso alla predisposizione di punti di ancoraggio di sistemi manutentivi esterni.

Si segnala che la quasi totalità dei vetri danneggiati da graffi sono causate in cantiere e/o nelle abitazioni dai lavori che vengono effettuati dai vari addetti svolti in prossimità del vetro, come pittori, piastrellisti, idraulici, falegnami, muratori e altri operai che intervengono nel processo di costruzione. Strumenti di lavoro inavvertitamente appoggiati al vetro e spruzzi di materiale possono danneggiarne permanentemente la superficie. Uno degli errori più comuni commessi dalle persone addette alla pulizia, è l'uso di lamette di cutter che possono causare irreparabili danni alla superficie del vetro.

Pertanto si raccomanda espressamente che il vetro non venga mai pulito mediante l'uso di strumenti taglienti.

1.2 Manutenzione pulizia esterna vetrocamera temperato

Spolverare prima delicatamente con un panno soffice, lavare con acqua a temperatura ambiente e prodotti detergenti neutri, idonei e non abrasivi, utilizzando una miscela al 50% di alcool e acqua o di ammoniaca e acqua seguita da un risciacquo tiepido, prevenendo così abrasioni accidentali.

Non utilizzare mai detersivi o liquidi anticalcare per vetri satinati o sabbiati, ad esempio i vetri del box doccia. Non usare prodotti a base di petrolio quali benzina, diesel o fluidi leggeri. Per un risultato più efficace pulire il vetro in un momento in cui è ombreggiato e non esposto alla luce diretta del sole.

Anche il lavaggio del vetro deve avvenire in maniera tale da ridurre al minimo le sollecitazioni; va quindi evitato l'utilizzo di acqua eccessivamente calda (o eccessivamente fredda d'estate) e di vapore ad alta pressione per un tempo prolungato su di una zona circoscritta della lastra.

Eventuali impurità sulla superficie del vetro, causate dal processo di produzione, dall'installazione della finestra, dagli adesivi e dai distanziatori di sughero possono essere rimosse cautamente con una spugna morbida o una spatola di plastica e acqua calda saponata. Materiali da costruzione alcalini come il cemento, malta calcarea, finché non abbiano ancora legato, possono essere sciacquati con molta acqua.

Per una successiva pulitura ed asportazione di residui di colla molto aderenti, impurità o sigillature con silicone sui vetri isolanti, è possibile utilizzare prodotti quali comuni emulsioni per il lavaggio delle cucine. Le operazioni di pulizia e lavaggio del vetro devono avvenire in maniera tale da ridurre al minimo le sollecitazioni termiche;



PERICOLO: Da evitare l'utilizzo di acqua eccessivamente calda (o eccessivamente fredda d'estate) e di vapore ad alta pressione per un tempo prolungato su di una zona circoscritta della lastra.

Gli sbalzi termici possono produrre rotture per shock termico. Nella progettazione e nella realizzazione di edifici di elevata altezza, nonché in quelli caratterizzati dalla presenza di estese superfici vetrate, è opportuno prevedere la possibilità di accesso alle superfici da pulire, anche facendo ricorso alla predisposizione di punti di ancoraggio di sistemi manutentivi esterni.



ATTENZIONE: Se si presenta la necessità di utilizzo di macchinari industriali per la pulizia delle vetrate, consultare sempre un professionista.

Si segnala che la quasi totalità dei vetri danneggiati da graffi sono causate in cantiere e/o nelle abitazioni dai lavori che vengono effettuati dai vari addetti svolti in prossimità del vetro, come pittori, piastrellisti, idraulici, falegnami, muratori e altri operai che intervengono nel processo di costruzione. Strumenti di lavoro inavvertitamente appoggiati al vetro e spruzzi di materiale possono danneggiarne permanentemente la superficie. Uno degli errori più comuni commessi dalle persone addette alla pulizia, è l'uso di lamette di cutter che possono causare irreparabili danni alla superficie del vetro.

Pertanto si raccomanda espressamente che il vetro non venga mai pulito mediante l'uso di strumenti taglienti.



AVVERTENZA: Il produttore non si ritiene responsabile di alcun difetto, alterazione o danno riscontrato sulla vetrata qualora non siano state rispettate le prescrizioni del presente manuale con riferimento specifico al precedente capitolo.

1.3. Manutenzione ferro

Pulire gli infissi in ferro con un **panno morbido**, per **rimuovere tutta la polvere** che si è accumulata, insistendo soprattutto nelle piccole fessure di scolo dell'acqua. E' possibile utilizzare anche una piccola **spazzola con setole morbide**, risulterà molto efficace per la rimozione della polvere nei punti più difficili da raggiungere con il panno.



ATTENZIONE: non utilizzare prodotti o attrezzi che potrebbero danneggiare in qualunque modo il materiale.

Dopo la rimozione della polvere è possibile passare alla fase successiva, ovvero il **lavaggio con un detergente delicato**. Utilizzare un panno morbido e passarlo su tutta la superficie degli infissi. Ripassando nelle zone particolarmente sporche.

Dopo aver lavato per bene tutta la superficie degli infissi, insistendo nelle zone più sporche **risciacquare con acqua pulita** aiutandosi con un panno morbido impregnato di acqua pulita.

Dopo aver risciacquato con acqua abbondante gli infissi passare all'**asciugatura** degli infissi. Anche in questo caso usare un **panno morbido** e **passarlo su tutta la superficie**. In questo modo i vostri infissi si manterranno in perfette condizioni a lungo.



AVVERTENZA: ripetere questo procedimento almeno una volta all'anno per mantenere gli infissi in perfette condizioni.



2. Istruzioni per l'uso



Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli, come ad esempio modifiche o interventi non autorizzati, utilizzo di pezzi di ricambio non contemplati nella ricambistica prevista dal costruttore o inosservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale.

2.1 Istruzioni per l'uso di serramento fisso

Per un corretto utilizzo di un serramento fisso, evitare in ogni modo qualunque azione che possa recare danno al serramento, sia che comporti un danno alla struttura che alle vetrate.

Evitare di manomettere il serramento, ispezionare periodicamente e tenere efficienti tutti i componenti del serramento.



ATTENZIONE AZIONI DA NON FARE:

- Non contondere il serramento con oggetti, siano essi più o meno pesanti, per evitare danni alle vetrate o alla struttura. A titolo esemplificativo non colpire il serramento con:
 - o Sedie, tavoli, vasi o piante, mobili da esposizione ecc..
 - o Non colpire energicamente il serramento con la propria figura personale
- In caso di visibile crepatura delle vetrate è necessario evitare, in qualunque modo, la sollecitazione alla rottura; ovvero evitare qualunque pressione sul vetro e contattare immediatamente dei professionisti.
- Nei periodi di manutenzione evitare di utilizzare oggetti che potrebbero danneggiare i vetri o la struttura, nello specifico non usare:
 - o Spazzole rigide che posso graffiare, rigare o raschiare la struttura
 - o Oggetti appuntiti che possono graffiare, rigare o raschiare la struttura
 - o Detergenti che possono danneggiare la sanità della struttura
 - o Panni rigidi che possono causare danno di qualunque entità ai vetri
- In caso di anomalia del serramento non sostituire le parti danneggiate ma chiamare immediatamente un professionista.



ATTENZIONE AZIONI DA FARE:

- Quando si verifica una qualsiasi anomalia nel serramento, contattare immediatamente dei professionisti. NON CERCARE DI RISOLVERE LA PROBLEMATICA IN PROPRIO



La tua vita merita sicurezza

3. Informazioni aggiuntive

EVENTUALI SOSTANZE DANNOSE ALLA SALUTE

Il serramento non contiene sostanze pericolose in base alla Direttiva Europea 2003/36/CE del 26 maggio 2003 e successivi aggiornamenti.

MODALITÀ DI SMALTIMENTO

Quando il prodotto non è più utilizzato, tutti gli accessori, componenti e quanto altro lo costituisce non vanno dispersi nell'ambiente, ma conferiti ai locali sistemi pubblici o privati di smaltimento conformi alle disposizioni normative vigenti.



La tua vita merita sicurezza

NORME DI GARANZIA

Il serramento è garantito per un periodo di due anni dalla data di consegna.

Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione gratuita delle parti componenti il serramento che risultano difettose all'origine per vizi di fabbricazione.

Non sono coperte da garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso (mancata osservanza delle istruzioni per l'utilizzo e la manutenzione del serramento, presenti in questo manuale), di errata installazione o manutenzione (nel caso il serramento non sia installato dalla nostra azienda), di manutenzioni operate da personale non autorizzato, di danni da trasporto (se a mezzo del cliente), di usura, ovvero di circostanze che, comunque, non si possono far risalire a difetti di fabbricazione del serramento.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio del serramento.

La Nostra Azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose o animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate in questo *Manuale d'uso e manutenzione*.

Polizza garanzia fideiussoria per la rata di saldo

La tua polizza

Numero 733729103
Contraente PANZETTA S.R.L.

La tua Agenzia

Agenzia TORINO FRANZIA
CORSO TRAPANI 108, 10141 TORINO
Telefono [REDACTED]

Area Personale


www.allianz.it/areapersonale
Per consultare in ogni momento le informazioni relative alla tua polizza,
alle scadenze e ai sinistri

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione,
chiarimento o supporto

c_d969.Comune di Genova - Prot. n. 27/10/2023.0505734.E



Elenco documenti

Si consegnano al cliente i seguenti documenti

- Condizioni di assicurazione
- Scheda di Polizza

La presente copertina non costituisce parte del contratto.

Allianz per te

La tua Area Personale sul web è ancora più ricca e aggiornata, per consultare in ogni momento la tua posizione assicurativa, e i principali documenti contrattuali.

Per accedere collegati al sito [Allianz.it](https://www.allianz.it), registrati nella sezione "Area Personale", richiedi le tue credenziali di accesso e scopri tutte le novità a te dedicate.

Polizza

Polizza fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016

SCHEMA TIPO 1.4 - SCHEDA TECNICA 1.4

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO (Lavori, Servizi e Fornitura) (art. 103, comma 6, del Codice)

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.4 di cui al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31.

Garante

Garanzia fideiussoria n. **733.729.103**

Garante Allianz S.p.A.
Piazza Tre Torri, 3 CAP 20145 Milano Prov. MI
Agenzia **TORINO FRANCIA - 212**
C.F. e Registro Imprese di Milano n. 05032630963
Autorizzazione Provv.lvass del 21.12.2005 n. 2398
Rappresentante del Gruppo IVA Allianz con P.IVA n. 01333250320
PEC *cauzioni@pec.allianz.it*

Contraente

SOCIETA' PANZETTA S.R.L.

C.F. / P.IVA **04240520017 04240520017**
PEC

Stazione Appaltante

Comune di **Genova**
Citta': **Genova**
Via: **Via di Francia 1**
CAP: **16149**
Prov: **Genova**
C.F./P.IVA: **00856930102**
PEC **comunegenova@postemailcertificata.it**

Descrizione opera / servizio / fornitura: **RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERRAMENTI ESTERNI DEL MUSEO DI SANT'AGOSTINO, SITO IN GENOVA, PIAZZA SARZANO 35R - 2° STRALCIO RELATIVO A QUATTRO SERRAMENTI DI GRANDI DIMENSIONI CHE INSISTONO SUL PROSPETTO PRINCIPALE DI PIAZZA SARZANO.**

Luogo di esecuzione: **Genova**

Polizza n. 733729103

Polizza

Valore capitale della rata di saldo (Somma garantita in linea capitale): **euro 6.560,35 (euro seimilacinquecentosessanta/35)**

Tasso di interesse legale vigente per il periodo di tempo necessario per la definitività del certificato di collaudo / regolare esecuzione o della verifica di conformità: **5,00 %**

Importo complessivo della garanzia per la rata di saldo: **euro 7.216,39 (euro settemiladuecentosedici/39)**

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Il Contraente

Il Garante
Allianz S.p.A.

Firmato digitalmente da: 
Data: 27/10/2023 11:05:03

Emessa in tre copie ad un solo effetto il 13/10/2023

Polizza n. 733729103

Polizza

Schema tipo 1.4. (d.m. 19 gennaio 2018, n. 31) Garanzia fideiussoria per la rata di saldo

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO (Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell'opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;
- b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità, allorché si estingue ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è pari all'importo della rata di saldo erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture, e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (artt. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice).

L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente, - recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e degli importi dovuti dal Contraente, ai sensi dell'art. 1.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Polizza n. 733729103

Polizza

Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
