

# DIREZIONE LAVORI PUBBLICI ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.1.0.-64**

L'anno 2023 il giorno 29 del mese di Giugno la sottoscritta Arch. Torti Emanuela, in qualità di Dirigente di Attuazione Opere Pubbliche, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. Lavori "Ripristino copertura corpo atrio A – Asilo Nido il Bruco Pellegrino", in Via Pellegrini 19, Genova.

CUP: B37H21009850004 - MOGE: 20899 - CIG: 9100743AB2

Adottata il 29/06/2023 Esecutiva dal 27/07/2023

29/06/2023	TORTI EMANUELA



## DIREZIONE LAVORI PUBBLICI ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212,1,0,-64

Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Lavori "Ripristino copertura corpo atrio A – Asilo Nido il Bruco Pellegrino", in Via Pellegrini 19, Genova.

CUP: B37H21009850004 - MOGE: 20899 - CIG: 9100743AB2

#### IL DIRIGENTE RESPONSABILE

#### Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 22/12/2021 è stato approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024, comprensivo dell'intervento in questione e inserito tra gli interventi dell'elenco annuale da finanziarsi a mezzo mutuo con annualità 2023;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 20/01/2022 esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto redatto dagli uffici della Direzione Attuazione Opere Pubbliche, per una spesa complessiva di Q.E. pari a euro 260.000,00;
- con determinazione dirigenziale della Direzione Attuazione Opere Pubbliche N. 2022-205.0.0.-14, adottata in data 21/02/2022 esecutiva dal 21/02/2022, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di *"ripristino della copertura corpo atrio A asilo nido il Bruco Pellegrino, in Via Pellegrini 19*" per un importo complessivo dei lavori valutati "a misura", da porre a base di gara, di complessivi Euro 177.719,71, di cui Euro 31.520,83 per oneri per la sicurezza, già predeterminati e non soggetti a ribasso, ed Euro 4.095,60 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A al 22%, confermando altresì il Quadro Economico ed il relativo impegno di spesa dell'intervento in oggetto, per una spesa complessiva di Euro 260.000,00;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 21/04/2022 è stato approvato il secondo adeguamento al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2023-2024, dove è stato necessario modificare la tipologia di finanziamento dell'opera da mutuo a risorse proprie dell'Ente;

- con determinazione dirigenziale della Direzione Attuazione Opere Pubbliche N. 2022-212.1.0.-7, adottata in data 18/05/2022 ed esecutiva dal 22/05/2022, si sono affidati i lavori a favore dell'Impresa CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP., con sede in Rimini, Via C. di Marzabotto, 47, C.A.P. 47922, Partita IVA e Codice Fiscale 01685300400, e iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Romagna, n. 210199, con il ribasso offerto del 21,763 % per un importo contrattuale risultante di Euro 146.793,77, di cui Euro 31.520,83 per oneri per la sicurezza, già predeterminati e non soggetti a ribasso, ed Euro 4.095,60 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A al 22%.

#### Premesso altresì che:

- il contratto di appalto è stato stipulato in data 2 agosto 2022, cronologico 270, per Euro 146.793,77, di cui Euro 31.520,83 per oneri per la sicurezza, già predeterminati e non soggetti a ribasso, ed Euro 4.095,60 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A al 22%;
- con atto di impegno Rep. NP 15/11/2022.0001998.I del 10/11/2022 è stata concordata una variante, in linea tecnica, non onerosa, per l'esecuzione di lavorazioni finalizzate al miglioramento ed alla funzionalità dell'opera. Tali modifiche non hanno determinato la variazione dell'importo contrattuale in quanto la formazione dei nuovi prezzi e delle lavorazioni aggiuntive è stata compensata dallo stralcio di lavorazioni inizialmente previste a progetto ma non più necessarie a seguito della diversa organizzazione e gestione del cantiere assunte dall'esecutore.

#### Rilevato che:

- con verbale Prot. N. 21/06/2022.0001085.I in data 20/06/2022 si è proceduto alla consegna dei lavori all'Appaltatore;
  - a seguito dell'istanza di proroga, presentata dall'Impresa in data 01/09/2022, Prot. 02/09/2022.0331251.E, è stata concessa proroga di giorni 20 con atto Prot. 02/09/2022.0331267.U del 02/09/2022, motivandone le ragioni, come esposto dall'Impresa, nelle difficoltà riscontrate sul reperimento dei materiali dovute al particolar momento di eccessive richieste ed alle notevoli precipitazioni atmosferiche che hanno causato ritardi nelle fasi esecutive; per effetto della proroga concessa, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è stato fissato al 22/09/2022;
  - i lavori sono stati dichiarati ultimati in data 11/11/2022, così come risultante dal Certificato di Ultimazione dei Lavori, prot. Rep. NP 15/11/2022.0001999.I., con un ritardo, rispetto ai termini contrattuali, di 35 giorni consecutivi;
  - in luogo dell'addebito di tali penali, il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Emanuela Torti, ed il Direttore dei Lavori, Arch. Sabrina Pipino, hanno convenuto di far eseguire all'impresa esecutrice, Omega Costruzioni S.r.l., alcune opere manutentive al fabbricato (sistemazione dei muri laterali e dei corrimani della scala pedonale di collegamento tra l'ingresso a piano strada ed il cortile di ingresso all'Asilo Nido e trattamento di pulitura, applicazione di fondo antiruggine e di coloritura delle 4 colonne in acciaio sostenenti la copertura metallica dell'Asilo Nido in prossimità dell'area giochi esterna) a compensazione delle penali derivanti dalla ritardata ultimazione delle opere;

- il conto finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 08/05/2023 e firmato senza riserve dall'Appaltatore in pari data, ammonta complessivamente, al netto dell'I.V.A. ed al lordo delle trattenute a garanzia, ad Euro 139.461,08, oneri della sicurezza compresi, così ripartiti:

	Euro
Lavori a misura	113.501,72
Oneri della sicurezza	25.959,36
Oneri della sicurezza specifici Covid-19	0,00
Economie	0,00
Totale (I.V.A. esclusa)	139.461,08
A dedurre:	
Importo totale acconti corrisposti all'Impresa al netto della ritenuta	135.963,23
dello 0,5% per infortuni pari ad Euro 683,23	
Credito netto dell'Impresa quale rata di saldo (I.V.A. esclusa)	3.497,85

- il Direttore dei Lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, Rep. NP 10/05/2023.0000993.I, allegato, quale parte integrante del presente provvedimento;
- nel corso dei lavori non è stato necessario occupare in modo temporaneo o permanente proprietà private e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti ai beni di proprietà privata, come risultante dalla Dichiarazione del Direttore dei Lavori Rep. NP 01/03/2023.0000455.I;
- come risultante dalla comunicazione prot. 17/02/2023.0070644.I del 17/02/2023, a firma della Direzione Ragioneria del Comune di Genova, non sono segnalate notifiche di cessioni di crediti da parte dell'Impresa appaltatrice, nonché procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento;
- a seguito delle segnalazioni pervenute dalla Direzione Didattica, relative a problematiche derivanti dalle infiltrazioni causate dalle condizioni della copertura oggetto di intervento ed antecedenti ai lavori di messa in pristino, e stata fatta ripristinare la funzionalità degli impianti antincendio (rivelazione fumi) ed antintrusione, andando in tal modo a garantire la continuità didattica in piena sicurezza; sempre a causa delle problematiche infiltrative si è ritenuto inoltre opportuno far levigare una porzione di parquet sottostante la copertura dell'atrio "A" (salone centrale) che risultava danneggiata, in fase di distacco e con la presenza di rigonfiamenti che ne pregiudicavano la praticabilità in totale sicurezza. Per quanto riguarda gli impianti, l'intervento è ricaduto all'interno del Contratto di Servizio Comune /A.S.TER S.p.A. vigente, in virtù del quale il Settore Attuazione Opere Pubbliche ha dato mandato alla Direzione Facility Management, con Atto Datoriale prot. n. 130250 del 23/03/2023, a prelevare dalle somme previste per "B.4 - Imprevisti" ancora disponibili, la somma di Euro 6.188,52 oltre Euro 1.361,48 per IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 7.550,00, per la levigatura del parquet ed il relativo trattamento ignifugo, l'incollaggio e la riverniciatura dello stesso, si è invece proceduto con l'affidamento diretto dei lavori all'impresa Falegnameria Diana S.r.l., per un importo totale di Euro 8.542,44 (Iva compresa);

- complessivamente sono stati sostenuti costi relativamente a Oneri Sicurezza Specifici per l'emergenza Sanitaria da Pandemia da Covid-19, ai sensi della Legge n. 120 del 2020 e della Ordinanza Regionale n. 48 del 2020, pari ad Euro 4.844,84. IVA esclusa.

#### Dato atto:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Emanuela Torti, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
- il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 come da allegato.

**Considerato che**, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica.

#### Visti:

- il D.lgs. 50/2016 e il D.lgs. 120/2020;
- gli artt. 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 77 e 80 dello statuto del Comune di Genova;
- gli artt. 4, 16, 17 del D.lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 84, 88, 92 e 94 del D.lgs. n. 159/2011;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il Regolamento di contabilità, approvato con Delibera Consiglio Comunale del 04/03/1996 n. 34 e ultima modifica con delibera Consiglio Comunale del 09/01/2018 n.2;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;
- il provvedimento del Sindaco n. 2023-112 del 05/04/2023 per il conferimento di incarichi dirigenziali, con conseguente potere di assunzione dei provvedimenti di aggiudicazione in capo All'Arch. Emanuela Torti.

#### **DETERMINA**

- 1) di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 08/05/2023 (prot. NP 10/05/2023.0000993.I) dal Direttore dei Lavori Arch. Sabrina Pipino, con il quale si dichiarano collaudati i lavori di "ripristino copertura atrio A asilo nido il Bruco Pellegrini" in Via Pellegrini 19, realizzati dall'Impresa CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP. con sede in Rimini, Via C. di Marzabotto, 47, C.A.P. 47922, Partita IVA e codice fiscale 01685300400 (Cod. Benf. 57532), in base al contratto di Appalto cronologico 270 del 02/08/2022;
- 2) di autorizzare la corresponsione all'Impresa CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP. della somma di Euro 3.497,85, oltre I.V.A. al 22% per Euro 769,53, per un totale di Euro 4.267,38 quale somma complessiva della rata di saldo e delle trattenute a garanzia;
- 3) di procedere alla liquidazione del pagamento dell'importo complessivo di Euro 4.267,38 (3.497,85 oltre I.V.A. 22%), previa emissione della relativa fattura elettronica;
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 141, comma 9 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 124 del D.P.R. n. 207/2010, ha presentato polizza fideiussoria n. 1001999134 rilasciata dalla Compagnia "REVO Insurance S.p.A.", Agenzia REVO UNDERWRITING Milano, emessa in data 19/06/2022, della durata di dodici mesi dalla data del Certificato di Regolare Esecuzione;
- 5) di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale al CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP. relativo alla polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia "Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. Agenzia n. 036 di Carbone numero 1891222, emessa in data 18/07/2022 per l'importo di Euro 34.534,70;
- 6) di approvare il riconoscimento all'Impresa appaltatrice degli oneri derivanti dall'emergenza sanitaria COVID per un totale di Euro 5.910,70 (di cui Euro 4.844,84. per imponibile ed Euro 1.065,86 per I.V.A. al 22%) già corrisposti e liquidati con i SAL precedenti;
- 7) di mandare a prelevare la somma di Euro **4.267,38**, dei quali Euro 3.497,85 per imponibile ed Euro 769,53 per I.V.A. al 22%, dal Capitolo 76104 c.d.c. 2710.8.05 "Asili Nido e Servizi per l'infanzia Manutenzione Straordinaria" del Bilancio 2023 P.d.C. 02.02.01.09.017 Crono 2022/585 come segue:
- a) Euro **3.433,84** per quota lavori (di cui Euro 2.814,62 per imponibile ed Euro 619,22 per I.V.A. al 22%) mediante riduzione di pari importo dell'IMP. 2023/6250 ed emissione di nuovo **IMPE 2023/12249**;
- b) Euro **833,54** per svincolo trattenute a garanzia (di cui Euro 683,23 per imponibile ed Euro 150,31 per I.V.A. al 22%) mediante riduzione di pari importo dell'IMP. 2023/6250 ed emissione di nuovo **IMPE 2023/12250**;
- 8) Di dare atto che l'importo di Euro 4.267,38 è finanziato tramite Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a Bilancio 2023;

- 9) di procedere, a cura della Direzione Lavori Pubblici Attuazione Opere Pubbliche, alla liquidazione della spesa mediante emissione di atti di liquidazione digitale nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento;
- 10) di notificare all'Impresa CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP. il presente provvedimento, ai sensi della vigente normativa;
- 11) l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Arch. Emanuela Torti, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
- 12) con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;
- 13) il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 come da allegato.

Il Dirigente *Arch. Emanuela Torti* 



## ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-212.1.0.-64 AD OGGETTO

Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Lavori "Ripristino copertura corpo atrio A – Asilo Nido il Bruco Pellegrino", in Via Pellegrini 19, Genova.

CUP: B37H21009850004 - MOGE: 20899 - CIG: 9100743AB2

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Rimborso IVA su indebitamento).

Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Magda Marchese





APPALTO: LAVORI DI RIPRISTINO COPERTURA CORPO ATRIO A -	
ASILO NIDO IL BRUCO PELLEGRINO, IN VIA PELLEGRINI 19, GENOVA.	
CUP: B37H21009850004 - CIG: 9100743AB2 – MOGE: 20899	
APPROVAZIONE LAVORI: D.G.C. n. 4 del 20/01/2022	
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, LAVORI E MODALITA' DI	
GARA: D.D. 2022-205.0.014 del 21.02.2022	
AGGIUDICAZIONE: D.D. 2022-212.1.07 del 18.05.2022	
VERBALE DI GARA: Cronologico n.117 in data 5 Aprile 2022	
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA: Euro 177.719,71 (oltre IVA 22%) di cui	
Euro 27.352,96 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), Euro 4.167,87 per	
oneri della sicurezza Covid (non soggetti a ribasso), ed Euro 4.095,60 per opere in	
economia (non soggette a ribasso).	
RIBASSO D'ASTA: -21,763 % (esclusi oneri sicurezza ed opere in economia).	
IMPORTO NETTO DEI LAVORI: Euro 146.793,77 (oltre IVA al 22%), di cui	
Euro 27.352,96 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), Euro 4.167,87 per	
Oneri della sicurezza Covid ed Euro 4.095,60 per opere in economia.	
IMPRESA APPALTATRICE: Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.,	
con sede legale in Rimini, via C. di Marzabotto 47 - 47922 - C.F. e P. I.V.A.	
01685300400	
CONTRATTO: Cronologico n. 270 del 02.08,2022	
\\comge\dfs1\Attuazione_Opere_Pubbliche\INTERVENTI\20899 - ASILO VIA PELLEGRINI\04_COLLAUDO - CRE\CRE\doc preparatorio\M20899-CRE BRUCO_apr23.doc	



#### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

#### Istruzione appalto e progetto

L'appalto venne approvato ed aggiudicato secondo il seguente iter:

- con Deliberazione della Giunta Comunale DGC n. 4 del 20/01/2022 è stato

approvato il Progetto Definitivo relativo ai lavori in oggetto, redatto dalla Direzione

Attuazione Opere Pubbliche, su progettazione dell'architetto Ferdinando De Fornari,

per una spesa complessiva pari ad Euro 260.000,00 come da quadro economico

allegato al provvedimento;

- con Determinazione Dirigenziale 2022-205.0.0.-14 del 21.02.2022 è stato approvato

il progetto esecutivo per i lavori di "Ripristino della copertura corpo atrio A – asilo

nido il Bruco Pellegrino, in Via Pellegrini 19";

- con medesima Determinazione Dirigenziale di cui sopra si è inoltre stabilito di

provvedere all'aggiudicazione dei suddetti lavori mediante procedura negoziata, ai

sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del Codice, così come modificato ai sensi

dell'Art.1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020, come sostituita dall'Art.51

della L. n. 108/2021, senza previa pubblicazione del bando, per un importo totale pari

ad Euro 260.000,00 finanziato per Euro 256.445,61 con mutuo o mediante

devoluzione di mutui già contratti e per Euro 3.554,39 con entrate proprie dell'Ente;

- con Determinazione Dirigenziale 2022-212.1.0.-7 del 18.05.2022 si è provveduto

all'aggiudicazione definitiva dell'esecuzione dei lavori in oggetto al Consorzio

Artigiani Romagnolo Soc. Coop., con sede in Via C. di Marzabotto, 47 – 47922

Rimini, P.I. e C.F. 01685300400, tramite contratto "a misura" ai sensi dell'art. 59,

comma 5-bis, del Codice;



Il Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. in qualità di affidatario ma non di
esecutore, ha affidato l'esecuzione delle opere all'impresa OMEGA COSTRUZIONI
Srl, con sede in Agrigento, San Giovanni Gemini, Via degli Orefici 36, CAP 92020,
C.F. e P.IVA 02538540846, iscritta alla Camera di Commercio di Agrigento al n.
REA AG -189359;
- in data 21/06/2022 con "Processo verbale di consegna delle aree afferenti
l'intervento" rep. NP 21/06/2022.0001085.I, veniva disposta la consegna delle aree
inerenti l'edificio asilo nido IL BRUCO PELLEGRINO, in via Pellegrini 19,
all'Impresa Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop., alla quale presenziava la ditta
esecutrice OMEGA COSTRUZIONI SRL, nella persona del Sig. Giuseppe Briguglio,
per procedere alla rispondenza fra quanto previsto nel progetto esecutivo e le
circostanze e condizioni locali, alla esatta determinazione delle aree destinate alla
logistica di cantiere, all'ubicazione delle varie opere da eseguire in riferimento alla
previsioni del capitolato Speciale d'Appalto, consegnando le chiavi di accesso al
cancello sede della scuola;
Quadro economico
Per i lavori di "ripristino copertura corpo atrio a – asilo nido il Bruco Pellegrino, in via
Pellegrini 19, Genova" l'importo complessivo risultante dal progetto esecutivo era
così ripartito:

\\comge\dfs1\Attuazione Opere Pubbliche	\INTERVENTI\20899 -
ASILO VIA PELLEGRINI\04_COLLAUD	O - CRE\CRE\doc
preparatorio\M20899-CRE BRUCO_apr23	.doc



## QUADRO TECNICO ECONOMICO DELL'INTERVENTO - PROGETTO

INTERVENTO DI RIPRISTINO COPERTURA CORPO "ATRIO A"

#### QUADRO ECONOMICO DI SPESA

ai sensi Art. 32 / D. Lgs 207/2010

A.1	Importo del lavori	€	€
	di cui per lavori a misura OPERE EDILI	€142.103,28	Sub-
	Totale importo lavori		£ 110 100 0
E	Totale Importo lavon		€ 142.103,28
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 27.852,96	
A.3	Oneri per la sicurezza COVID derivanti da Ordinanza n. 48/2020 del 20.07.2020 del Presidente della Giunta Regionale non soggetti a ribasso	€ 4,167,87	
	Totale sicurezza		€ 31,520,63
A.4	Lavori in economia		€ 4.095,60
Totale	(A1+A2+A3+A4)		€ 177,719,71
В	Somme a disposizione dell'Amministrazione		•
8.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appatto		€0,00
8.2	Rillevi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€0.00
B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 0.00
8.4	Imprevisti (max. 8%)		€ 14,217,58
8.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		€0.00
8.6	Accantonamento di cui all'articolo 113 del D.Lgs.50/2016 (incentivo)		€ 3.554,39
8.7	Spese di oui agli articoli 24, comma 4, del D.Lgs.50/2016, spese per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione		€0.00
8.8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 3,465,31
8.9	Eventuali spece per commissioni giudicatrici		€0,00
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€0,00
B.11	Spese per progettazione esecutiva, accertamenti di laboratorio e verifiche teoniche previste dal capitolato speciale d'appatto, collaudo teonico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, coordinatore sicurezza in fase esecuzione		€14.798.72
B.12	Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione lavori) e oneri diretti e indiretti (min 6% max 6%)		€0,00
B.13	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		
	Somme a disposizione (iva compresa)		€0,00
Totale	Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1++B.14)		€ 36,036,00
C	IVA		£
C.1.1	I.V.A. su Lavori	10%	€0.00
THE PARTY NAMED IN	LV.A. su Lavori	22%	€ 39.098.34
100	LVA su Lavori	4%	€0.00
	LV.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione (escluso incentivo B.6)	22%	€7.145.95
0.2	The second is a supposition of the second in the second second CO	Totale (VA)	€ 46,244,29

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)	€ 260.000,00

## Aggiudicazione

L'esperimento di gara a procedura negoziata si concluse con l'aggiudicazione definitiva dell'esecuzione dei lavori con Determinazione Dirigenziale n. 2022-212.1.0.-7 del 18/05/2022, esecutiva dal 22/05/2022, che aggiudicava la realizzazione dei lavori di

\\comge\dfs1\Attuazione_Opere_Pubbliche\INTERVENTI\20899 - ASILO VIA PELLEGRINI\04_COLLAUDO - CRE\CRE\doc preparatorio\M20899-CRE BRUCO_apr23.doc	Pagina 4 di 20
---	----------------



"ripristino copertura corpo atrio A – asilo nido il Bruco Pellegrino, in via Pellegrini 19, Genova", al Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop., con sede in Via C. di Marzabotto, 47 – 47922 Rimini, P.I. e C.F. 01685300400, con il ribasso offerto del 21,763%, per un importo contrattuale risultante di Euro 146.793,77, comprensivo di oneri per la sicurezza, e opere in economia, il tutto oltre IVA al 22% di legge.

#### Cauzione

L'impresa, a garanzia della perfetta esecuzione dell'appalto e dell'osservanza di tutti i patti contrattuali, ha presentato polizza fidejussoria (garanzia definitiva) n.1891222, emessa in data 18/07/2022, per l'importo di Euro 146.793,77, pari al 9,41% dell'importo di contratto, presso la Compagnia "ELBA ASSICURAZIONI S.p.A." – Sede di Milano, Via Mecenate 90, CAP 20138.

### Responsabile del procedimento

Il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 è stato l'Arch. Emanuela Torti, Dirigente del Settore Attuazione Opere Pubbliche, con decorrenza dal 18/05/2022 (nomina RUP con atto datoriale prot. 0191177.I del 18/05/2022) in forza alla Direzione Lavori Pubblici nell'ambito dell'Area Servizi Tecnici ed Operativi.

#### Ufficio Direzione Lavori

Il Verbale di consegna aree ed avvio lavori (processo verbale di consegna dei lavori) NP. 21/06/2022.0001085.I con consegna delle chiavi del cancello di accesso all'area della scuola, è stato firmato dalla scrivente Arch. Sabrina Pipino, Funzionario della Settore Attuazione Opere Pubbliche, coadiuvata dal Geom. Raffaele Pessina in qualità di Direttore Operativo, appartenente alla medesima Direzione.

I lavori sono stati diretti dall'Arch. Sabrina Pipino, Funzionario della Direzione Lavori Pubblici, Settore Attuazione Opere Pubbliche, coadiuvata dal Geom. Raffaele Pessina in qualità di Direttore Operativo.

\\comge\dfs1\Attuazione_Opere_Pubbliche\INTERVENTI\20899 -
ASILO VIA PELLEGRINI\04_COLLAUDO - CRE\CRE\doc
preparatorio\M20899-CRE BRUCO_apr23.doc



Con Determinazione Dirigenziale N. 2022-212.1.021 del 17/06/2022, esecutiva dal
20/06/2022, è stato affidato l'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione al Geom. Alberto Romairone, professionista esterno all'Ente, con sede
legale in (Common Steme 186 CAP 1615) (CAP 333 1416 118) (CAP 345 1416 118)
025.14960992 - C.E. RMRLRT95.165D969O: - PEC introduction minimalignes per in
Codice beneficiario 60149, iscritto al Collegio dei Geometri di Genova al nº 3908.
Consegna dei lavori
I lavori sono stati consegnati con "Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza in
pendenza di contratto" in data 20/06/2022, Prot. N 21/06/2022.0001085.I, senza
riserva alcuna da parte dell'Impresa.
Tempo previsto per l'esecuzione - penali in caso di ritardo
Il Contratto d'Appalto prevedeva che i lavori fossero completati in 75 giorni naturali e
consecutivi e perciò cessanti il 02 settembre 2022; per effetto della proroga concessa
con "Concessione Proroga per ultimazione dei lavori" Prot. 02/09/2022.0331267.U, è
stato assegnato un maggior tempo utile per completare i lavori di 20 giorni naturali e
consecutivi.
Il nuovo termine di ultimazione dei lavori, pertanto, è stato fissato al 22 settembre
2022.
L'art. 5 del Contratto d'Appalto, Rep. n. 270 del 02 agosto 2022, prevede una penale
pecuniaria, stabilita nella misura dell'1 per 1.000 dell'importo contrattuale per ogni
giorno di ritardo nella fase di realizzazione dei lavori, pari a Euro 146,79.
Varianti
Si è resa necessaria l'approvazione di una variante in linea tecnica non onerosa (Rep.
NP 15/11/2022.0001998.I) per l'esecuzione di lavorazioni finalizzate al
miglioramento ed alla funzionalità dell'opera. Tali modifiche non hanno determinato

Pagina 6 di 20

\\comge\dfs1\Attuazione\_Opere\_Pubbliche\INTERVENTI\20899 -ASILO VIA PELLEGRINI\04\_COLLAUDO - CRE\CRE\doc preparatorio\M20899-CRE BRUCO\_apr23.doc



la variazione dell'importo contrattuale in quanto la formazione dei nuovi prezzi e delle lavorazioni aggiuntive è stata compensata dallo stralcio di lavorazioni inizialmente previste a progetto ma non più necessarie a seguito della diversa organizzazione e gestione del cantiere assunte dall'esecutore.

#### Approvazione di Nuovi Prezzi

Con "Atto di sottomissione per concordamento ed accettazione nuovi prezzi", NP. 0001998.I del 15/11/2022 vennero approvati n° 11 Nuovi Prezzi, concordati e desunti in parte da analisi prezzi ed in parte dal Prezzario Regionale delle Opere Edili ed Impiantistiche 2022, da assoggettare al ribasso d'asta percentuale del 21,763% offerto in sede di gara, riguardanti:

- N.P.COP.11 rimozione pannelli REI;
- N.P.COP.12 smontaggio lampade di emergenza esistenti;
- PR.E50.A01.015 apparecchio di illuminazione di emergenza;
- PR.E50.A01.100 kit installazione lampade emergenza;
- 30.E50.A05.005 -posa corpi illuminanti;
- 30.E65.E10.011 messa in servizio impianto rivelazione fumi;
- N.P.COP.13 verifica funzionamento impianto di rivelazione fumi;
- N.P.COP.14 fornitura di nuovi cupolini a doppia parete in sostituzione di quelli esistenti:
- AT.N01.A10.070 autocarro da 19 tonnellate con gruetta;
- AT.N06.C20.010 –piattaforma aerea fino a 20,0 metri;
- 5.E10.A10.015 fune di sostegno per dispositivo anticaduta a cavo retrattile;

#### Sospensione e ripresa dei lavori

Nel corso delle attività non sono stati emessi provvedimenti di sospensione dei lavori in appalto.

\\comge\dfs1\Attuazione Opere Pubbliche\INTERVENTI\20899 -	Pagina 7 di 20
ASILO VIA PELLEGRINI\04_COLLAUDO - CRE\CRE\doc	
preparatorio\M20899-CRE BRUCO_apr23.doc	



	Proroghe
	Con comunicazione del 02/09/2022 Prot. 02/09/2022.0331267.U è stata concessa
	all'impresa esecutrice una proroga di giorni 20 per l'ultimazione dei lavori.
	La proroga veniva concessa a seguito di richiesta inoltrata in data 01/09/2022 Prot.
	02/09/2022.0331251.E, per il completamento delle lavorazioni, protrattesi a causa
	delle notevoli precipitazioni atmosferiche nel mese di agosto e per le difficoltà
	riscontrate nel reperimento di alcuni materiali.
	Scadenza definitiva del tempo utile
	Per effetto della proroga concessa, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori veniva
	fissato al 22/09/2022.
	Subappalti – Adempimenti antimafia
	Nel corso dei lavori l'appaltatore ha subappaltato/sub affidato i seguenti lavori:
1)	lavori ricadenti nella categoria OS8 (opere di impermeabilizzazione) per l'esecuzione
	delle impermeabilizzazioni, per un importo di Euro 1.500,00 oltre IVA alla Ditta
	RULLO FRANCO, con sede in Monasterace (RC), CAP 89040, Via Lambrosi, codice
	fiscale et al la National de Partita I.V.A. n. 01248620807, iscrizione al Registro
	delle Imprese della Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di
	Reggio di Calabria al numero REA RC – 122454 – PEC
2)	lavori ricadenti nella categoria OS6 (finiture di opere generali in materiali lignei,
	plastici, metalli e vetrosi) per la posa di scossaline in acciaio, per un importo di Euro
	1.000,00 oltre IVA alla Ditta LIGURIA COPERTURE SNC S.r.l., con sede legale in
	Savona (SV), CAP 17100, Via Mongrifone civ. 1, codice fiscale e Partita I.V.A. n.
	01851900090, iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio
	Industria Artigianato e Agricoltura RIVIERE DI LIGURIA - IMPERIA LA SPEZIA
	SAVONA al numero REA SV-229089 – PEQ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
	Washington Ones Publish (INTERVENIT) 20000
	\\comge\dfs1\Attuazione_Opere_Pubbliche\INTERVENTI\20899 - ASILO VIA PELLEGRINI\04_COLLAUDO - CRE\CRE\doc preparatorio\M20899-CRE BRUCO_apr23.doc



3) La direzione lavori, che conserva agli atti la documentazione prescritta dalla Legge 55/90, ha adempiuto le norme e disposizioni vigenti in materia.

#### Ordini di servizio

Durante il corso dei lavori è stato emesso il seguente ordine di servizio:

- Ordine di Servizio n. 1 in data 05/08/2022 prot. 05/08/2022.0304018.U, riguardante lo sgombero dei detriti dall'area di cantiere in vista della chiusura nella settimana di ferragosto, la realizzazione di una protezione della copertura dell'edificio con guaina bituminosa (diventerà definitiva), l'incremento della forza lavoro per il recupero del ritardo accumulato ai fini del rispetto della data di fine lavori, la consegna di tutte le schede tecniche dei materiali che saranno utilizzati, la pulizia quotidiana dell'area di cantiere, aggiornamento del programma lavori.

#### Ultimazione dei lavori

I lavori sono stati dichiarati ultimati in data 11/11/2022, così come risultante dal Certificato di Ultimazione dei Lavori, prot. Rep. NP 15/11/2022.0001999.I.

Constatata la fine lavori delle opere principali nella loro essenzialità, si è reso necessario assegnare un termine aggiuntivo di giorni 19 per il completamento di attività marginali non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il termine ultimo per il completamento di tali attività di rifinitura marginali è stato dunque fissato al 30/11/2022. In data 05/12/2022 il Direttore dei Lavori e l'impresa esecutrice dei lavori, Omega Costruzioni S.r.l., hanno effettuato sopralluogo congiunto presso i luoghi di intervento constatando il completamento delle attività residuali di finitura. In tale occasione è stato controfirmato il verbale di conferma del predetto certificato di ultimazione lavori attestante l'effettivo completamento delle opere in appalto alla data del 30/11/2022.

#### Penali e compensazioni

\\comge\dfs1\Attuazione_Opere_Pubbliche\INTERVENTI\20899 - ASILO VIA PELLEGRINI\04_COLLAUDO - CRE\CRE\doc	Pagina 9 di 20
preparatorio\M20899-CRE BRUCO_apr23.doc	



A fronte del termine ultimo di ultimazione dei lavori, definito al 22 settembre 2022 con atto di concessione di proroga prot. 02/09/2022.0331267.U, ed alla fine lavori effettiva, avvenuta in data 11 novembre 2022, così come risultante dal Certificato di Ultimazione dei Lavori, prot. Rep. NP 15/11/2022.0001999.I, l'Impresa ha completato le attività con un ritardo, rispetto ai termini contrattuali, di 35 giorni consecutivi (50 giorni solari consecutivi ai quali vanno detratte 15 giornate di pioggia, queste ultime confermate dal sito ufficiale della Regione Liguria – Stazione di rilevamento di Genova-Fiumara). In base alle prescrizioni contrattuali il calcolo delle penali addebitabili all'impresa ammonterebbe pertanto ad Euro 5.137,65 (50 gg x € 146,79/die per le penali ai quali vanno dedotti i 15 gg di pioggia). In luogo dell'addebito di tali penali, il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Emanuela Torti, ed il Direttore dei Lavori, Arch. Sabrina Pipino, hanno convenuto di far eseguire all'impresa esecutrice, Omega Costruzioni S.r.l., alcune opere manutentive al fabbricato (sistemazione dei muri laterali e dei corrimani della scala pedonale di collegamento tra l'ingresso a piano strada ed il cortile di ingresso all'Asilo Nido e trattamento di pulitura, applicazione di fondo antiruggine e di coloritura delle 4 colonne in acciaio sostenenti la copertura metallica dell'Asilo Nido in prossimità dell'area giochi esterna) a compensazione delle penali derivanti dalla ritardata ultimazione delle opere. Per l'individuazione e la quantificazione economica delle opere da doversi realizzare a compenso degli importi delle penali, dietro anche i suggerimenti forniti dagli operatori scolastici presenti quotidianamente all'interno della struttura scolastica, sono state considerate la via d'accesso all'edificio (scalinata) e l'arca giochi esterna che, nella bella stagione, viene utilizzata dai piccoli utenti della struttura.

\\comge\dfs1\Attuazione_Opere_Pubbliche\INTERVENTI\2	0899 -
ASILO VIA PELLEGRINI\04_COLLAUDO - CRE\CRE\do	С
preparatorio\M20899-CRE BRUCO_apr23.doc	



La determinazione dei compensi è stata effettuata secondo i seguenti conteggi:

La deteri	minazione dei compensi è stata effettuata seco	JIIU	O I SC	guei	III C	onicg	gı.	
								l.
	CALCOLO PENALI Dal 23.09 al 11.11	50			GG	50,00	146,79€	€ 7.339,50
	Giorni di pioggia	15			GG	-15,00	146,79€	-€ 2.201,85
	TOTALE PENALI							€ 5.137,65
	LAVORAZIONI IN COMPENSAZIONE ALLE PENALI	**	HIMCH	ALT	118.4	O TAI	D.11	TOTALE
AT.N06.C20.010	COLONNE METALLICHE Noleggio piattaforma	N	LUNGH.	ALI.	Н	Q,TA' 16,00	P.U. € 79,16	TOTALE € 1.266,56
	Asportazione di vecchie pitture in fase di distacco e ossidazioni, eseguita con l'uso							
25.A90.D05.030	di idonei attrezzi meccanici su carpenteria metallica misurata a sviluppo	4,00			M2	14,58	€9,19	€ 134,01
25.A90.D10.100 25.A90.D10.300	Antiruggine idrosolubile misurato a sviluppo Finitura ferro idrosmalto misurato a sviluppo	4,00		0,66	M2 M2	14,58 29,16	€ 8,40	€ 122,49 € 246,44
								6176050
	Ribasso di gara		21,763%					€ 1.769,50 -€ 385,10
	Totale scontato COLONNE METALLICHE							€ 1.384,41
	MURI SCALA ACCESSO Rifacimento di intonaco interno o esterno a rappezzi, compresi la preventiva		LUNGH.	ALT.	UM	Q.TA'	P.U.	TOTALE
	rimozione della parte lesionata nonché la pulizia e il lavaggio del supporto,							
	costituito da: - un primo strato dello spessore sino a cm. 3 costituito da sabbia di fiume in							
	ragione di 0,80 m3 e da 0,3 +0,375 m3 di legante.  - un secondo strato dello spessore di cm. 1 costituito da sabbia di fiume in							
5.A54.A15.010	ragione di 0,75 m3 al m3 di impasto e da 0,5 m3 di legante. Eseguito completamente a mano su murature di pietrame o mattoni. Escluso lo	2,00	5,50	1,00	M2	11,00	€ 109,86	€1.208,46
25.A90.A05.010	Raschiatura e spazzolatura vecchie pitture murature esterne - murature	2,00	21012	1,50		63,45	€ 2,62	€ 166,24
0.D04.A09.010	Pulitura a secco con spazzole morbide media durezza - scale Strato di finitura per intonachi interni o esterni, escluso l'onere delle		20,60	2,02	IVIZ	41,61	€ 24,25	€1.009,09
5.A54.A18.020	ponteggiature di servizio, pigmentato, con malta di grassello di calce bianca e polvere di marmo dello spessore non inferiore a mm. 2, lavorato a frattazzo e	2,00	5,50	1,00	M2	11,00	€ 33,75	€ 371,25
25.A90.A10.020	Applicazione di fissativo e/o isolante per superfici murarie esterne silossanico pigmentato, inclusa la fornitura dello stesso.	2,00	21,15	1,50	M2	126,90	€3,64	€ 461,92
25.A90.A20.030	Tinteggiatura di superfici murarie esterne con idropittura a base di resine silossaniche (prime due mani)	2,00	21,15	1,50	M2	126,90	€ 11,34	€ 1.439,05
25.A90.D05.030	Asportazione di vecchie pitture in fase di distacco e ossidazioni, eseguita con l'uso di idonei attrezzi meccanici su carpenteria metallica misurata a sviluppo	2,00	15,00	0,13	M2	3,98	€9,19	€ 36,55
5.A90.D10.100	Antiruggine idrosolubile misurato a sviluppo	2,00	15,00	0,13	M2	3,98	€8,40	€ 33,41
.A90.D10.300	Finitura ferro idrosmalto misurato a sviluppo	2,00	15,00	0,13	M2	7,95	€8,45	€67,21
								€4.793,17
	Ribasso di gara		21,763%					€ 4.793,17 •€ 1.043,14
	Totale scontato MURI SCALA ACCESSO ASILO							€ 3.750,03
	Totale lavori compensativi scontati Penai totali							€ 5.134,44 € 5.137.65
	DIFFERENZA LAVORI COMPENSATIVI/PENALI							-€ 3,21
Sulla bas	se dei sopra richiamati conteggi, si consider	anc	le la	vor	azio	ni fat	te ese	onire
ouna ou	se del sopia nomanan conteggi, si consider		10 10		uL10			gune
all'impre	esa Omega Costruzioni S.r.l. compensative de	egli	impo	rti d	elle	pena	li dov	ute ai
ritardi ac	ecumulati.							
ritardi ac	cumulati.							
\\comge\d	fs1\Attuazione Opere Pubbliche\INTERVENTI\20899	) -				Pa	gina 11	di 20
ASILO V	fs1\Attuazione_Opere_Pubbliche\INTERVENTI\20899 IA PELLEGRINI\04_COLLAUDO - CRE\CRE\doc rio\M20899-CRE BRUCO_apr23.doc	) -				Pa	gina 11	di 20



DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE	
Verbali di danno per forza maggiore	
Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati accertati danni di forza maggiore.	
Anticipazione	
Ai sensi dell'art. 9 c.1 del Contratto d'Appalto l'appaltatore non ha richiesto	
l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale richiedendo inoltre l'emissione di un	
unico SAL di pagamento al termine dei lavori.	
Andamento dei lavori	
I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto,	
alla variante in linea tecnica non onerosa ed alle disposizioni impartite dal Direttore	
dei Lavori.	
Stati d'Avanzamento	
E' stato emesso dalla sottoscritta D.L. nº 1 Stato di Avanzamento Lavori, unico, al	
completamento dei lavori medesimi di cui al certificato Rep. NP	
15/11/2022.0001999.I, come richiesto dall'impresa affidataria e confermato	
dall'impresa esecutrice a mezzo mail in data 22/09/2022:	
SAL n. 1 del 15/12/2022 per lavori a tutto il 03/11/2022 per Euro 136.646,77, al lordo	
della ritenuta dello 0,5%, oltre IVA.	
A fronte di suddetto SAL è stata applicatala ritenuta pari allo 0,5% per infortuni.	
E' stato conseguentemente emesso il seguente Certificato di Pagamento oltre IVA e al	
netto delle ritenute di legge dello 0,5%:	
- Certificato di pagamento n.1 del 15/12/2022, protocollo 485939/2022, pari ad Euro	
135.963,23 IVA esclusa.	
Certificati d'acconto	
Non sono stati emessi certificati di acconto.	

\\comge\dfs1\Attuazione	_Opere_Pubbliche\INTERVENTI\20899 -
ASILO VIA PELLEGRI	NI\04_COLLAUDO - CRE\CRE\doc
preparatorio\M20899-CI	RE BRUCO apr23.doc



Conto Finale				
L'ammontare complessivo delle opere esegu	ite, pari a € 138.53	0,3	30, è così ripartito:	
Lavori a misura	Euro		113.501,72	
Oneri sicurezza	Euro		25.959,36	
Oneri sicurezza Covid	Euro		0,00	
Opere in economia:				
Provviste	Euro		0,00	
TOTALE (IVA ESCLUSA)	Euro		139.461,08	
A dedurre:				
Importo totale dell'acconto pagato all'impre	sa (SAL N. 1) al n	ieti	to della ritenuta dello	
0,5%:				
	Euro	_	135.963,23	
CREDITO NETTO DELL'IMPRESA QUA	LE RATA DI SAI	LD	OO (IVA ESCLUSA)	
	<u>Eur</u>	0_	3.497,85	
Confronto fra la somma autorizzata e que	lla spesa			
L'Importo netto autorizzato per lavori, IV	VA esclusa, risult	ta	di Euro 146.793,77.	
L'importo netto dei lavori eseguiti, IVA escl	lusa, risultante dall	0 5	stato finale, è di Euro	
139.461,08 e, pertanto, con una minore spesa	a di Euro 7.332,69.			
Riserve dell'impresa				
L'Impresa ha firmato il registro di contabilità	à senza avanzare ri	sei	rve.	
Assicurazione degli operai				
L'Impresa esecutrice OMEGA COSTRU	JZIONI S.r.l., co	ons	sorziata dell'impresa	
appaltatrice C.A.R. SOCIETA' COOPERATIVA, ha regolarmente assicurato i propri				
operai contro gli infortuni sul lavoro presso	Agrigento con polizza			
assicurativa territoriale PAT n. 20533010 c	con decorrenza co	nti	nuativa, codice ditta	
N 161V44 : 0 = 110 : 1	TARITI AGGGG		Ip : 42 **22	
\\comge\dfs1\Attuazione_Opere_Pubbliche\INTERVE ASILO VIA PELLEGRINI\04_COLLAUDO - CRE\C preparatorio\M20899-CRE BRUCO_apr23.doc			Pagina 13 di 20	
10 Mar. 1740: 94-800			7.5	



18394940.

L'impresa C.A.R. Soc. Coop. ha regolarmente assicurato i propri dipendenti contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa territoriale PAT n. 9309015439, codice ditta 4200222.

#### Assicurazioni sociali

L'Impresa esecutrice OMEGA COSTRUZIONI S.r.l, consorziata dell'impresa appaltatrice C.A.R. Soc. Coop. ha regolarmente assicurato i propri operai contro le malattie presso l'I.N.P.S. sede di Agrigento, con matricola aziendale n. 0105838564.

L'impresa C.A.R. Soc. Coop. ha regolarmente assicurato i propri dipendenti contro le malattie presso l'I.N.P.S. sede di Rimini con matricola aziendale n. 3204549272.

Regolarità contributiva – DURC - A seguito delle verifiche effettuate in corso d'opera mediante richiesta di DURC, sia l'impresa esecutrice sia l'impresa affidataria dei lavori, sono sempre risultate in regola.

Prima dell'emissione del presente atto è stata verificata la regolarità contributiva del Consorzio mediante DURC emesso il 06/02/2023 (protocollo INPS\_34558431) con validità a tutto il 06/06/2023.

Parimenti l'impresa consorziata esecutrice dei lavori OMEGA COSTRUZIONI s.r.l. è sempre risultata in regola. Prima dell'emissione del presente atto è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa OMEGA COSTRUZIONI S.r.l. mediante DURC emesso il 02/03/2023 (protocollo INPS 34941479) con validità a tutto il 30/06/2023.

#### Infortuni nel corso dei lavori

Durante l'appalto non si sono verificati infortuni sul lavoro a conoscenza della Direzione Lavori.

#### Tempo stabilito per il collaudo

In base all'art. 11 del Contratto d'Appalto il Certificato di Regolare Esecuzione

\\comge\dfs1\Attuazione Opere Pubbliche\INTERVENTI\20899 -	Pagina 14 di 20
ASILO VIA PELLEGRINI\04_COLLAUDO - CRE\CRE\doc	
preparatorio\M20899-CRE BRUCO apr23.doc	
	X-



avrebbe dovuto essere emesso entro 3 mesi a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, certificata in data 11/11/2022, pertanto entro il 10/02/2022; tale tempistica è stata interrotta in attesa dell'acquisizione delle documentazioni/certificazioni complete da parte dell'Impresa appaltatrice (nello specifico per le certificazioni relative alla linea vita), pervenuta in data 27/03/2023; da quest'ultima data decorre il tempo stabilito per il collaudo, pertanto entro il 26/06/2023.

#### Avvisi ad opponendum

Non occorre procedere alla pubblicazione degli "avvisi ai creditori" in quanto per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare in modo temporaneo o permanente proprietà private e non sono stati arrecati danni diretti o indiretti ai beni di proprietà privata, come risultante da Dichiarazione del Direttore dei Lavori Rep. NP 01/03/2023.0000455 I

#### Cessione dei crediti

Come risultante dalla comunicazione prot. 17/02/2023.0070644.I del 17/02/2023, a firma della Direzione Ragioneria del Comune di Genova, non sono segnalate notifiche di cessioni di crediti da parte dell'Impresa appaltatrice, nonché procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento.

#### Collaudatore

Atteso che l'importo netto dei lavori risulta inferiore a 1.000.000,00 di Euro ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, è prevista la redazione del certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori (come previsto all'art. 11 del Contratto d'appalto).

#### Visita di collaudo

In data 11/11/2022 si è proceduto alla visita di collaudo, in concomitanza del sopralluogo di fine lavori.

\\comge\dfs1\Attuazione_Opere_Pubbliche\INTERVENTI\20899 -	
ASILO VIA PELLEGRINI\04_COLLAUDO - CRE\CRE\doc	
preparatorio\M20899-CRE BRUCO_apr23.doc	



Alla visita di collaudo erano presenti, oltre alla sottoscritta, il D.O. Geom. Raffaele Pessina ed il Sig. Giuseppe Briguglio, datore di lavoro dell'impresa esecutrice OMEGA COSTRUZIONI S.r.l.

In sede di visita di collaudo, il Direttore dei Lavori ha verificato e constatato l'effettiva ultimazione delle opere eseguite secondo le indicazioni contrattuali ed in base alle istruzioni operative fornite all'Impresa nel corso delle lavorazioni.

Oltre alle visite di collaudo in corso d'opera, si è proceduto alla visita di collaudo finale in data 11/11/2022 (Verbale Rep. NP1999 20221511).

#### Visita finale di collaudo

Nel corso della visita dell'11/11/2022, sulla scorta degli elaborati grafici e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei Lavori, congiuntamente agli altri intervenuti, ha percorso la zona dei lavori per un esame generale dei lavori stessi, conducendo verifiche e deducendo che le opere eseguite corrispondono, per gli effetti contabili, in tutto e per tutto, a quanto registrato nei libretti delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale. In tutte le opere eseguite si è constatata che la qualità dei materiali impiegati e la lavorazione svolta a regola d'arte rispettano le prescrizioni contrattuali; di tali opere erano state in ogni modo verificate la corretta esecuzione e la corrispondenza, per gli effetti contabili a quanto registrato nei documenti contabili stessi, in sede di visita di fine lavori.

Tutto quanto sopra premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto da cui risulta:

- a) che i lavori vennero eseguiti secondo il progetto e le indicazioni della D.L.;
- b) che l'ammontare dei lavori, secondo quanto contabilizzato, al netto dell'IVA ed al lordo delle trattenute di garanzia ammonta ad Euro 139.461,08;
- c) che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni sociali prescritte dalla

\\comge\dfs1\Attuazione Opere Pubbliche\IN	ΓERVENTΙ\20899 -
ASILO VIA PELLEGRINI\04 COLLAUDO -	CRE\CRE\doc
preparatorio\M20899-CRE BRUCO apr23.doc	



legge;

- d) che i lavori non sono stati completati nei tempi indicati dal contratto, e che hanno comportato quindi l'applicazione della penale prevista all'art. 5 del Contratto (vd. alla voce penali e compensazioni);
- e) che i prezzi applicati sono quelli di capitolato, oltre ai nuovi prezzi approvati per variante in corso d'opera non sostanziale ai sensi del D. Lgs 50/2016 art. 106 c.1, per lavori in linea tecnica non onerosa, come da allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi prot. NP 1998 20221511;
- f) che sono stati adempiuti gli obblighi di legge in materia di "antimafia" riguardo al subappalto, ai piani di sicurezza, alla certificazione annuale;
- g) che lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità, dimensione, categoria e numero alle annotazioni riportate nei registri di contabilità e nello stato finale;
- h) che, come precedentemente specificato, i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali.

#### Imprevisti

A seguito delle segnalazioni pervenute dalla Direzione Didattica, relative a problematiche derivanti dalle infiltrazioni causate dalle condizioni della copertura oggetto di intervento ed antecedenti ai lavori di messa in pristino, sentito il R.U.P., il D.L. ha ritenuto poter utilizzare parte delle somme a disposizione del Q.E. per ripristinare la funzionalità degli impianti antincendio (rivelazione fumi) ed antintrusione, che avevano subito danni a causa delle infiltrazioni d'acqua piovana dal tetto, andando in tal modo a garantire la continuità didattica in piena sicurezza; sempre a causa delle problematiche infiltrative di cui sopra si è ritenuto inoltre opportuno, in accordo con il R.U.P. e la Dirigenza Scolastica, di far levigare una porzione di parquet sottostante la copertura dell'atrio "A" (salone centrale) che risultava

\\comge\dfs1\Attuazio	one_Opere_Pubbliche\INTERVENTI\20899 -
ASILO VIA PELLEO	GRINI\04_COLLAUDO - CRE\CRE\doc
	-CRE BRUCO apr23.doc



danneggiata, in fase di distacco e con la presenza di rigonfiamenti che ne pregiudicavano la praticabilità in totale sicurezza.

Per quanto riguarda gli impianti, l'intervento è ricaduto all'interno del Contratto di Servizio Comune /A.S.TER S.p.A. vigente, in virtù del quale il Settore Attuazione Opere Pubbliche ha dato mandato alla Direzione Facility Management, con Atto Datoriale prot. n. 130250 del 23/03/2023 (allegato al CRE), a prelevare dalle somme previste per "B.4 - Imprevisti" ancora disponibili, la somma di Euro 6.188,52 oltre Euro 1.361,48 per IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 7.550,00, al Capitolo di Spesa 72104 c.d.c. 2710.8.05 "Asili Nido e Servizi per l'infanzia – Manutenzione Straordinaria" del Bilancio 2023 P.d.C. 2.2.1.9.017 Crono 2022/585 mediante riduzione dell'IMPE 2023/6248 ed emissione di nuovo IMPE ad autorizzazione ad impegnare la somma di Euro 7.550,000 (Iva compresa).

Per quanto concerne la levigatura del parquet, il relativo trattamento ignifugo, l'incollaggio e la riverniciatura dello stesso, data la peculiarità dell'intervento, si è invece proceduto con l'affidamento diretto dei lavori all'impresa Falegnameria Diana S.r.l., con sede in Genova, Via G. Arrivabene 64r, CAP 16153, per un importo totale di Euro 8.542,44 (Iva compresa).

Preso atto delle certificazioni acquisite

La sottoscritta D.L. Arch. Sabrina Pipino

#### CERTIFICA REGOLARMENTE ESEGUITI

i lavori effettuati dall'Impresa OMEGA COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Agrigento, San Giovanni Gemini – Via degli Orefici 36 – CAP 92020, iscritto alla C.C.I.A.A. di Agrigento al n.02538540846, contratto cronologico n. 270 del 2 agosto 2022, in relazione all'appalto: "Lavori di ripristino copertura corpo atrio A – asilo nido il

\\comge\dfs1\Attuazione Opere Pubbliche\INTERVENTI\20899 -
ASILO VIA PELLEGRINI\04 COLLAUDO - CRE\CRE\doc
preparatorio\M20899-CRE BRUCO apr23.doc



Bruco Pellegrino, in via Pellegrini 19, Genova", e riconosce liquidabile, secondo le risultanze della contabilità e dello stato finale, pari ad Euro 139.461,08 al netto dell'IVA, l'importo di Euro 3.497,85 al lordo delle ritenute di garanzia.

Certifica pertanto di potersi restituire all'Impresa l'importo dello Stato Finale di Euro 4.267,38 di cui Euro 3.497,85 per lavori ed Euro 769,53 per IVA al 22%.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo delle ritenute di Legge sono subordinati ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., alla costituzione di una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, pari all'importo della rata di saldo maggiorato di interesse legale vigente per 2 anni, a decorrere dalla data di emissione del presente certificato.

Genova, lì 08 maggio 2023

L'IMPRESA OMEGA COSTRUZIONI S.r.l.



IL CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SCARL.

Consorzio Articola Amm.ya:
Via Cabolio MA 47900 RIMINI
Via Cabolio MA 47900 RIMINI
Le P.IVA 01 685 300 400
IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Arch. Sabrina Pipino)

\\comge\dfs1\Attuazione\_Opere\_Pubbliche\INTERVENTI\20899 -ASILO VIA PELLEGRINI\04\_COLLAUDO - CRE\CRE\doc preparatorio\M20899-CRE BRUCO\_apr23.doc

Pagina 19 di 20



	Visto il RUP	
	(Arch. Emanuela Torti)	
	(Aren. Bilantacia Tota)	HI
	Allegati:	
	Verbale concordamento nuovi prezzi	
	Certificati materiali	
	Atto datoriale Facility Management	
	Dichiarazioni corretta posa	
	Documentazione Linea Vita	
TB or America		
The second statement was a second second		
~~~~		
		Be A. Michigan Commission of C
~		The second secon
and the second section of the second		- 1+ Pa. 11+1- 11+1- 11-11- 11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-
	\\comge\dfs1\Attuazione_Opere_Pubbliche\INTERVENTI\20899 - Pagina 20 di 20 ASILO VIA PELLEGRINI\04_COLLAUDO - CRE\CRE\doc preparatorio\M20899-CRE BRUCO apr23.doc	
	preparatorio\M20899-CRE BRUCO apr23.doc	



#### DIREZIONE LAVORI PUBBLICI



SETTORE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE APPALTO: LAVORI DI RIPRISTINO COPERTURA CORPO ATRIO A – ASILO NIDO IL BRUCO PELLEGRINO, IN VIA PELLEGRINI 19, GENOVA. CUP B37H21009850004 - CIG 9100743AB2 - MOGE 20899 IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA: Euro 177.719,71 (oltre IVA 22%) di cui Euro 27.352,96 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), Euro 4.167,87 per oneri della sicurezza Covid (non soggetti a ribasso), ed Euro 4.095,60 per opere in economia (non soggette a ribasso). RIBASSO D'ASTA: -21,763 % (esclusi oneri sicurezza ed opere in economia). IMPORTO NETTO DEI LAVORI: Euro 146.793,77 (oltre IVA al 22%), di cui Euro 27.352,96 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), Euro 4.167,87 per Oneri della sicurezza Covid ed Euro 4.095,60 per opere in economia. IMPRESA APPALTATRICE: Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. , con sede legale in Rimini, via C. di Marzabotto 47 - 47922 - C.F. e P. I.V.A. 01685300400 CONTRATTO: Cronologico n. 270 del 02.08.2022 - Consegna lavori il 20.06.2022, fine lavori prevista 02.09.2022 - Concessione proroga al 22.09.2022 ATTO DI IMPEGNO per l'esecuzione di lavori in variante, in linea tecnica non onerosi, nonché di CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI Premesso, che durante l'esecuzione dei lavori previsti a progetto si è riscontrata l'esigenza di modificare od integrare alcune lavorazioni relative

Pagina 1 di 5



alla categoria degli oneri della sicurezza, da prevedersi in maniera alternativa	
a quanto previsto a progetto, a fronte di alcune opere edili eseguite in maggior	
misura, si rende necessaria l'esecuzione di lavori che, pur avendo attinenza	
con l'appalto in epigrafe, non rientrano nell'importo previsto per il contratto,	
fra l'amministrazione appaltante e l'impresa appaltatrice	
Per quanto in premessa viene stabilito quanto segue:	
Art. 1—OGGETTO	
Fra l'Amministrazione Appaltante e l'impresa Consorzio Artigiano Romagnolo	
Soc. Coop., con sede legale in Rimini, via C. di Marzabotto 47 - 47922 - C.F. e P.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
LV.A. 01685300400, appaltatrice dei lavori di ripristino del corpo atria A – Asilo	
Il Bruco Pellegrino, Via Pellegrini 19, nella persona del Sig. Michele Sorce, in	
qualità di Legale Rappresentante, che si impegna ed accetta, nell'ordine:	
1) a valere sulla parte d'opera dei lavori valutata a misura, consistente	
nei nuovi e/o maggiori lavori di seguito elencati:	
opere in minor misura o in diminuzione:	
1,a) minori sviluppi di demolizioni e di resa a PP.DD.;	******************************
1.b) minore superficie di massetto portapendenze;	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.c) minor ancoraggio di guaine bituminose;	
1.d) minori interventi vari di finitura;	AGNOLO
opere in maggior misura o in aumento:	T S
l.e) maggiori spessori del massetto portapendenze;	The state of the s
1.f) maggiori sviluppi murature in blocchi sp. 12 cm;	CONSORZIO
1.g) maggior numero di messicani;	***************************************
1.h) maggiori sviluppi di primer e di guaine bituminose;	######################################
1.i) rimozione e sostituzione di pannelli REI interni alla scuola;	a andre water sto
Pagina 2 di 5	



	1.1) smontaggio e sostituzione lampade di emergenza presenti a soffitto e	
	relativa messa in servizio;	
15_3034034 50	1.m) verifica funzionamento impianto di rilevazione fumi;	
	1.n) fornitura e posa in opera di nuovi cupolini in copertura;	
8	2) a valere sulla parte d'opera della sicurezza valutata a misura,	
	consistente nei nuovi e/o maggiori lavori di seguito elencati:	
	opere in minor misura o in diminuzione:	
	2.a) minori sviluppi delle opere di ponteggiatura;	
1	2.b) minor sviluppo baracche di cantiere;	
	2.c) minori sviluppi della recinzione di cantiere;	
	2.d) minori sviluppi su impianto idrico ed elettrico di cantiere;	
1	2.e) minori sviluppi degli oneri covid;	
92	opere in maggior misura o in aumento:	
	2.f) maggiori sviluppi di noleggio autocarri con gru;	
***************************************	2.g) maggiori sviluppi di noleggio piattaforma elevatrice;	
	2.h) funi di sostegno per dispositivi anticaduta;	
3 <del>12 12 10 10 10 10</del>	Per tutto quanto sopra si prevedono maggiori lavori per € 2.409,32,	
	corrispondente al 2,167% dell'importo contrattuale, a fronte della	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF
Action to the second state of the second sec	compensazione con lavorazioni in minor misura per pari importo, come da	
	elenco di cui sopra, quindi mantenendo il Contratto secondo il seguente	EGRAGIO
	Quadro Economico:	
	IMPORTO A BASE GARA:	COMSORZIO ART
	lavori a misura: Euro 142.103,28	CONSOR
	Importi non soggetti a ribasso d'asta:	
	per mano d'opera in economia noli e provviste Euro 4.095,60	
	Pagina 3 di 5	



per attuazione dei piani della sicurezza Euro 31.520,83	***************************************
Totale Euro 177.719,71	
IMPORTO NETTO DEI LAVORI:	
da contratto in variante	
Importo delle opere a misura Euro 111.177,34 Euro 113.586,66	
Oltre ai seguenti oneri non soggetti a ribasso:	
per mano d'opera in economia noli e provviste	PP 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P 1 P
Euro 4.095,60 Euro 4.095,60	
importo per attuazione dei piani della sicurezza	
Euro 31.520.83 Euro 29.111.51	4- 10-1417-HILLS
IMPORTO CONTRATTUALE Euro 146.793,77 Euro 146.793,77	
	***************************************
Considerato che per l'esecuzione dei lavori di cui in premessa, da	
contabilizzarsi a corpo, il contratto in epigrafe non include all'interno	
dell'elenco prezzi contrattuali tutti i prezzi con i quali provvedere al	
compenso, vengono stabiliti, ai sensi dell'art. 163 del Regolamento approvato	***************************************
con D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, i nº 11 NUOVI PREZZI di cui all'allegato	
Elenco All. 2, elaborati con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera,	мін т т ихуппнотині
noli e trasporti desunti da Prezzario Regione Liguria anno 2022 e da analisi	I ROMACHOLO
prezzi, nonché da indagini di mercato, da assoggettarsi al ribasso contrattuale	E P
del: 21,763%	· 100
Art. 3 - TERMINE DI ULTIMAZIONE	Paranosuoo
Per l'esecuzione dei lavori da doversi eseguire, in particolare per le maggiori	
quantità di guaine bituminose richieste la cui fornitura e posa in opera si è	
resa necessaria per la buona riuscita dell'appalto, si riconosce un differimento	
Pagina 4 di 5	



dei termini contrattuali di giorni 6 naturali successivi e continui. La nuova data di fine lavori risulta pertanto il 28.09.2022. Art. 4 - REGISTRAZIONE - ONERI FISCALI Fanno carico all'impresa tutti gli oneri fiscali conseguenti al presente atto, ivi incluse le spese di bollo e registrazione. L'IVA farà carico all'amministrazione appaltante, nella misura prevista dalla legge. Art. 5 - ALTRE CLAUSOLE Per tutte le altre clausole e condizioni, sono confermate quelle del contratto principale. Mentre il presente atto è immediatamente operante per la scrivente Impresa, lo diverrà per la Civica Amministrazione non appena l'apposito provvedimento avrà ottenuto le superiori approvazioni di legge. Letto, confermato e sottoscritto in Genova il 10 Novembre 2022 L'IMPRESA CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP. (sig. Michelé Sorce) Sorzio Artigiani Romagnolo Sc La sottoscritta arch. Emanuela Torti, Dirigente del Settore Attuazione Opere Pubbliche, dichiara che il suddetto appaltatore ha posto la firma in calce al presente atto in sua presenza e, pertanto, ne attesta l'autenticità. IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (arch. Emanuela Torti)





# DIREZIONE LAVORI PUBBLICI SETTORE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

**OGGETTO:** Atto Datoriale di NULLA OSTA all'utilizzo di parte della somma disponibile alla voce "Quota spese tecniche" del Quadro Economico dell'intervento di "RIPRISTINO COPERTURA CORPO ATRIO A – ASILO NIDO IL BRUCO PELLEGRINO", in Via Pellegrini 19 (CUP: B37H21009850004 - MOGE: 20899 – CIG: 9100743AB2) per l'affidamento ad A,S,Ter. S.p.a. dei lavori di manutenzione straordinaria agli impianti antincendio ed antintrusione presenti all'interno dell'Asilo Nido Il Bruco Pellegrino.

Al Direttore
DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

pc: Ing. Dario Marchi Funzionario Tecnico

> Dott.ssa Simona La Rosa Funzionario Amministrativo

#### Premesso che:

- con D.D. 2022-205.0.0.-14 del 21.02.2022 sono stati approvati il progetto esecutivo dei lavori e le modalità di gara per l'intervento di "Ripristino della copertura corpo atrio A – asilo nido il Bruco Pellegrino, Via Pellegrini 19".
- a seguito di procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lettera c), D. Lgs. 50/2016, con Determinazione Dirigenziale n. 2022-212.1.0.-7 del 18.05.2022 ed esecutiva dal 22.05.2022, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori al Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop., con sede in Via Caduti di Marzabotto 47 47922 Rimini Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01685300400;

#### Considerato che:

- la manutenzione ordinaria degli impianti di antintrusione e di rilevazione fumi è stata affidata ad A.S.Ter. S.p.a. nell'ambito di un vigente contratto di servizio col Comune di Genova, proprietario dell'immobile;
- in data 26/01/2023, con Prot. GEN-2023-0000331-P, A.S.Ter. S.p.a. (Azienda Servizi Territoriali Genova) ha trasmesso preventivo di spesa per l'intervento di manutenzione straordinaria all'impianto antintrusione posto all'interno dell'edificio scolastico per un importo di Euro 1.147,54 oltre ad IVA per complessivi Euro 1.400,00;







 in data 26/01/2023, con Prot. GEN-2023-0000332-P, A.S.Ter. S.p.a. (Azienda Servizi Territoriali Genova) ha trasmesso preventivo di spesa per l'intervento di manutenzione straordinaria all'impianto antincendio posto all'interno dell'edificio scolastico per un importo di Euro 5.040,98 oltre ad IVA per complessivi Euro 6.150,00;

#### Considerato inoltre che:

 si ritiene necessario procedere con le manutenzioni straordinarie degli impianti di antincendio ed antintrusione al fine di garantire la continuità didattica e la sicurezza degli utenti e dell'edificio;

Visto l'articolo 107 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, che determina le funzioni e le responsabilità attribuite ai Dirigenti;

Visto l'art.4 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, e s.m.i., che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli organi della direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei Dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano la Civica Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di riorganizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Visti gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27/12/2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025 e ss.mm.ii;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 17/03/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

Si autorizza la Direzione Facility Management a prelevare, dalle somme previste per "Spese Tecniche" ancora disponibili di cui al quadro economico approvato con l'anzidetta 2019-176.2.0.-89 del 12/12/2019, la somma di Euro 6.188,52 oltre Euro 1.361,48 per IVA al 22%, per un totale complessivo di Euro 7.550,00, al Capitolo di Spesa 72104 c.d.c. 2710.8.05 "Asili Nido e Servizi per l'infanzia – Manutenzione Straordinaria" del Bilancio 2023 P.d.C. 2.2.1.9.017 Crono 2022/585 mediante riduzione dell'IMPE 2023/6248 ed emissione di nuovo IMPE;

Nel restare a disposizione per quanto di specifica competenza, si richiede di informare la scrivente Direzione sulla conclusione dell'intervento; con l'occasione, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente
(Arch. Emanuela Torti)
[documento sottoscritto digitalmente]





# ALLEGATI AL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

LAVORI DI RIPRISTINO COPERTURA CORPO ATRIO A – ASILO NIDO IL BRUCO PELLEGRINO, IN VIA PELLEGRINI 19, GENOVA

## ELENCO SCHEDE TECNICHE E DICHIARAZIONI

	TETTO COPERTURA ATRIO A				
1	GUAINA PROTEZIONE SOLETTA TETTO	SUPERGUM-IT[217564]	SCHEDA TECNICA		
2	GUAINA PREFORATA	PERFOBASE-IT	SCHEDA TECNICA		
3	GUAINA	HELASTOPLAY-IT	SCHEDA TECNICA		
4	PRIMER BITUMINOSO	INDEVER_SP-IT	SCHEDA TECNICA		
5	GUAINA	SUPERGUM-IT[217564]	SCHEDA TECNICA		
6	BARRIERA AL VAPORE	TECTENE_BV_STRIP_EP-IT	SCHEDA TECNICA		
7	GUAINA ARDESIATA	MINERAL_REFLEX_WHITE-IT	SCHEDA TECNICA		
8	PRIMER BITUMINOSO	ECOVER-IT	SCHEDA TECNICA		
9	DICHIARAZIONE CORRETTA POSA IMPERMEABILIZZAZIONE				
10	MASSETTO TERMOISOLANTE	GMIX Massetto Ecoisolante	SCHEDA TECNICA		
	LINEA VITA				
1	PROGETTO POSIZIONAMENTO				
2	DISPOSITIVO AGGANCIO		SCHEDA TECNICA DEL FABBRICANTE		
3	BARRA DI ANCORAGGIO IN ACCIAIO		SCHEDA TECNICA DEL FABBRICANTE		
	ELEMENTO INTERMEDIO PASSANTE		SCHEDA TECNICA DEL FABBRICANTE		
4	ELEMENTO INTERMEDIO BLOCCA MOSCHETTONE		SCHEDA TECNICA DEL FABBRICANTE		
5	PALO BASE PIANA		SCHEDA TECNICA DEL FABBRICANTE		
6	CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI PRODOTTO UNI EN 795 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ED UTILIZZO ISTRUZIONE/MANUALE D'USO DELL'IMPIANTO PROGETTATO CON INDICAZIONE DEI DPI NECESSARI ISTRUZIONI PER LE REVISIONI PERIODICHE DEI PRODOTTI		A CURA DEL PRODUTTORE		

7	DICHIARAZIONE DI	
	CONFORMITA'	
	DELL'ESECUTORE	

	ANALISI MAT	ERIALI DEMOLITI E FORMUL	ARI
1	ANALISI MATERIALI		
2	FORMULARI		
	LAI	MPADE DI EMERGENZA	
1	LAMPADA DI EMERGENZA	BEGHELLI LAMPADA LED	SCHEDA TECNICA DEL FABBRICANTE
2	DICHIARAZIONE CORRETTA POSA		



## SUPERGUM POLIESTERE

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTI BITUME DISTILLATO POLIMERO PLASTOMERICHE, A BASE DI BITUME DISTILLATO E PLASTOMERI

#### CONFERISCE CREDITI LEED



#### **Descrizione**

Le membrane **SUPERGUM** sono costituite da bitume distillato e selezionato per l'uso industriale additivato con polimeri plastomerici poliolefinici tali da ottenere una lega ad "inversione di fase" la cui fase continua è formata da polimero nel quale è disperso il bitume, dove le caratteristiche sono determinate dalla matrice polimerica e non dal bitume anche se questo ne costituisce l'ingrediente maggioritario.

Le prestazioni del bitume vengono pertanto incrementate e risulta migliorata la durabilità e la resistenza alle alte e basse temperature mantenendo inalterate le già ottime qualità di adesività e di impermeabilità del bitume.

SUPERGUM POLIESTERE è armata con un composito in "tessuto non tessuto" di poliestere imputrescibile stabilizzato con fibra di vetro, di elevata resistenza meccanica ed elasticità e dotato di una ottima stabilità dimensionale a caldo che riduce i problemi di sciabolatura dei teli e di ritiro delle giunzioni di testa, perché è da 2 a 3 volte più stabile delle normali armature in tessuto non tessuto di poliestere.

Le membrane **SUPERGUM** hanno la faccia superiore rivestita con talco fine serigrafato, omogeneamente distribuito, un trattamento brevettato che consente un agevole svolgimento delle spire dei rotoli unito ad una sicura e veloce saldatura delle giunzioni.

La faccia inferiore delle membrane è rivestita con Flamina, un film plastico fusibile, ed è goffrata sia per ottenere la pretensione e quindi l'ottimale retrazione del film, che per offrire alla fiamma una maggior superficie e quindi una posa più sicura e più veloce.

Quando la membrana è applicata a secco o per punti, la goffratura funge da diffusore di vapore.

#### Campi d'impiego

Le durevoli caratteristiche di resistenza meccanica e di elasticità e la stabilità sia ad alta che bassa temperatura della membrana SUPERGUM POLIESTERE consentono di impiegarla in climi non freddi come sottostrato in accoppiamento con altre membrane bitume distillato polimero, sia per lavori nuovi che per rifacimenti in edilizia:

- Su tutte le pendenze, sia in piano che in verticale e su superfici curve.
- Su piani di posa di diversa natura: piani di posa cementizi gettati in opera o prefabbricati, su coperture in legno, sui più diffusi isolanti termici usati in edilizia.



EN 13707 - MEMBRANE BITUMINOSE ARMATE PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE

- Sottostrato o strato intermedio in sistemi multistrato senza protezione pesante superficiale permanente
- SUPERGUM POLIESTERE

EN 13969 - MEMBRANE BITUMINOSE DESTINATE AD IMPEDIRE LA RISALITA DELL'UMIDITÀ DAL SUOLO

- Membrane per fondazioni
- SUPERGUM POLIESTERE





			CARATTERISTICHE TECNICHE
	Normativa	т	SUPERGUM POLIESTERE
Armatura			Tessuto non tessuto di poliestere composito stabilizzato con fibra di vetro
Spessore	EN 1849-1	±10%	4 mm
Dimensioni rotoli	EN 1848-1	-1%	1×10 m
Impermeabilità  • dopo invecchiamento	EN 1928 - B EN 1926-1928	2	60 kPa 60 kPa
Resistenza a trazione delle giunzioni	EN 12317-1	-20%	350/250 N/50mm
Forza a trazione massima L/T	EN 12311-1	-20%	350/250 N/50 mm
Allungamento a trazione L/T	EN 12311-1	-15% V.A.	35/40%
Resistenza al punzonamento dinamico	EN 12691 - A		700 mm
Resistenza al punzonamento statico	EN 12730 - A		10 kg
Resistenza alla lacerazione con il chiodo L/T	EN 12310-1	-30%	140/140 N
Flessibilità a freddo	EN 1109	s	0°C
Resistenza allo scorrimento ad elevata temperature	EN 1110	2	110°C
Euroclasse di reazione al fuoco	EN 13501-1		E
Comportamento al fuoco esterno	EN 13501-5		Froof
Caratteristiche termiche		Ji	
Conduttività termica			0.2 W/mK
Capacità termica			5.20 KJ/K

Conforme EN 13707 come fattore di resistenza al passaggio del vapore per le membrane bitume distillato polimero armate, ove non dichiarato, può essere assunto il valore  $\mu$  = 20 000.





GOFFRATURA. La goffratura sulla superficie inferiore della membrana rivestita on film Flamina permette una posa cicura o veloce; diventando liscia, cotto l'effetto della fiamma, segnala la giusta fusione e consente una retrazione più rapida del film. La goffratura permette anche una buona diffusione del vapore; nella posa in semindipendenza e in indipendenza, nei punti dove resta intatta, evita bolle e rigonfiamenti.



TALCATURA. La talcatura della faccia superiore viene eseguita con un procedi-mente che distribuisce uniformemente un talco finicalmo con un disegne parti-colare che evita accumuli e zone scoperte. Questo nuovo sistema permette un rapido svolgimento del trotio ed una superificie di gradevole aspetto che consen-te una sfiammatura più veloce rispetto alle atre finiture minerali più grossolane.

PER UN CORRETTO USO DEI NOSTRI PRODOTTI CONSULTARE I CAPITOLATI TECNICI INDEX • PER ULTERIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI CONSULTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO •



A SIKA COMPANY

INDEX Construction Systems and Products S.p.A. Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D'Azzano (VR) - T. +39 045 8546201 - Fax +39 045 518390

www.indexspa.it					
Informazioni Tecniche Commerciali	tecom@indexspa.it				
Amministrazione e Segreteria	index@indexspa.it				
Index Export Dept	index export@indexsna i				












### PERFOBASE/V

FELTRO DI VETRO FORATO IMPREGNATO
CON MISCELA BITUME POLIMERO ELASTOPLASTOMERICA
PER LA POSA IN SEMINDIPENDENZA DEI MANTI IMPERMEABILI

#### CONFERISCE CREDITI LEED






#### COME EVITARE LA FORMAZIONE DI BOLLE DEL MANTO IMPERMEABILE E ATTUTIRE I MOVIMENTI DEL PIANO DI POSA

I manti impermeabili delle coperture edilizie completamente incollati al piano di posa (sistema aderente) sono soggetti all'affaticamento causato dalle fessurazioni dei supporti cementizi monolitici o dai movimenti ciclici delle linee di accostamento dei supporti costituiti da elementi frazionati. Inoltre, il vapore, proveniente dall'interno accumulandosi nelle zone del manto non completamente aderenti sotto l'azione del calore del sole, può provocare la formazione di grosse bolle. Per contro non sempre è possibile applicare il manto impermeabile completamente a secco, (sistema indipendente) in quanto, per evitarne il sollevamento causato dal vento, è necessario zavorrarlo con ghiaia o pavimentazioni di peso non compatibile con molte strutture leggere. In molti casi l'incollaggio per punti del manto impermeabile (sistema di posa semindipendente) risolve i problemi di ripartizione delle sollecitazioni e diffusione del vapore, pur garantendo una sufficiente adesione per zone non particolarmente ventose. Per ottenere il risultato voluto è essenziale che la distribuzione delle zone di incollaggio sia omogenea e ciò è difficilmente raggiungibile operando manualmente con la fiamma sulle membrane bitume-polimero.

#### **Descrizione**



PERFOBASE/V studiato e prodotto dalla IN-DEX garantisce una omogenea distribuzione delle zone di incollaggio pur operando a fiamma e indipendentemente dall'abilità dell'operatore. PERFOBASE/V è costituito da un feltro di vetro rinforzato forato rivestito da una miscela bitume polimero compatibile con le membrane a base di bitume-APP e bitume SBS, entrambe le facce del foglio sono protette dal film termofusibile Flamina. I fori di 4 cm di diametro in numero di 119 per m² sono regolarmente distribuiti sulla superficie del foglio.

#### Campi d'impiego

PERFOBASE/V è usato per il collegamento in semindipendenza delle membrane applicate a fiamma. Va usato come primo strato di collegamento per evitare la formazione di bolle del manto impermeabile applicato su cls. che dovrà rimanere a vista. Agisce da diffusore del vapore se è usato come strato di collegamento di una barriera al vapore da applicare su piano di posa cementizio posto a copertura di ambienti di elevata umidità relativa.

Lo stesso nei rifacimenti quando è usato per collegare un nuovo manto che rimarrà a vista, ad un vecchio manto bituminoso che ha intrappolata dell'umidità.

#### Vantaggi

- Consente una distribuzione omogenea delle zone di adesione nella posa in semindipendenza.
- Il manto sovrastante resiste meglio al vento ed è più stabile alle variazioni di temperatura.

La scelta del collegamento in semindipendenza presuppone una attenta valutazione della ventosità del luogo da parte del progettista della conertura





CARATTERISTICHE TECNICHE					
	Normativa	Т	PERFOBASE/V		
Armatura			Velo vetro		
Peso	EN 1849-1	±10%	0.8 kg/m²		
Dimensioni rotoli	EN 1848-1	2	1×30 m		
Numero di fori/m2			119		
Diametro dei fori			40 mm		
Grado di perforazione			15%		

#### **VOCE DI CAPITOLATO**

Feltro di vetro bitumato forato da 800 g/m² con un grado di perforazione del 15% ca, tipo PERFOBASE.

# **COMPOSIZIONE DELLA MEMBRANA** PERFOBASE/V

#### **FINITURE PRODOTTO**



FLAMINA. Film plastico protettivo che evita l'incollaggio delle spire nel rotolo e che, retraendeci cette l'azione della fiamma al momento della peca, segnala il punto di tusione ottimale per l'incollaggio della membrana al supporto e sui sormonti e funge, ove non riscaldato, da strato di scorrimento.

• È POSSIBILE CONSULTARE ED EFFETTUARE IL DOWNLOAD DELLE VOCI DI CAPITOLATO SUL SITO www.indexspa.it NELLE RELATIVE SCHEDE PRODOTTO •

PER UN CORRETTO USO DEI NOSTRI PRODOTTI CONSULTARE I CAPITOLATI TECNICI INDEX • PER ULTERIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI CONSULTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO



A SIKA COMPANY

INDEX Construction Systems and Products S.p.A. Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D'Azzano (VR) - T. +39 045 8546201 - Fax +39 045 518390











1/202018



# HELASTOPLAY POLIESTERE

MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI BITUME DISTILLATO POLIMERO ELASTOMERICHE, A BASE DI GOMMA TERMOPLASTICA STIRÓLO-BUTADIENE RADIALE

#### CONFERISCE CREDITI *LEED*



#### **Descrizione**

HELASTOPLAY POLIESTERE e MINERAL HELASTOPLAY POLIESTERE sono membrane impermeabilizzanti bitume polimero elastomeriche con armatura composita imputrescibile in "tessuto non tessuto" di poliestere stabilizzato con fibra di vetro che garantisce una stabilità dimensionale a caldo da due a tre volte più elevata di quella raggiungibile da un normale "tessuto non tessuto" di poliestere.

La mescola delle membrane HELASTOPLAY POLIESTERE è a base di bitume distillato e SBS a "inversione di fase", dove l'elastomero costituisce la matrice polimerica continua e il bitume la fase dispersa. La gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolobutadiene radiale (SBS), consente un allungamento a rottura del 1500% e una flessibilità alle basse temperature fino a -20°C.

HELASTOPLAY POLIESTERE è prodotta con la faccia superiore ed inferiore rivestita da un film termofusibile Flamina, di elevata retrazione al contatto della fiamma durante l'applicazione. MINERAL HELASTOPLAY POLIESTERE è prodotta con la faccia superiore autoprotetta da scagliette di ardesia e con la faccia inferiore rivestita da un film antiadesivo, denominato FLAMINA, di elevata retrazione al contatto della fiamma durante l'applicazione.

Le membrane MINERAL sono dotate di una striscia laterale di sovrapposizione nera, priva di ardesia.

#### Campi d'impiego

Le membrane HELASTOPLAY possiedono una grande versatilità di impiego e data l'elevata elasticità che mantengono anche a bassa temperatura, possono essere impiegate anche in climi freddi dove le membrane bituminose tradizionali non possono essere applicate.

I sistemi di impermeabilizzazione a base di membrane HELASTOPLAY si applicano su coperture sia piane che inclinate, con elementi portanti cementizi o in laterocemento sia monolitici che prefabbricati, su lamiera grecata, su strutture in legno e su tensostrutture. Possono essere impiegati sia su elementi termoisolanti che nel tetto alla rovescia.

Possono essere lasciati a vista (tipo: MINE-RAL) o sotto protezione pesante in ghiaia o/ pavimentazioni.

Le membrane **HELASTOPLAY** possono essere usate nei rifacimenti poiché sono compatibili con i vecchi manti bituminosi.



#### **EN 13707 - MEMBRANE BITUMINOSE** ARMATE PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE

- Sottostrato o strato intermedio in sistemi multistrato senza protezione pesante superficiale permanente
- HELASTOPLAY POLIESTERE
- · Strato superiore in sistemi multistrato senza protezione pesante superficiale permanente
- MINERAL HELASTOPLAY POLIESTERE
- Sotto protezione pesante in sistemi multistrato
- HELASTOPLAY POLIESTERE

**EN 13969 - MEMBRANE BITUMINOSE DESTINATE AD IMPEDIRE LA RISALITA DELL'UMIDITÀ DAL SUOLO** 

- Membrane per fondazioni
- HELASTOPLAY POLIESTERE





	20 3	_		TOPLAY	MIN	ERAL HELASTOPL	AY	
	Normativa	Т	POLIESTERE			POLIESTERE		
Armatura				di poliestere composito con fibra di vetro		on tessuto di poliestere c abilizzato con fibra di vetr		
Spessore	EN 1849-1	±0,2	3 mm	4 mm	=	-	-	
Massa areica MINERAL	EN 1849-1	±10%	-	-	3.5 kg/m <sup>2</sup>	4.0 kg/m <sup>2</sup>	4.5 kg/m <sup>2</sup>	
Dimensioni rotoli	EN 1848-1	-1%	1×10 m	1×10 m	1×10 m	1×10 m	1×10 m	
mpermeabilità	EN 1928 - B EN 1926-1928	5	60	) kPa		60 kPa		
Resistenza a trazione delle giunzioni L/T	EN 12317-1	-20%	350/250	) N/50 mm		-		
Forza a trazione massima L/T	EN 12311-1	-20%	400/300	) N/50 mm		400/300 N/50 mm		
Allungamento a razione L/T	EN 12311-1	-15% V.A.	35	/40%		35/40%		
Resistenza al punzonamento dinamico	EN 12691 - A		1 25	50 mm		팔		
Resistenza al punzonamento statico	EN 12730 - A		1	0 kg		-		
Resistenza alla lacerazione con il chiodo L/T	EN 12310-1	-30%	140	/140 N		140/140 N		
Stabilità dimensionale L/T	EN 1107-1	\$	-0.25	/+0.10%		-0.25/+0.10%		
Flessibilità a freddo dopo invecchiamento	EN 1109	s		20°C NPD		-20°C -15°C		
Res. allo scorrimento ad alte temperature	EN 1110 EN 1296-1110	≥ -10°C	100°C			100°C		
Euroclasse di reazione al fuoco	EN 13501-1			E		E		
Comportamento al fuoco esterno	EN 13501-5		F	roof		Froof		
Caratteristiche termiche					•			
Conduttività termica			0.2 W/mK	0.2 W/mK	0.2 W/mK	0.2 W/mK	0.2 W/mK	

Conforme EN 13707 come fattore di resistenza al passaggio del vapore per le membrane bitume distillato polimero armate, ove non dichiarato, può essere assunto il valore  $\mu = 20\,000$ .

6.50 KJ/K

4.20 KJ/K

4.80 KJ/K

5.40 KJ/K

5.20 KJ/K









INDEX Construction Systems and Products S.p.A. Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D'Azzano (VR) - T. +39 045 8546201 - Fax +39 045 518390











Capacità termica



# INDEVER SP




### PRIMER BITUMINOSO A BASE DI SOLVENTI PURI

A RAPIDA ESSICCAZIONE



#### AUMENTARE L'ADESIONE DELLE MEMBRANE BITUME-POLIMERO E BLOCCARE LA POLVEROSITÀ DEI SUPPORTI IN CALCESTRUZZO



Bloccare la polverosità e la porosità del calcestruzzo con un prodotto molto penetrante e di rapida essiccazione per permettere una veloce stesura e impermeabilizzazione della superficie con membrane bitume polimero.

#### Descrizione

È un primer bituminoso a rapida essiccazione costituito da una miscela di bitumi e solventi. Il prodotto è composto solo da solventi puri ed è esente da Toluene e non contiene solventi di recupero dalla composizione incerta e variabile che possono avere forti effetti tossici o addirittura narcotici in fase applicativa.

Possiede un buon potere penetrante, aggrappante e consolidante verso tutte le superfici di calcestruzzo asciutte rendendole idonee ad una corretta adesione delle membrane bitume polimero incollate a fiamma o con adesivi bituminosi a freddo. Dopo essiccazione forma un film molto tenace e ancorante su ogni tipo di supporto, senza presentare nessuna appicicosità superficiale.

La pellicola bituminosa formata da INDEVER SP protegge le superfici dall'acqua anche salmastra e dall'attacco chimico degli acidi, delle basi, delle soluzioni saline e degli acidi umici, per questo le pitture bituminose vengono tradizionalmente applicate come le più economiche pitture protettive antiruggine. Sulle superfici metalliche forma un film molto tenace e ancorante, senza presentare nessuna appicicosità superficiale.

#### Campi d'impiego

INDEVER SP satura le porosità dei piani di posa cementizi e ne fissa la polverosità superficiale in tal modo consente di ottenere l'adesione ottimale sia delle membrane bitume polimero incollate a fiamma sia dei bitumi fusi sia delle colle e delle guaine liquide bituminose al solvente. Funge da primer anche per le superfici metalliche ed in legno favorendo l'aderenza permanente dei rivestimenti bituminosi applicati a caldo o a freddo.

INDEVER SP è impiegato come primer, prima della stesura delle membrane bitume polimero, per preparare le superfici di coperture piane e inclinate in cls o in metallo come pure di viadotti e ponti di calcestruzzo asciutto. Sulle superfici in calcestruzzo leggermente umide si preferirà la versione INDEVER WET CONCRETE.

Viene usato come promotore d'adesione e primer fissativo consolidante di superfici in cemento, legno e metallo. Inoltre viene utilizzato come protettivo antiruggine comunemente conosciuto come "catramina" e tradizionalmente usato per proteggere le opere metalliche anche interrate dopo averle opportunamente sgrassate con diluente nitro e smerigliate nel caso siano già arrugginite; per questo viene utilizzato per la protezione di tubazioni, grondaie, pali, cisterne metalliche sia esposte che interrate.

#### Vantaggi

- Maggiore ecosostenibilità e riduzione di sostanze dannose per l'ambiente e per l'uomo.
- Assenza di sostanze oleose superficiali residue.
- Bassissimo consumo per una maggior copertura.
- Rapidità di lavorazione: l'estrema velocità di essiccazione unita all'assenza di appicicosità del film secco consente di risparmiare sui tempi di lavorazione.
- Forte potere impregnante.
- Buona adesione sui supporti cementizi, in laterizio e metallici.
- Ottima resistenza all'acqua anche salmastra e alle soluzioni saline.
- Buona resistenza chimica agli acidi, alle basi e agli acidi umici.

#### Modalità d'impiego

#### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

È importante per la buona riuscita del lavoro che le superfici di calcestruzzo da trattare siano il più possibile asciutte e inoltre devono essere perfettamente pulite, senza parti in distacco, ed esenti da olii, grassi e polveri sfarinanti.

#### • APPLICAZIONE

INDEVER SP è pronto all'uso; per l'impiego non necessita di alcuna diluizione. È applicabile a spazzolone, pennello, rullo o spruzzo (1). La quantità di prodotto da utilizzare è in funzione della porosità del supporto e del grado di finitura del film essicato che si vuole ottenere.

Per l'applicazione come protettivo si consigliano due mani; la seconda andrà applicata quando la prima sarà asciutta.

Le membrane bitume polimero vanno applicate sulla superficie di calcestruzzo, trattate con

(continua)









CARATTERISTICHE TECNICHE					
	Normativa	INDEVER SP			
Aspetto		Liquido			
Colore		Nero			
Massa volumica	EN 2811-1	1.00 ± 0.10 kg/L			
Residuo secco a 130°C	UNI EN ISO 3251	55 ± 5%			
Viscosità Coppa DIN/4	UNI EN ISO 2431	25 ÷ 35 secondi			
Punto di infiammabilità a vaso chiuso		+23°C			
Stoccaggio nelle confezioni originali in luogo asciutto		24 mesi			
Caratteristiche del prodotto e di lavorabilità					
Temperatura di applicazione		+5°C ÷ +35°C			
Spessore minimo di applicazione		80 ÷ 120 μ			
Tempo di attesa - per l'essiccazione fuori polvere (*)		5 ÷ 15 minuti			
Tempo di attesa - per l'essiccazione fuori tatto (*)		15 ÷ 45 minuti			
Applicazione		manuale o spruzzo			

Condizioni di prova: temperatura 23±2°C, 50±5% U.R. e velocità aria nell'area di prova <0,2 m/s. I dati espressi possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, umidità, ventilazione, assorbenza del fondo.

(\*) I tempi espressi sono più lunghi o più corti con la diminuzione o l'aumento della temperatura.

#### (segue)

primer (2), dopo un tempo di attesa che varia da un tempo minimo di due ore (in situazione di esposizione ottimale al sole), fino ad otto ore in condizioni più critiche per permettere l'essiccazione totale del film di pittura bituminosa. L'eventuale seconda mano va applicata solo sulla prima mano perfettamente asciutta.

#### CONSUMO

Il consumo stimato è di circa 150-300 g/m² in funzione della porosità del supporto. Su di una superficie metallica il consumo stimato è di 150 g/m² per mano.

#### AVVERTENZE

- · Per la posa su coperture di edifici abitativi, è obbligatorio sostituire INDEVER SP con il primer a base acqua ECOVER.
- · Per la posa su superfici in calcestruzzo leggermente umide si preferirà la versione INDE-VER WET CONCRETE.
- · Non usare all'interno di abitazioni o in ambienti non aerati.
- · Non applicare su superfici bagnate.
- Non miscelare con cemento o con acqua.
- · In presenza di fondo nelle latte si consiglia di mescolare, prima del suo impiego, fino alla totale omogeneizzazione.
- Non utilizzare per impermeabilizzare vasche, scantinati o canali soggetti a forti controspinte d'acqua o acqua in pressione.
- Non utilizzare per impermeabilizzare superfici o contenitori di liquidi sostanze commestibili, per l'acqua potabile o che possano venire a contatto con solventi o olii minerali.
- · Il film secco non resiste ai carburanti, agli oli

minerali e ai solventi

- · Dopo l'uso per la pulizia degli attrezzi utilizzare gasolio o altri diluenti comuni (sintetico, acqua ragia, nitro). Si consiglia di immergere gli attrezzi stessi nel diluente anche durante l'uso per impedire che i residui di prodotto si secchino rendendoli inutilizzabili.
- · Conservare negli imballi originali ad una temperatura non inferiore a +5°C, Iontano da fonti di calore e da fiamme libere. Richiudere i contenitori dopo l'uso.

#### **Packaging**

Latte da 20 litri. Latte da 5 litri.

#### • È POSSIBILE CONSULTARE ED EFFETTUARE IL DOWNLOAD DELLE VOCI DI CAPITOLATO SUL SITO www.indexspa.it NELLE RELATIVE SCHEDE PRODOTTO •

PER UN CORRETTO USO DEI NOSTRI PRODOTTI CONSULTARE I CAPITOLATI TECNICI INDE VI O LISI PARTICOI ARI CONSULTARE IL NO



INDEX Construction Systems and Products S.p.A. Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D'Azzano (VR) - T. +39 045 8546201 - Fax +39 045 518390













## SUPERGUM POLIESTERE

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTI BITUME DISTILLATO POLIMERO PLASTOMERICHE, A BASE DI BITUME DISTILLATO E PLASTOMERI

#### CONFERISCE CREDITI LEED



#### **Descrizione**

Le membrane **SUPERGUM** sono costituite da bitume distillato e selezionato per l'uso industriale additivato con polimeri plastomerici poliolefinici tali da ottenere una lega ad "inversione di fase" la cui fase continua è formata da polimero nel quale è disperso il bitume, dove le caratteristiche sono determinate dalla matrice polimerica e non dal bitume anche se questo ne costituisce l'ingrediente maggioritario.

Le prestazioni del bitume vengono pertanto incrementate e risulta migliorata la durabilità e la resistenza alle alte e basse temperature mantenendo inalterate le già ottime qualità di adesività e di impermeabilità del bitume.

SUPERGUM POLIESTERE è armata con un composito in "tessuto non tessuto" di poliestere imputrescibile stabilizzato con fibra di vetro, di elevata resistenza meccanica ed elasticità e dotato di una ottima stabilità dimensionale a caldo che riduce i problemi di sciabolatura dei teli e di ritiro delle giunzioni di testa, perché è da 2 a 3 volte più stabile delle normali armature in tessuto non tessuto di poliestere.

Le membrane **SUPERGUM** hanno la faccia superiore rivestita con talco fine serigrafato, omogeneamente distribuito, un trattamento brevettato che consente un agevole svolgimento delle spire dei rotoli unito ad una sicura e veloce saldatura delle giunzioni.

La faccia inferiore delle membrane è rivestita con Flamina, un film plastico fusibile, ed è goffrata sia per ottenere la pretensione e quindi l'ottimale retrazione del film, che per offrire alla fiamma una maggior superficie e quindi una posa più sicura e più veloce.

Quando la membrana è applicata a secco o per punti, la goffratura funge da diffusore di vapore.

#### Campi d'impiego

Le durevoli caratteristiche di resistenza meccanica e di elasticità e la stabilità sia ad alta che bassa temperatura della membrana SUPERGUM POLIESTERE consentono di impiegarla in climi non freddi come sottostrato in accoppiamento con altre membrane bitume distillato polimero, sia per lavori nuovi che per rifacimenti in edilizia:

- Su tutte le pendenze, sia in piano che in verticale e su superfici curve.
- Su piani di posa di diversa natura: piani di posa cementizi gettati in opera o prefabbricati, su coperture in legno, sui più diffusi isolanti termici usati in edilizia.



EN 13707 - MEMBRANE BITUMINOSE ARMATE PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE

- Sottostrato o strato intermedio in sistemi multistrato senza protezione pesante superficiale permanente
- SUPERGUM POLIESTERE

EN 13969 - MEMBRANE BITUMINOSE DESTINATE AD IMPEDIRE LA RISALITA DELL'UMIDITÀ DAL SUOLO

- Membrane per fondazioni
- SUPERGUM POLIESTERE





			CARATTERISTICHE TECNICHE
	Normativa	т	SUPERGUM POLIESTERE
Armatura			Tessuto non tessuto di poliestere composito stabilizzato con fibra di vetro
Spessore	EN 1849-1	±10%	4 mm
Dimensioni rotoli	EN 1848-1	-1%	1×10 m
Impermeabilità  • dopo invecchiamento	EN 1928 - B EN 1926-1928	2	60 kPa 60 kPa
Resistenza a trazione delle giunzioni	EN 12317-1	-20%	350/250 N/50mm
Forza a trazione massima L/T	EN 12311-1	-20%	350/250 N/50 mm
Allungamento a trazione L/T	EN 12311-1	-15% V.A.	35/40%
Resistenza al punzonamento dinamico	EN 12691 - A		700 mm
Resistenza al punzonamento statico	EN 12730 - A		10 kg
Resistenza alla lacerazione con il chiodo L/T	EN 12310-1	-30%	140/140 N
Flessibilità a freddo	EN 1109	s	0°C
Resistenza allo scorrimento ad elevata temperature	EN 1110	2	110°C
Euroclasse di reazione al fuoco	EN 13501-1		E
Comportamento al fuoco esterno	EN 13501-5		Froof
Caratteristiche termiche		Ji	
Conduttività termica			0.2 W/mK
Capacità termica			5.20 KJ/K

Conforme EN 13707 come fattore di resistenza al passaggio del vapore per le membrane bitume distillato polimero armate, ove non dichiarato, può essere assunto il valore  $\mu$  = 20 000.





GOFFRATURA. La goffratura sulla superficie inferiore della membrana rivestita on film Flamina permette una posa cicura o veloce; diventando liscia, cotto l'effetto della fiamma, segnala la giusta fusione e consente una retrazione più rapida del film. La goffratura permette anche una buona diffusione del vapore; nella posa in semindipendenza e in indipendenza, nei punti dove resta intatta, evita bolle e rigonfiamenti.



TALCATURA. La talcatura della faccia superiore viene eseguita con un procedi-mente che distribuisce uniformemente un talco finicalmo con un disegne parti-colare che evita accumuli e zone scoperte. Questo nuovo sistema permette un rapido svolgimento del trotio ed una superificie di gradevole aspetto che consen-te una sfiammatura più veloce rispetto alle atre finiture minerali più grossolane.

PER UN CORRETTO USO DEI NOSTRI PRODOTTI CONSULTARE I CAPITOLATI TECNICI INDEX • PER ULTERIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI CONSULTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO •



A SIKA COMPANY

INDEX Construction Systems and Products S.p.A. Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D'Azzano (VR) - T. +39 045 8546201 - Fax +39 045 518390

www.indexspa.it					
Informazioni Tecniche Commerciali	tecom@indexspa.it				
Amministrazione e Segreteria	index@indexspa.it				
Index Export Dept	index export@indexsna i				











# TECTENE BV STRIP EP ALU POLIESTERE TECTENE BV STRIP EP/V TECTENE BV BISTRIP EP/V TECTENE BV BISTRIP EP/V

BARRIERE AL VAPORE TERMOADESIVE IN BITUME DISTILLATO POLIMERO ELASTOPLASTOMERICO MUNITE DI STRISCE ELASTOMERICHE TERMOADESIVE SPALMATE SULLA FACCIA SUPERIORE DELLA MEMBRANA (tipo STRIP), SU ENTRAMBE LE FACCE (tipo BISTRIP) PER L'INCOLLAGGIO DEI PANNELLI ISOLANTI

#### CONFERISCE CREDITI LEED






#### COME INCOLLARE L'ISOLAMENTO TERMICO, POLISTIROLO ESPANSO COMPRESO, SULLA BARRIERA AL VAPORE, EVITANDO L'USO DI BITUME OSSIDATO FUSO, DEI CHIODI O DI MATERIALI PERICOLOSI E NOCIVI

Non sempre è possibile fissare lo strato di isolamento termico con il fissaggio meccanico e il bitume fuso, sia per ragioni pratiche che per motivi di sicurezza, è sempre meno usato. L'incollaggio dei pannelli isolanti in polistirolo espanso su bitume fuso raffreddato è una operazione di difficile esecuzione che spesso causa la fusione del pannello o una adesione insufficiente. L'uso, in alternativa, degli adesivi a freddo, oltre a causare l'emissione di solventi e la produzione di rifiuti dallo smaltimento problematico, implica un lungo tempo di presa ed un incollaggio plastico del pannello, che favorisce l'accorpamento a freddo dei pannelli isolanti verso il centro geometrico della copertura causando ondulazioni e stiramenti del manto in prossimità dei bordi del tetto e dei rilievi.

#### **Soluzione**



TECTENE BV EP è una barriera al vapore che ha la faccia superiore già spalmata di colla, e basta attivarla con il calore di una fiamma per renderla subito adesiva. Rispetto al normale bitume ossidato, la colla resta adesiva più a lungo, anche a temperature prossime allo zero, lasciando il tempo al posatore di applicare il pannello di polistirolo senza però causarne la fusione, ma successivamente, a raffreddamento avvenuto, la colla è già in presa e fissa tenacemente il pannello. TECTENE BV EP è una membrana impermeabilizzante in bitume distillato polimero. a base di bitume distillato selezionato per l'uso industriale con un alto tenore di polimeri elastomerici e plastomerici, tali da ottenere una lega ad "inversione di fase" la cui fase continua è formata dal polimero, nel quale è disperso il bitume, dove le caratteristiche sono determinate dalla natura polimerica e non dal bitume, anche se questo ne

#### Vantaggi

- Anche il polistirolo espanso può essere applicato a fiamma.
- Le strisce termoautoadesive elastomeriche consentono una adesione maggiore.

costituisce l'ingrediente maggioritario. Le prestazioni del bitume, come la durabilità e la resistenza alle alte e basse temperature, vengono pertanto incrementate, mentre rimangono inalterate le già ottime qualità di adesvità, di resistenza all'acqua e di impermeabilità al vapor acqueo del bitume. TECTENE BV STRIP EP/V e TECTENE BV BISTRIP EP/V sono armati con feltro di vetro rinforzato nel senso longitudinale, un materiale imputrescibile che conferisce alla membrana una elevata stabilità dimensionale, mentre le versioni ALU POLIESTERE sono armati con una lamina di alluminio, che costituisce una barriera assoluta al passaggio del vapore, accoppiata a tessuto non tessuto di poliestere composito stabilizzato con fibra di vetro che conferisce dati di elasticità e resistenza alla perforazione.

La faccia inferiore delle membrane **TECTENE BV STRIP** è rivestita con il film plastico termofusibile Flamina

La faccia superiore è spalmata per il 40% ca. della superficie con strisce autotermoadesive, protette da un film termofusibile speciale ad alta retrazione, costituite da uno speciale adesivo bituminoso "hot melt" a base di elastomeri e resine tackificanti, che una volta attivato con il calore ha un tempo di presa sufficientemente lungo da permettere l'incollaggio dei pannelli di polistirolo anche a temperature prossime allo zero. L'adesivo è forte ed elastico ed ancora tenacemente il pannello. Su TECTENE BV EP oltre al polistirolo espanso ed espanso estruso sia in pannelli che in rotoli THERMOBASE, si possono incollare anche i pannelli e i rotoli di poliuretano espanso rivestito con cartonfeltro bitumato, con velo vetro bitumato, con carta alluminata sia sulla carta che sulla faccia alluminata. Una ulteriore ed esclusiva caratteristica della membrana è costituita dalla



DESTINAZIONI D'USO DI MARCATURA "CE" PREVISTE SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA AISPEC-MBP


#### EN 13970 - STRATI BITUMINOSI PER IL CONTROLLO DEL VAPORE

- TECTENE BV STRIP EP ALU POLIESTERE
- TECTENE BV STRIP EP/V
- TECTENE BV BISTRIP EP ALU POLIESTERE
- TECTENE BV BISTRIP EP/V



Lo spessore del sormonto è inferiore a quello delle strisce garantendo la massima stabilità ai pannelli isolanti posati a cavallo del sormonto









zona di sormonto, prodotta con uno spessore ridotto rispetto al resto del foglio, tale che, una volta eseguita la sovrapposizione, lo spessore totale della stessa non supera quello delle strisce adesive, evitando così "l'effetto altalena" dei pannelli isolanti che vi sono posti a cavallo.

Le versioni BISTRIP hanno invece entrambe le facce spalmate con le strisce adesive e nascono per consentire un incollaggio in semindipendenza della barriera al vapore sul piano di posa e data l'elevata adesività delle strisce di colla elastomeriche questo non abbisogna della mano di primer.

#### Campi d'impiego

TECTENE BV STRIP EP viene usato come barriera al vapore quando si intende isolare la copertura con pannelli di polistirolo espanso. Può essere usato anche per incollare l'isolante in rotoli THER-MOBASE PSE o altri isolanti quando non è conveniente usare il bitume fuso o gli adesivi.

Con TECTENE BV STRIP EP, in una sola operazione si posa la barriera al vapore e la colla per lo strato isolante. Non servono caldaie, sacchi di bitume né secchi di colla.

Si evitano odori, fumi e vapori di solventi, non si producono scarti né rifiuti di cantiere.

**TECTENE BV STRIP EP ALU POLIESTERE** viene usato come barriera al vapore di coperture di ambienti particolarmente umidi dove l'umidità relativa a 20°C è superiore all'80%.

TECTENE BV STRIP EP costituisce il primo strato del sistema di impermeabilizzazione denominato "Energy Saving", che consente l'utilizzo economicamente vantaggioso dell'isolante termico in polistirolo espanso con il minor dispendio energetico e a ridotto impatto ambientale.

Il sistema viene impiegato sulle coperture piane ed inclinate, su quest'ultime per pendenze superiori


al 15% l'incollaggio verrà integrato con fissaggi meccanici e/o listelli inseriti nella stratigrafia.

Lo stesso avverrà in zone particolarmente ventose.

Le versioni BISTRIP sono usate quando si opera su supporti umidi come nei rifacimenti di coperture che intrappolano ancora umidità sulle quali si

vuole posare un nuovo isolamento ma non si vuole forare la barriera al vapore con un fissaggio meccanico oppure nei lavori nuovi su coperture di ambienti ad alta produzione di vapore acqueo per consentirne la diffusione.

Se si teme una precipitazione o si deve lasciare per qualche tempo il materiale esposto, è raccomandabile eliminare il film non incollato con una leggerissima sfiammatura. Questo procedimento evita che l'acqua possa insinuarsi fra le strisce adesive e rendere difficili le lavorazioni successive.




#### PARTICOLARI DI POSA



Posa a fiamma della faccia inferiore di TECTENE BY STRIP EP



Posa a fiamma delle sormonte laterali e sormonte di testa in modo da garantire una perfetta sigillatura nei confronti del passaggio del vapore



Sfiammatura della pellicola di protezione




Durante i primi istanti di sfiammatura la superficie diventa inizialmente opaca




Insistendo con la sfiammatura. le strisce termoadesive assumeranno una consistenza semiliquida e lucida: la superficie sarà pronta a ricevere la posa dei pannelli o rotoli di isolante

# Riqualificazione energetica di una vecchia copertura

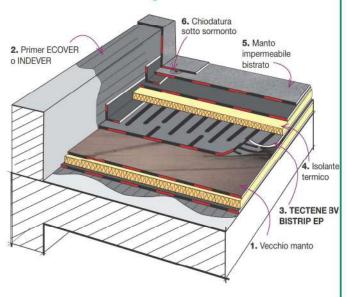

# Barriera al vapore su locali ad alta umidità

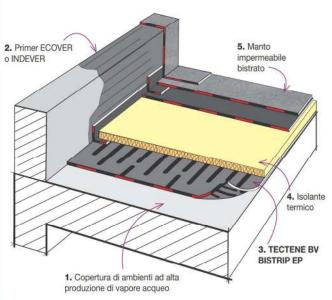


#### PARTICOLARI DI POSA



I pannelli di isolante adagiati sulla superficie appena sfiammata verranno fatti aderire al TECTENE BV STRIP EP mediante pressatura per semplice calpestio dell'operatore (da effettuarsi su tutta la superficie del pannello)

ATTENZIONE





I rotoli di THERMOBASE srotolati sulla superficie appena sfiammata verranno fatti aderire al TECTENE BV STRIP EP mediante pressatura su tutta la superficie del rotolo mediante semplice calpestio dell'operatore (da effettuarsi su tutta la superficie del pannello o rotolo)

DETTAGLIO DELLA MESCOLA
AUTOTERMOADESIVA
DELLE STRISCE DI
TECTENE BV STRIP EP e
TECTENE BV BISTRIP EP



4

			CARATTE	RISTICHE TECNICHE		
	Normativa	т	TECTENE BV STRIP EP/V	TECTENE BV STRIP EP ALU POLIESTERE	TECTENE BV BISTRIP EP/V	TECTENE BV BISTRIP EP ALU POLIESTERE
Armatura			Velo vetro	Tessuto non tessuto di pol. comp. stab. con fibra di vetro e lamina d'allum. (12 µ	Velo vetro	Tessuto non tessuto di pol. comp. stab. con fibra di vetro e lamina d'allum. (12 μ)
Spessore	EN 1849-1	±0,2	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Dimensioni rotoli	EN 1848-1	-1%	1×10 m	1×10 m	1×10 m	1×10 m
Impermeabilità	EN 1928 - B	2	60 kPa	60 kPa	60 kPa	60 kPa
Resistenza al distacco delle giunzioni	EN 12316-1	-20 N	NPD	NPD	NPD	NPD
Forza a trazione massima L/T	EN 12311-1	-20%	300/200 N/50 mm	250/120 N/50 mm	300/200 N/50 mm	250/120 N/50 mm
Allungamento a trazione L/T	EN 12311-1	-15% V.A.	2/2%	15/20%	2/2%	15/20%
Resistenza al punzonamento dinamico	EN 12691 - A		NPD	NPD	NPD	NPD
Resistenza alla lacerazione con il chiodo L/T	EN 12310-1	-30%	70/70 N	100/100 N	70/70 N	100/100 N
Flessibilità a freddo	EN 1109	s	-15°C	-15°C	-15°C	-15°C
Resistenza allo scorrimento ad elevata temperature	EN 1110	2	100°C	100°C	100°C	100°C
Permeabilità al vapore acqueo  dopo invecchiamento	EN 1931 EN 1296-1931	-20% -20%	μ = 100 000 NPD	μ = 1 500 000 NPD	μ = 100 000 NPD	μ = 1 500 000 NPD
Euroclasse di reazione al fuoco	EN 13501-1		E	E	E	E
Comportamento al fuoco esterno	EN 13501-5		Froof	F roof	F roof	F roof
Caratteristiche specifiche di re	sistenza al solleva	mento del	vento (EN 16002)			
con polistirene espanso ≥100	EN 16002		$\Delta_{adm} = 4 250 \text{ N/m}^2$	Δ <sub>adm</sub> = 4 250 N/m <sup>2</sup>	$\Delta_{adm} = 4 250 \text{ N/m}^2$	Δ <sub>adm</sub> = 4 250 N/m <sup>2</sup>
con polistirene espanso estruso	EN 16002		$\Lambda_{adm} = 4.250 \text{ N/m}^2$	Λ <sub>adm</sub> = 4 250 N/m <sup>2</sup>	$\Lambda_{adm} = 4.250 \text{ N/m}^2$	$\Lambda_{adm} = 4.250 \text{ N/m}^2$
con poliuretano	EN 16002		$\Delta_{adm} = 10\ 000\ N/m^2$	Δ <sub>acm</sub> = 10 000 N/m <sup>2</sup>	$\Delta_{adm}$ = 10 000 N/m <sup>2</sup>	$\Delta_{adm} = 10\ 000\ N/m^2$
Caratteristiche termiche						
Conduttività termica			0.2 W/mK	0.2 W/mK	0.2 W/mK	0.2 W/mK
Capacità termica			3.90 KJ/K	3.90 KJ/K	3.90 KJ/K	3.90 KJ/K





• PER UN CORRETTO USO DEI NOSTRI PRODOTTI CONSULTARE I CAPITOLATI TECNICI INDEX • PER ULTERIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI CONSULTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO •



	www.in	dexspa.it
	Informazioni Tecniche Commerciali	tecom@indexspa.it
A SIKA COMPANY	Amministrazione e Segreteria	index@indexspa.it
INDEX Construction Systems and Products S.p.A. Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D'Azzano (VR) - T. +39 045 8546201 - Fax +39 045 518390	Index Export Dept.	index.export@indexspa.it












G.C./dig. 500




# MINERAL REFLEX WHITE FLEXTER TESTUDO SPUNBOND POLIESTERE MINERAL REFLEX WHITE FLEXTER TESTUDO FR TRIARMATO

MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI BITUME DISTILLATO POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE A BASE DI BITUME DISTILLATO, PLASTOMERI ED ELASTOMERI, CON AUTOPROTEZIONE MINERALE SPECIALE BIANCA AD ALTA SATURAZIONE E LUMINOSITÀ PER IL RISPARMIO ENERGETICO E LA RIDUZIONE DELLE "ISOLE DI CALORE URBANE" AD ALTA RIFLETTANZA SOLARE UNITA AD UNA ELEVATISSIMA EMISSIVITÀ TERMICA

#### CONFERISCE CREDITI *LEED*



#### **PROBLEMA**



#### COME MIGLIORARE L'ISOLAMENTO TERMICO ED INCREMENTARE IL RENDIMENTO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DELLE COPERTURE

Più del 90% dei tetti sono di colore scuro e la superficie della copertura sotto l'irradiazione solare raggiunge temperature intorno gli 80°C con effetti negativi anche sui pannelli fotovoltaici che vi sono installati sopra, il cui rendimento diminuisce con l'aumento della temperatura. L'incremento della riflettanza solare della superficie del tetto con specifici trattamenti superficiali del manto impermeabile consente il duplice beneficio di ridurne la temperatura, e quindi di risparmiare energia per il condizionamento estivo dei locali sottostanti, nel contempo l'aumento dell'albedo, la frazione della radiazione incidente che viene riflessa dalla superficie del tetto, produce il beneficio di aumentare il rendimento dell'impianto fotovoltaico anche nelle ore di minor luce. La scelta del

colore dello strato superiore del manto impermeabile, che si consiglia sia del tipo con autoprotezione (MINERAL) con granuli ceramizzati, la più durevole e che non soffre delle problematiche delle membrane con autoprotezione metallica, è la prima strategia applicabile per aumentare la riflessione della radiazione solare e produce il beneficio di ridurre la temperatura dei locali sottostanti la copertura, nella tabella a lato sono riportate le temperature registrate nel Nord Italia nel mese di luglio 2007 sotto superfici bituminose diversamente protette.

TEMPERATURA MASSIMA					
Membrana bituminosa nera	78°C				
Membrana ardesiata grigia	74°C				
Membrana ardesiata bianca	70°C				

Membrana verniciata alluminio Membrana bituminosa: MINERAL REFLEX WHITE

67°C 52°C

#### 2 SOLUZIONE

MINERAL REFLEX WHITE FLEXTER TE-STUDO fa parte della famiglia di membrane FLEXTER TESTUDO, le membrane impermeabilizzanti bitume distillato polimero INDEX, la cui qualità è certificata e costantemente monitorata dall'Istituto ITC, membro del C.N.R. (ex ICITE), per le quali ha rilasciato l'Agrement Tecnico - DVT.

Le membrane FLEXTER TESTUDO sono le prime ad essere certificate conforme le più recenti Direttive UEAtc del dicembre 2001 (UEAtc Technical Guide for the assessment of Roof Waterproofing System, made of Reinforced APP or SBS Polymer Modified Bitumen Sheets)

i cui metodi di prova sono stati aggiornati con le nuove norme europee EN. Le caratteristiche delle membrane sono ampiamente superiori ai limiti previsti dalla vecchia e dalla nuova normativa.

Già FLEXTER TESTUDO fu la prima membrana Direttive Comuni europee dell'UEAtc, edite per la prima volta nel 1984, e ha ottenuto numerosi riconoscimenti da altri prestigiosi istituti europei come il CSTB in Francia, l'UBAtc in Belgio e il BBA in Gran Bretagna. Ora, dopo più di 20 anni di produzione controllata e periodicamente certificata con rinnovi triennali, la gamma produttiva viene ulteriormente migliorata con l'introduzione delle nuova mineralizzazione su-(continua)

DESTINAZIONI D'USO DI MARCATURA "CE" PREVISTE SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA AISPEC-MBP

**EN 13707 - MEMBRANE BITUMINOSE** ARMATE PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE

- Strato superiore in sistemi multistrato senza protezione pesante superficiale permanente
- MIN. REFLEX WHITE FLEXTER TEST. SP. POL.
- MIN. REFLEX WHITE FLEXTER TEST. FR TRIARMATO
- · Monostrato a vista
- MIN. REFLEX WHITE FLEXTER TEST, SP. POL. 4 mm
- MIN. REFLEX WHITE FLEXTER TEST. FR TRIARMATO

#### CERTIFICAZIONE



#### Documento di **Valutazione** Tecnica all'impiego DVT-0010

per MINERAL REFLEX WHITE FLEXTER TESTUDO SPUNBOND POLIESTERE

warringtonfiregent



#### AGREMENT "UBAtc"

Union belge pour l'Agrément technique dans la construction



Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Civile Università di

Modena e Reggio Emilia



#### **CSTB AGREMENT**

technique du bâtiment per MINERAL REFLEX WHITE FLEXTER TESTUDO SPUNBOND POLIESTERE



#### AGREMENT "BBA"

British Board of Agrement per MINERAL REFLEX WHITE FLEXTER TESTUDO SPUNBOND POLIESTERE










Supera la resistenza all'incendio secondo ENV 1187/1 ed è classificata me EN13501-5; Broof-t1, t3, t4

per MINERAL REFLEX WHITE FLEXTER TESTUDO FR TRIARMATO



Supera la prova di reazione al fuoco secondo ENV 1187/1 ed è classificata conforme EN13501-1: Euroclasse E
per MINERAL REFLEX WHITE FLEXTER TESTUDO FR TRIARMATO





perficiale ad alta riflettanza denominata: MINE-RAL REFLEX WHITE.

MINERAL REFLEX WHITE FLEXTER TESTU-DO nella versione SPUNBOND POLIESTERE è armata con un tessuto non tessuto di poliestere composito mentre la versione FR TRIARMATO (Fire Resistance) è triarmata con un feltro di vetro compreso fra due non tessuti di poliestere, entrambe resistenti ed elastiche e dotate di una elevata stabilità dimensionale.

La resistenza all'incendio proveniente dall'esterno della versione **FR TRIARMATO**, prodotta solo nella versione da 4 mm, è certificata conforme EN 13501- 5 nelle Classi: B<sub>roof</sub> (t1), B<sub>roof</sub> (t3) e B<sub>roof</sub> (t4). Alla resistenza al fuoco della membrana contribuisce l'armatura speciale, in azione sinergica con l'apposito additivo aggiunto alla mescola bitume distillato polimero di questa versione. L'additivo antifiamma della versione FR è innocuo, è di natura minerale, non contiene cloro, e durante la combustione non libera gas tossici


La mescola, collaudata da applicazioni trentennali e da più di venti anni di certificazione, è a base di bitume distillato, selezionato per l'uso industriale, con un alto tenore di polimeri elastomerici, plastomerici e copolimeri metallocenici tali da ottenere una lega ad "inversione di fase", la cui fase continua è costituita da una matrice polimerica in cui è finemente disperso il bitume. Questa configurazione determina le caratteristiche del prodotto che sono più simili a quelle della materia polimerica a cui il bitume aggiunge superiori dati di adesività e resistenza all'acqua.

#### MINERAL REFLEX WHITE FLEXTER TESTU-

DO è destinata a rimanere a vista e la speciale finitura minerale di colore bianco della faccia superiore compatta ed aderente possiede una elevata capacità di riflettere i raggi solari che unita ad una altissima emissività all'infrarosso, nella stagione estiva sulle coperture dove è applicata, consente di assorbire meno calore nelle ore diurne e di smaltire più velocemente il calore assorbito nelle ore notturne ottenendo un risparmio energetico dell'impianto di climatizzazione degli ambienti sottostanti.


L'elevata riflettanza della membrana abbassa la temperatura del manto impermeabile e di conseguenza ne beneficiano anche gli ambienti sottostanti la copertura come pure il manto stesso che è sottoposto ad un regime termico inferiore che ne prolunga la durata. La riduzione delle temperatura del manto unita all'elevata riflettanza (albedo) aumenta il rendimento dei pannelli solari fotovoltaici che dovessero essere installati sulla copertura, sia perché a bassa temperatura rendono di più, sia perché aumentando la luminosità dell'intorno aumenta la resa del pannello nelle ore serali.



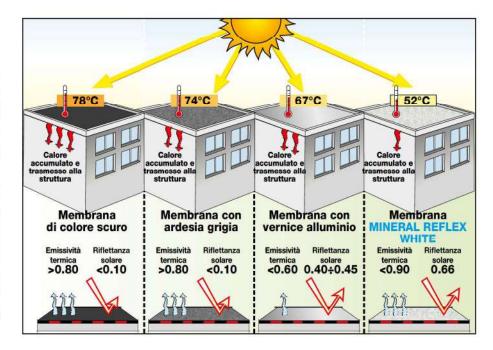

#### MINERAL REFLEX WHITE FLEXTER TESTU-

**DO** contribuisce alla riduzione del surriscaldamento delle città dovuto alle Isole di Calore Urbane.



Le proprietà di riflessione della membrana sono certificate dall'EELab (Energy Efficiency Laboratory del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Civile dell'Università di Modena e Reggio Emilia).

L'incremento della riflettanza solare e della emissività termica apportato dalla finitura MINERAL REFLEX WHITE delle membrane ardesiate

Superficie	Riflettanza	Emissività	
Membrana bituminosa nera	<10% (<0,1)	>80% (>0,8)	
Membrana bit. verniciata alluminio	40÷45% (0,40÷0,45)	<60% (<0,6)	
Membrana con finitura MINERAL REFLEX WHITE	66% (0,66)	<90% (<0,90)	



La faccia inferiore della membrana è rivestita con un film fusibile Flamina che ha un'elevata retrazione a contatto con la fiamma di applicazione mentre la faccia superiore è protetta da speciali scagliette minerali bianche, compatte, incollate ad alta temperatura, fatto salvo una fascia laterale di 8 cm ca. per permettere la saldatura delle sovrapposizioni.

Si producono le seguenti tipologie:

Membrana	Spessore	Tipologia di sistema realizzabile	Accesso	Pendenza ammessa
MINERAL REFLEX WHITE FLEXTER	4 mm	Mono o Pluristrato	, salvo ra pesante	
TESTUDO SPUNBONE POLIESTERE	) 3 mm	Pluristrato	ala manutenzione, s didonea copertura	1 98
MINERAL REFLEX WHITE FLEXTER TESTUDO FR TRIARMATO	4 mm	Mono o Pluristrato	Limitato ala man applicazione didone	Classe

#### CAMPI D'IMPIEGO

Le durevoli caratteristiche di resistenza meccanica e di elasticità e la stabilità sia ad alta che bassa temperatura delle membrane MINERAL REFLEX WHITE FLEXTER TESTUDO consentono di impiegarle come elementi di tenuta, monostrato o pluristrato esposte a vista, sia per lavori nuovi che per rifacimenti in svariate tipologie di copertura:

- Su tutte le pendenze: sia in piano che in verticale e su superfici curve (classe I)
- Su piani di posa di diversa natura: piani di posa cementizi gettati in opera o prefabbricati su coperture metalliche o in legno, sui tipi più diffusi di isolamento termico usati in edilizia.

#### Solar Reflextance Index

#### MINERAL REFLEX WHITE SRI\*=79÷81

\* SRI in funzione della velocità del vento: bassa=52%, media=53% e alta=54%.

#### RIFACIMENTO DI COPERTURA CON MINERAL REFLEX WHITE






#### REFERENZE





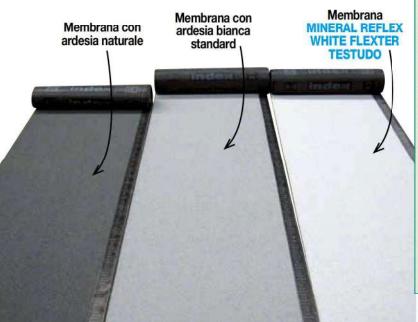

#### II GBC ITALIA (green building council) e la certificazione *LEED*



Il GBC Italia, a cui INDEX è associata, ha il compito di sviluppare, secondo le linee guida comuni a tutti gli aderenti alla comunità internazionale *LEED*, le caratteristiche del sistema *LEED* Italia, che dovrà tener presenti le specificità climatiche, edilizie e normative del nostro Paese.

Il *LEED* opta per una visione della sostenibilità sfruttando ogni possibilità di ridurre impatti ambientali di vario genere ed emissioni nocive degli edifici in

costruzione.

Gli standard *LEED* (Leadership in Energy and Environmental Design) sono parametri per l'edilizia sostenibile, sviluppati negli Stati Uniti e applicati in 40 paesi nel mondo, che indicano i requisiti per costruire edifici eco-compatibili, capaci di "funzionare" in maniera sostenibile ed autosufficiente a livello energetico; in sintesi, si tratta di un sistema di rating per lo sviluppo di edifici "verdi".

Il *LEED* è una certificazione, su base volontaria, in cui è il progettista stesso che si preoccupa di raccogliere i dati per la valutazione. Il sistema si basa sull'attribuzione di crediti per ciascuno dei requisiti caratterizzanti la sostenibilità dell'edificio.

Dalla somma dei crediti deriva il livello di certificazione ottenuto.

I criteri valutativi contemplati dal *LEED* (versione 2009) sono raggruppati in sei categorie (+1 valida solo negli USA), che prevedono uno o più prerequisiti prescrittivi obbligatori, e un numero di performance ambientale che attribuiscono il punteggio finale all'edificio:

- Insediamenti sostenibili (1 prerequisito, 26 punti)
- Consumo efficiente di acqua (1 prerequisito, 10 punti)
- Energia ed atmosfera (3 prerequisiti, 35 punti)
- Materiali e risorse (1 prerequisito, 14 punti)
- Qualità ambientale indoor (2 prerequisiti, 15 punti)
- · Progettazione ed innovazione (6 punti)
- Priorità regionale (4 punti) applicabile solo negli USA

Ci sono 4 livelli di rating:

- certificazione base: tra 40 e 49 punti
- Argento: tra 50 e 59 punti
- Oro: tra 60 e 79 punti
- Platino: più di 80 punti

Conforme i criteri del Green Building Council la membrana **MINERAL REFLEX WHITE FLEXTER TESTUDO** è pertanto in grado di soddisfare ampiamente l'esigenza SRI>29 relativa ai Crediti *LEED*:

• SS Credito 7.1: Effetto Isola Di Calore: Superfici Esterne Non Coperte Opzione 2. Porre sotto copertura almeno il 70% degli spazi adibiti a parcheggio (si definiscono parcheggi sotto copertura quelli interrati o dentro l'edificio o sotto tettoie). Ogni copertura utilizzata per ombreggiare o coprire i parcheggi, nel caso in cui non sia realizzata con strutture di supporto ricoperte da vegetazione, deve avere un SRI superiore a 29

• SS Credito 7.2: Effetto Isola Di Calore: Coperture

Opzione 1. Utilizzare materiali di copertura che abbiano un Indice di Riflessione Solare SRI (Solar Reflectance Index) maggiore o uguale al valore riportato nella tabella sottostante per un minimo del 75% della superficie del tetto.

Tipo di coperturaPendenzaSRICoperture a bassa pendenza≤2:12 (9,5°-16,7%)78Coperture a pendenza elevata>2:12 (9,5°-16,7%)29

Opzione 3. Installare superfici ad elevata albedo e coperture a verde che, in combinazione, soddisfino il seguente criterio:

(Area tetto che soddisfa il criterio SRI / 0,75) + (Area tetto verde / 0,5)  $\geq$  Area totale del tetto

			CARATTER	ISTICHE TECNICHE		
	MINERAL REFLEX WHITE FLEXTER Normativa  MINERAL REFLEX WHITE FLEXTER TESTUDO SPUNBOND POLIESTERE (¹)  MINERAL REFLEX WHITE FLEXTER TESTUDO FR TRIARMATO (²)					
Armatura			Tessuto non tessuto di poliestere composito stabilizzato con fibra di vetro		Tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Spunbond triarmato e velo di vetro	
Spessore	EN 1849-1	±0,2	3 mm	4 mm	4 mm	
Dimensioni rotoli	EN 1848-1	2	1×10 m	1×10 m	1×10 m	
Impermeabilità	EN 1928 - B	2	60 kPa	60 kPa	60 kPa	
Resistenza a trazione delle giunzioni L/T	EN 12317-1	-20%	750/600 N/50 mm	750/600 N/50 mm	650/600 N/50 mm	
Forza a trazione massima L/T	EN 12311-1	-20%	850/700 N/50 mm	850/700 N/50 mm	750/600 N/50 mm	
Allungamento a trazione L/T	EN 12311-1	-15% V.A.	50/50%	50/50%	50/50%	
Resistenza al punzonamento dinamico	EN 12691 - A		1 250 mm	1 250 mm	1 000 mm	
Resistenza al punzonamento statico	EN 12730 - A		20 kg	20 kg	15 kg	
Resistenza alla lacerazione con il chiodo L/T	EN 12310-1	-30%	200/200 N	200/200 N	250/250 N	
Stabilità dimensionale L/T	EN 1107-1	<b>s</b>	-0.30/+0.30%	-0.30/+0.30%	-0.25/+0.10%	
Flessibilità a freddo  dopo invecchiamento	EN 1109 EN 1296-1109	≤ +15°C	−20°C −20°C	-20°C -20°C	–15°C –5°C	
Res. allo scorimento ad alte temp.  • dopo invecchiamento	EN 1110 EN 1296-1110	≥ -10°C	140°C 140°C	140°C 140°C	140°C 120°C	
Resistenza ai raggi U.V.	EN 1297		<u> </u>	Supera la prova	<u>-</u>	
Euroclasse di reazione al fuoco	EN 13501-1		E	E	Ε	
Comportamento al fuoco esterno	EN 13501-5		F roof	F roof	B <sub>tour</sub> (t1, t3, t4)	
Solar Reflectance Index (SRI)						
• SRI per h <sub>c</sub> =5 W/(m²K)	(bassa vento	sità)	79%	79%	79%	
• SRI per h <sub>c</sub> =12 W/(m2K)	(media vento	sità)	80%	80%	80%	
• SRI per h <sub>e</sub> =30 W/(m <sup>2</sup> K)	(alta ventos	sità)	81%	81%	81%	
Caratteristiche termiche						
Conduttività termica			0.2 W/mK	0.2 W/mK	0.2 W/mK	


(1) Agrement ITC-CNR (ex ICITF) n. 589/03. (2) Agrement URato ATG1616.

Conforme EN 13707 come fattore di resistenza al passaggio del vapore per le membrane bitume distillato polimero armate, ove non dichiarato, può essere assunto il valore µ = 20 000.

4.80 KJ/K

# **COMPOSIZIONE DELLA MEMBRANA** MINERAL REFLEX WHITE FLEXTER TESTUDO SPUNBOND POLIESTERE Cimosa Autoprotezione con granu MINERAL REFLEX WHITE

3.60 KJ/K



4.80 KJ/K

#### **FINITURE PRODOTTO**



GOFFRATURA. La goffratura sulla superficie inferiore della membrana rivestita con film Flamina permette una poca cicura o veloco; diventande licola, cotto l'effetto della fiamma, segnala la giusta fusione e consente una retrazione più rapida del film. La goffratura permette anche una buona diffusione del vapore; nella posa in semindipendenza e in indipendenza, nei punti dove resta intatta,



AUTOPROTEZIONE MINERAL REFLEX WHITE. Sulla faccia della membrana destinata a rimanere a vieta, viene insollata a caldo una autoprotezione formata da granuli ceramizzati speciali bianchi ad aha saturazione e luminosità che protegge la membrana dall'invecchiamento causto dai raggi UY ed è dotata di una alta riflettanza solare unita ad una elevatissina emissività termica.

• È POSSIBILE CONSULTARE ED EFFETTUARE IL DOWNLOAD DELLE VOCI DI CAPITOLATO SUL SITO www.indexspa.it NELLE RELATIVE SCHEDE PRODOTTO • PER UN CORRETTO USO DEI NOSTRI PRODOTTI CONSULTARE I CAPITOLATI TECNICI INDEX • PER ULTERIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI CONSULTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO



T. +39 045 8546201 - F. +39 045 518390

Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D'Azzano (VR) - Italy - C.P.67



Amministrazione e Segreteria index@indexspa.it Index Export Dept. index.export@indexspa.it









Capacità termica

10/2015la-c



# **ECOVER**


## PRIMER BITUMINOSO ALL'ACQUA

PER CALCESTRUZZI

#### CONFERISCE CREDITI LEED

	CARATTERISTICHE		IMPATTO AMBIENTALE		MODALITÀ	D'IMPIEGO		AVVERTENZE	
	A H <sub>2</sub> O								
I	MONOCOMPONENTE	BASE ACQUA	ECO GREEN	MESCOLARE MECCANICANENTE	APPLICAZIONE A SPRUZZO	APPLICAZIONE A PENNELLO	APPLICAZIONE A RULLO IN SPUGNA	STOCCAGGIO: TEME IL GELO	

#### BLOCCARE LA POLVEROSITÀ DEI SUPPORTI IN CALCESTRUZZO IN MODO ECOLOGICO



Bloccare la polvere e porosità del calcestruzzo con un prodotto molto penetrante e di veloce essiccazione per permettere la rapida stesura del manto impermeabile utilizzando un prodotto all'acqua, privo di rischio di infiammabilità, di nocività e che non rilasci odori molesti durante l'essiccazione in prossimità di edifici abitati.

#### Descrizione

**ECOVER** è un primer bituminoso all'acqua per migliorare l'ancoraggio del primer ai fondi di calcestruzzo anche umidi (massimo 3%).

Dopo essiccazione, se applicato anche come pittura impermeabilizzante in spessore, forma un film molto tenace e ancorante su ogni tipo di supporto senza presentare nessuna appicicosità superficiale. Possiede inoltre un buon potere penetrante, aggrappante e consolidante verso tutte le superfici di calcestruzzo asciutte.

#### Vantaggi

- Ottima adesione sul calcestruzzo.
- Ottima adesione delle membrane bitume polimero sul film essiccato di primer ECOVER.
- · Prodotto atossico, esente da solventi.
- · Perfettamente inodore.
- · Buona penetrazione.
- · Applicabile su superfici leggermente umide.

#### Campi d'impiego

È indicato per saturare e consolidare i piani di posa cementizi asciutti preparando un valido ancoraggio alla ricopertura impermeabilizzante con guaine liquide bituminose o con membrane prefabbricate.

**ECOVER** fissa la polverosità superficiale del cemento per permettere un'ottima adesione dei manti impermeabili totalmente aderenti che necessitano di una forte adesione al supporto senza limiti di durata.

**ECOVER** è impiegato specificatamente per applicazioni su coperture piane e inclinate in cls o metallo, viadotti e ponti di calcestruzzo asciutto, prima della stesura delle membrane bitume polimero.

**ECOVER** viene usato come pittura impermeabilizzante nei muri di fondazione in calcestruzzo, come primer fissativo consolidante di superfici in cemento, legno e metallo. Inoltre, viene utilizzato per la protezione e l'impermeabilizzazione di tubazioni e cisterne metalliche sia esposte che interrate.

#### Modalità d'impiego

#### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

È importante per la buona riuscita del lavoro che le superfici di calcestruzzo da trattare siano il più possibile asciutte, o leggermente umide. Inoltre devono essere perfettamente pulite, senza parti in distacco, ed esenti da olii, grassi e polveri sfarinanti.

#### APPLICAZIONE

**ECOVER** è pronto all'uso; è applicabile a spazzolone, pennello, rullo o spruzzo (1).

Può essere diluito con circa il 15-20% d'acqua pulita versandola sotto agitazione.

La quantità di primer da utilizzare è in funzione





della porosità del supporto cementizio o dal grado di finitura del film essicato che si vuole ottenere. Le membrane bitume polimero vanno applicate sulla superficie di calcestruzzo, trattate con primer (2), dopo un tempo di attesa che varia da un tempo minimo di tre ore (in situazione di esposizione ottimale al sole), fino ad otto ore in condizioni più critiche per permettere l'essiccazione totale del film di pittura bituminosa. L'eventuale seconda mano va applicata solo sulla prima mano perfettamente asciutta.

#### CONSUMO

Il consumo stimato su una superficie cementizia è di circa 350-500 g/m², mentre su una superficie metallica di circa 200-300 g/m².

#### AVVERTENZE

- Non usare all'interno di abitazioni o in ambienti non aerati.
- È sconsigliata l'applicazione del prodotto nel periodo invernale alle basse temperature. Sono da evitare le condizioni estreme di caldo e freddo durante l'applicazione. Non applicare quando la temperatura potrebbe scendere sotto i +5°C durante l'essiccazione del film di pittura.

- Il prodotto teme il gelo. La dispersione bituminosa diventa instabile con formazione di grumi. Il prodotto una volta gelato non è più riutilizzabile.
- Non applicare in imminenza di pioggia o quando la temperatura potrebbe scendere sotto i +5°C; applicare il prodotto a temperature del supporto superiori a +5°C.
- Non utilizzare per impermeabilizzare vasche, scantinati o canali soggetti a forti controspinte d'acqua o acqua in pressione.
- Non applicare per impermeabilizzare superfici o contenitori di liquidi commestibili, per l'acqua potabile o che possano venire a contatto con solventi o olii minerali.
- Dopo l'uso per la pulizia degli attrezzi utilizzare gasolio o altri diluenti comuni (sintetico, acqua ragia, nitro). Si consiglia di immergere gli attrezzi stessi nel diluente anche durante l'uso per impedire che i residui di prodotto si secchino rendendoli inutilizzabili.
- Conservare negli imballi originali ad una temperatura non inferiore a +5°C. Richiudere i contenitori dopo l'uso.





E00/ED						
	Normativa	ECOVER				
Aspetto		Liquido				
Colore		Nero				
Massa volumica	EN 2811-1	$1.00 \pm 0.10 \text{ kg/L}$				
Residuo secco - a 130°C	UNI EN ISO 3251	30 ± 2%				
Viscosità Coppa DIN/4	UNI EN ISO 2431	10 ÷ 20 secondi				
Stoccaggio nelle confezioni originali in luogo asciutto		12 mesi				
Caratteristiche di lavorabilità						
Temperatura di applicazione		+5°C ÷ +35°C				
Tempo di attesa - per l'essiccazione fuori polvere (*)		1 ora				
Tempo di attesa - per l'essiccazione fuori tatto (*)		2 ÷ 3 ore				
Applicazione		manuale o meccanica				

Condizioni di prova: temperatura 23±2°C, 50±5% U.R. e velocità aria nell'area di prova <0,2 m/s. I dati espressi possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, umidità, ventilazione, assorbenza del fondo.

#### **VOCE DI CAPITOLATO**

Primer bituminoso di adesione idoneo per la preparazione delle superfici alla posa a fiamma delle membrane bitume distillato polimero, tipo ECOVER, a base di un'emulsione bituminosa all'acqua con residuo secco (UNI EN ISO 3251) del 35%.

#### **Packaging**

#### **ECOVER**

Latta da 20 litri. Latta da 10 litri. Latta da 5 litri.

• È POSSIBILE CONSULTARE ED EFFETTUARE IL DOWNLOAD DELLE VOCI DI CAPITOLATO SUL SITO www.indexspa.it NELLE RELATIVE SCHEDE PRODOTTO •

PER UN CORRETTO USO DEI NOSTRI PRODOTTI CONSULTARE I CAPITOLATI TECNICI INDEX • PER ULTERIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI CONSULTARE IL NOSTRO UFFICIO TECN



INDEX Construction Systems and Products S.p.A.
Via G. Rossini, 22 - 37060 Castel D'Azzano (VR) - T. +39 045 8546201 - Fax +39 045 518390











<sup>(\*)</sup> I tempi espressi sono più lunghi o più corti con la diminuzione o l'aumento della temperatura.



#### DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA RESA DALL'IMPRESA INSTALLATRICE

Il sottoscritto Rullo Franco Luigi, nato a Stilo (RC) il 04/01/1961, titolare della ditta installatrice Rullo Franco, con sede legale in Monasterace (RC, C/Da Lambrosi, snc, avendo provveduto, nel periodo settembre, ottobre, novembre 2022, all'esecuzione di lavori di impermeabilizzazione e coibentazione commissionata dall'Impresa OMEGA COSTRUZIONI SRL con sede in SAN GIOVANNI GEMINI (AG), Via OREFICI n. 36 codice fiscale e partita IVA n. 02538540846, nel cantiere "Interventi di ripristino copertura corpo atrio A - Asilo Nido "Il Bruco Pellegrino", Via Pellegrini 19. MOGE 20899. - CIG 9100743AB2"

sotto la propria responsabilità

#### DICHTARA

che, previo l'accertamento delle buone condizioni dei materiali utilizzati, i seguenti lavori:

1) Impermeabilizzazione e coibentazione solaio:

Risultano eseguiti ed ultimati a regola d'arte.

Monasterace, 19/12/2022

la Ditta Installatrice








altezza di caduta < 2.00 altezza di caduta < 2.00 altezza di caduta >2.00 PIANTA DI COPERTURA BOZZA DI POSIZIONAMENTO altezza di caduta < 200 Palo di ancoraggio Ø 90 mm a base piana piana CL C-A Punto d'ancoraggio fisso ad anello in inox CL A ii di capartura, fomite della ditta installatrice. La progettazione è stala redella aulla base delle info per la pasa di ancosaggi in classe C-A, ai sensi della noma UNI EN795-2012 - UNI 11578:2015 Elemento intermedio passante-passacavo - Fune metallica Ø 8 mm in inox AISI 316 Accesso tetto - DA VERIFICARE Elemento blocca moschettone altezza di caduta < 2.00 RINI 1.00 Il presente diesgno è di proprietà delle POKER sno Ne è pertamb vietata la riproduzione cita divugazione senza previa auforitzzazione sutta \*\*\*\*\*\*\*/2022 Geom. Guerini 338/GM PREV. n° DISEG. DATA

CANTIERE

POKER S.n.x..
Sede : Via Serio n° 6 24020 CASNIGO (BG) - Tel. 035,710217 Fax 035,72
Web; www.fineevitapoker.it. e.mail: info@lineevitapoker.it
Cod fiscale / P. VIA / Reg. Imp. Bg n° 03136400169 R.E.A. Bg n° 352383

22R GUERINI GEOM. MASSIMO

#### DISPOSITIVO PER PROTEZIONE CADUTE DALL'ALTO EN 795:2012 CLASSE A



#### Fissaggi:

- 1 Barra filettata M12 L. > 120mm con ancorante chimico bicomponente e dado autobloccante
- 1 Ancorante monocono M12 min. L. > 120 mm e dado autobloccante
   1 Tirafondo Ø 12 min. L. > 120 mm



Sp. 3mm acciaio INOX



 $\phi 13$ 

PFI A1


PUNTO D'ANCORAGGIO FISSO




POKER S.n.c. Via Serio, 6 - 24020 CASNIGO (BG) Tel. 035.710217 - Fax 035.725716 Web: www.lineevitapoker.it - Email: info@lineevitapoker.it

Cod. fiscale / P. IVA / Reg. Imp. Bg n° 03136400169 R.E.A. Bg 352383 ANELLO INOX

# DISPOSITIVO PER PROTEZIONE CADUTE DALL'ALTO EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013 CLASSE A - C

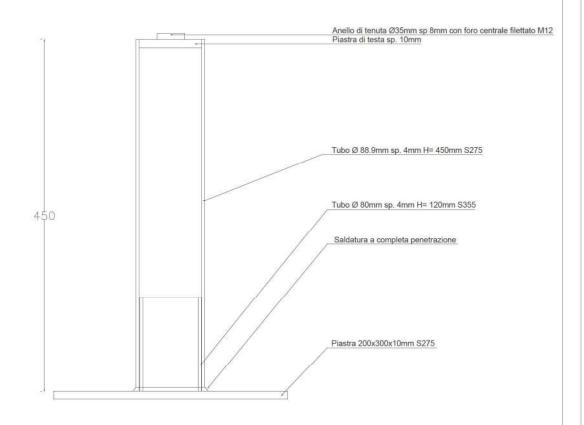



Senso dello sforzo Max. 1800 daN

Il calcolo e la verifica degli ancoraggi (meccanici o chimici) e delle sottostrutture sulla quale i dispositivi di classe A e C vengono installati, deve essere esaminata e validata dal progettista strutturale o da un ingegnere qualificato nominato dalla Committenza.



POKER S.n.c. Via Serio, 6 - 24020 CASNIGO (BG)
Tel. 035.710217 - Fax 035.725716
Web: www.lineevitapoker.it - Email: info@lineevitapoker.it
Cod. fiscale / P. IVA / Reg. Imp. Bg n° 03136400169 R.E.A. Bg 352383


ARTICOLO:

PPLC2 02

PALO BASE PIANA H.450mm

Senso dello sforzo Max. 1800 daN

# DISPOSITIVO PER PROTEZIONE CADUTE DALL'ALTO EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013 CLASSE A - C

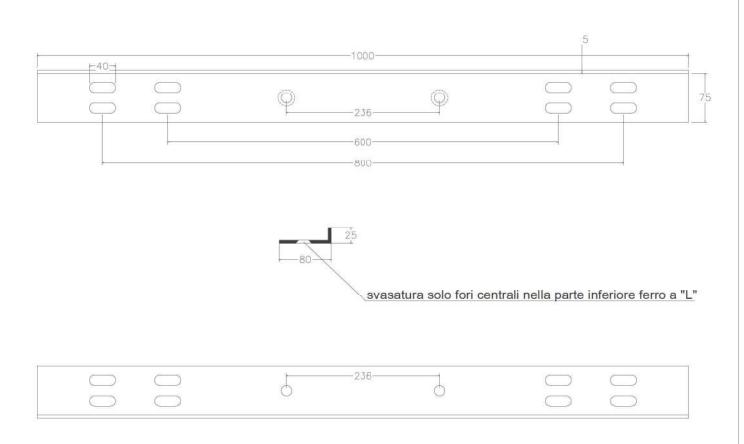

Il calcolo e la verifica degli ancoraggi (meccanici o chimici) e delle sottostrutture sulla quale i dispositivi di classe A e C vengono installati, deve essere esaminata e validata dal progettista strutturale o da un ingegnere qualificato nominato dalla Committenza.




POKER S.n.c. Via Serio, 6 - 24020 CASNIGO (BG)
Tel. 035.710217 - Fax 035.725716
Web: www.lineevitapoker.it - Email: info@lineevitapoker.it
Cod. fiscale / P. IVA / Reg. Imp. Bg n° 03136400169 R.E.A. Bg 352383


ARTICOLO:


KT 60/80

KIT TRAVETTI

# DISPOSITIVO PER PROTEZIONE CADUTE DALL'ALTO EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013 CLASSE C

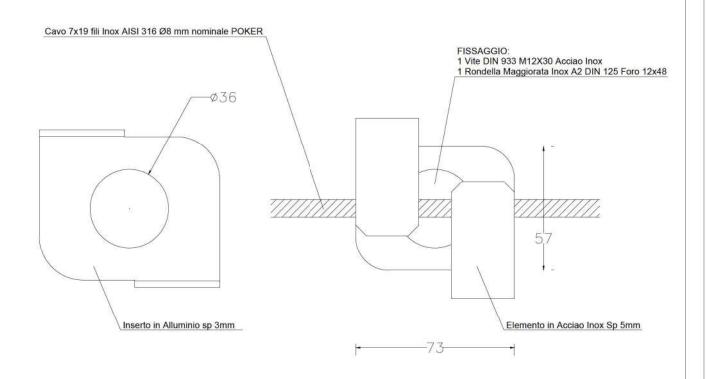









Cod. fiscale / P. IVA / Reg. Imp. Bg n° 03136400169 R.E.A. Bg 352383

#### DISPOSITIVO PER PROTEZIONE CADUTE DALL'ALTO EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013

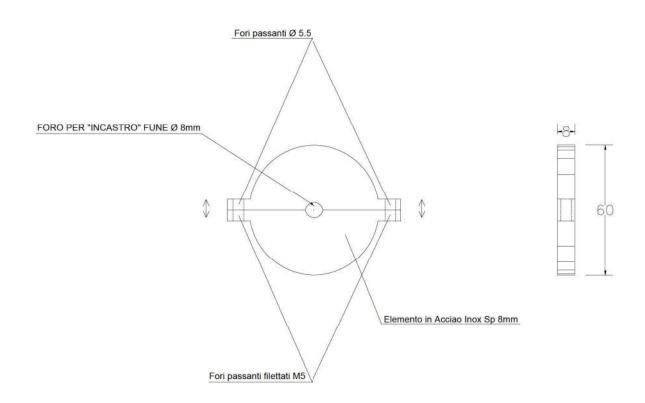



MEZZE LUNE DA ASSEMBLARE TRAMITE VITE M5 CON FORO CENTRALE PER INCASTRO FUNE



POKER S.n.c. Via Serio, 6 - 24020 CASNIGO (BG)
Tel. 035.710217 - Fax 035.725716
Web: www.lineevitapoker.it - Email: info@lineevitapoker.it
Cod. fiscale / P. IVA / Reg. Imp. Bg n° 03136400169 R.E.A. Bg 352383

ARTICOLO:

**EBM** 

ELEMENTO INTERMEDIO BLOCCA MOSCHETTONE SU FUNE Ø 8



# **FASCICOLO TECNICO**

# IMPIANTO ANTICADUTA a norma UNI 11578:2015

**IMPIANTO:** 

Via Pellegrini, 19 GENOVA -GE-

**COMMITTENTE:** 

COMUNE DI GENOVA (Asilo Nido " IL BRUCO PELLEGRINO")



#### INDICE

- DICHIARAZIONE DI MESSA IN OPERA
- 2. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
  - 1. DISPOSITIVI IN CLASSE C-A
  - 2. DISPOSITIVI IN CLASSE A
- NORME DI RIFERIMENTO
- 4. VERIFICA PALO D'ANCORAGGIO
- 5. CARATTERISTICHE FUNE
- 6. SCHEDE TECNICHE
- 7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- 8. COLLEGAMENTO PUNTI D'ANCORAGGIO FISSO
- 9. ISTRUZIONI PER L'ASSEMBLAGGIO E LA POSA
- 10. MANUALE D'USO
- 11. RICHIESTA OFFERTA PER CONTRATTO MANUTENZIONE PERIODICA
- 12. SCHEDA DI CONTROLLO E ISPEZIONE PERIODICA
- 13. ELABORATO DI PROGETTO



#### 1. <u>DICHIARAZIONE DI CORRETTA MESSA IN OPERA</u>

Il sottoscritto /LIGURIA COPERTURE ELDIS JAHAJ
Legale rappresentante della Ditta LIGUILIA CORETTURE
Con sede in via MONGRIFONE 1 Comune di SAVONA
Esercente attività di EDILIZIA GENERALE
Iscritto alla C.C.I.A.A. di SAVONA nº 223089
In merito ai lavori di posa di dispositivi di ancoraggio sull'immobile sito in
viaPELLEGRINI, 19Comune diGENOVA -GE
Con la presente dichiara di avere installato i dispositivi attenendosi a quanto previsto :
I dispositivi di ancoraggio di classe (UNI-EN 795)
A 🛛 C 🖺 D 🗆 altro 🗆
modello (specificare il modello e la casa costruttrice) ditta POKER snc
PPLC2 02 - KT 60 80 - PFI A1 - EI2 - KL 15 2 - EBM
sono stati messi in opera secondo le indicazioni del costruttore come riportato nelle istruzioni per l'assemblaggio e la posa presente nel KIT LINEA VITA e nelle modalità riportate sulle schede tecniche, rispettando il fissaggio richiesto dei dispositivi d'ancoraggio sia in classe C che in classe A
sono stati posizionati sulla copertura come da elaborato grafico allegato
sono state verificate (direttamente dall'installatore o da D.L. di cantiere) le strutture pertinenti al fissaggio dei Dispositivi contro le cadute dall'alto.



☑ Il sistema di fissaggio utilizzato per la posa dei dispositivi anticaduta (classe A e C) è conforme a quanto richiesto e riportato dalle schede tecniche;

Sono allegate alla presente dichiarazione e visionate dall'installatore:

- ☑ le certificazioni del costruttore relative ai dispositivi installati
- Relazione di calcolo dell'ingegnere, sulle strutture con i minimi requisiti strutturali applicabili (per dispositivi di tipo C escluso dispositivi di tipo A)
- 🛛 schede tecniche dei dispositivi d'ancoraggio installati
- ☑ Istruzioni d'uso e manutenzione
- Istruzioni per l'assemblaggio e la posa

Le caratteristiche dei dispositivi di ancoraggio e	le istruzioni sul loro corretto
utilizzo sono state raggruppate nel fascicolo tecni	ico depositate presso:
☐ il proprietario dell'immobile	-
☐ l'amministratore	
XI esposte in prossimità dell'accesso alla cope	ertura;

INSTALLATA IN DATA: SETTEMBRE 2022

#### **ATTENZIONE:**

Sarà cura del proprietario dell'immobile mantenere le attrezzature installate in buono stato al fine del mantenimento nel tempo delle necessarie caratteristiche di solidità e resistenza.

La manutenzione deve essere affidata a personale qualificato ed eseguita con le modalità e la periodicità indicata del costruttore (vedi manuale d'uso)

Via Mona C.F. e P.IVA: 0 1 Dail: liguria operature@smail. Cell: 1389 550 5688 13120 659 3648

Firma del proprietario dell'immobile

MB: La presente soluzione progettuale è stata richiesta espressamente dal committente/impresa esecutrice; la committenza pertanto esula la ditta POKER ed il progettista dalla scelta progettuale allegata al presente fascicolo tecnico.



#### 2.1 <u>DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'</u>

La sottoscritta società POKER S.n.c. di Grassi Danilo & C.

Con sede in Via Serio, 6 -24020 CASNIGO (BG)

Dichiara che i seguenti articoli:

	ACCOUNT TO A SECOND TO A SECON
PPLC2 01	Palo d'ancoraggio D.90 - H.350mm base piana
PPLC2 02	Palo d'ancoraggio D.90 - H.450mm base piana
PPLC2 03	Palo d'ancoraggio D.90 - H.600mm base piana
PPLC 04*	Palo d'ancoraggio telescopico D.90 - H.da 1000 a 1500mm base piana
PPLC 05*	Palo d'ancoraggio telescopico D.90 - H.da 1600 a 2500mm base piana
PPLB2 01	Palo d'ancoraggio D.90 - H.350mm base doppia falda
PPLB2 02	Palo d'ancoraggio D.90 - H.450mm base doppia falda
PPLB2 03	Palo d'ancoraggio D.90 - H.600mm base doppia falda
PPLD 01	Palo d'ancoraggio D.90 - H.350mm base inclinata
PPLD 02	Palo d'ancoraggio D.90 - H.450mm base inclinata
PPLA 01	Piastra d'ancoraggio 150x150
PPLA 02	Piastra d'ancoraggio ad angolo
PPLA 03	Piastra d'ancoraggio ad angolo esterno
PPLA 04	Piastra d'ancoraggio ad angolo interno
KT 60/80	Kit piastre per fissaggio pali/piastre su travetti interasse 60/80mm
CPP	Contropiastra per pali base piana/inclinata
CPP2	Coppia di contropiastre per pali base piana/inclinata
EIA	Elemento intermedio ad angolo
EI 2	Elemento intermedio passante
EIP 2	Elemento intermedio passacavo
KL-15 2 (KL-15 2C)	Kit linea vita 15mt (o crimpato)

sono conformi alla norme: EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013

Carico di rottura: 3.700 daN

Tali dispositivi contro la caduta dall'alto sono conformi a sopportare i carichi definiti dalle norme sopra riportate progettati e dimensionati secondo una relazione di calcolo, quindi adatti a costituire LINEE VITA e nello specifico il SISTEMA ANTICADUTA MOD. POKERLIFE.


Le relazioni di calcolo sono state effettuate da un'ingegnere strutturale per ogni articolo sopracitato e sono depositate presso la ns. sede.

L'utilizzo del sistema anticaduta è possibile solo ad operatori a conoscenza dei rischi specifici ed è subordinato all'uso di dispositivi di protezione individuale idonei.

Ogni ancoraggio prevede un controllo da parte di personale qualificato ogni qualvolta sia stato sollecitato da una caduta, altrimenti va effettuata manutenzione periodica, nelle modalità riportate al paragrafo USO E MANUTENZIONE.

Casnigo, li 03/06/2015

POKER S.n.c.





#### 2.2 <u>DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'</u>

La sottoscritta società POKER S.n.c. di Grassi Danilo & C. Con sede in Via Serio, 6 - 24020 CASNIGO (BG) Dichiara che i seguenti articoli:

PF- C	Punto d'ancoraggio fisso per tegole e coppi
PF-P/PF-P2P	Punto d'ancoraggio fisso per pannelli o ardesia
PT - PF	Piastra tavellone per punti fissi
PFA - A2	Regolo per punti d'ancoraggio fisso
PFI - A1	Punto d'ancoraggio fisso anello INOX
PFA - A1	Punto d'ancoraggio fisso anello ALLUMINIO
PPG	Piastra per palo girevole
PF - CI	Punto d'ancoraggio fisso INOX diam.6

sono conformi alla norma UNI EN 795:2012 classe A Carico di rottura: > 1.200 daN

Tali dispositivi contro la caduta dall'alto sono conformi a sopportare i carichi definiti dalle norme UNI EN 795:2012.

Le prove a cui sono stati sottoposti i prodotti sono le seguenti:


EN 795:2012 §4.4.1.1 Prova di deformazione

EN 795:2012 §4.4.1.2 Prova di resistenza dinamica e integrità

EN 795:2012 §4.4.1.3 Prova di resistenza statica

L'utilizzo del sistema anticaduta è possibile solo ad operatori a conoscenza dei rischi specifici ed è subordinato all'uso di dispositivi di protezione individuale idonei. Ogni ancoraggio prevede un controllo da parte di personale qualificato ogni qualvolta sia stato sollecitato da una caduta, altrimenti si consiglia una manutenzione periodica ogni 5 anni verificando la tenuta degli ancoraggi.

Casnigo, li 30/06/2014





#### 3. LEGISLAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs 81/08:

Testo Unico Sicurezza Lavoro

DPR 547/55:

Norme generali per la prevenzione degli infortuni;

D.M. 16/01/1996:

Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione e il collaudo

delle strutture in cemento armato normale, precompresso a

struttura metallica

UNI 11578:2015

UNI EN 795/2012:

Requisiti metodi di prova ed istruzioni per l'uso e la

marcatura dei dispositivi di ancoraggio

CEN/TS16415:2013:

Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute -Dispositivi di ancoraggio - Raccomandazioni per dispositivi

di ancoraggio per l'uso da parte di più persone

contemporaneamente

UNI 11578:2015

UNI EN 7547:

Segni grafici per segnali d'obbligo. Protezione individuale

obbligatoria contro le cadute

UNI EN 360 – UNI EN 361 – UNI EN362 – UNI EN363 – UNI EN 364 – UNI EN 365 - UNI EN 353 - UNI EN 354 - UNI EN 355:

Dispositivi di caduta e protezione dall'alto. metodi di prova, connettori, per la marcatura e assorbitori di energia, sistemi

di arresto

UNI 8088:

Lavori inerenti le coperture dei fabbricati: Criteri per la

sicurezza

UNI 8793:

Funi d'acciaio: estremità con manicotti.

DM 14/01/2008

Norme tecniche per le costruzioni

Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro:

89/654/CEE - 89/655/CEE - 89/656/CEE - 90/269/CEE - 90/270/CEE - 90/394/CEE - 90/679/CEE - 93/88/CEE - 95/63/CE - 97/42/CE - 98/24/CE - 99/38/CE - 99/92/CE - 2001/45/CE

Web: www.lineevitapoker.it e.mail: info@lineevitapoker.it Cod. fiscale / P. IVA / Reg. Imp. Bg n° 03136400169 - R.E.A. Bg n° 352383



#### **VERIFICA DEL PALO DI ANCORAGGIO H 450 PER** LINEA VITA MODELLO PPLC 02



POKER S.n.c. Via Serio,6 - 24020 CASNIGO (BG) Tel. 035.710217 - Fax 035.725716

Web: www.lineevitapoker.it e.mail: info@lineevitapoker.it Cod. fiscale / P. IVA / Reg. Imp. Bg n° 03136400169 - R.E.A. Bg n° 352383

DENOMINAZIONE: VERIFICA DEL PALO DI ANCORAGGIO H 450 PER LINEA VITA MODELLO PPLC 02					
ELABORA	то:	DOCUMENTAZIONE DI CALCOLO		F	PPLC 02
03	25-11-2015	Progetto	ing. Michele Guerini	M.G.	D.G.
REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO



### 1 PREMESSA

Nel presente elaborato si riporta il risultato delle verifiche dimensionali di palo di sostegno a cui viene installato un punto fisso di ancoraggio impiegato al fissaggio della linea vita.

# 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.M. 09/01/1996: Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche;
- D.M. 14/01/2008 NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI (G.U. n. 04/02/2008 n. 29);
- CIRCOLARE 2 febbraio 2009, n. 617 (G.U. n. 47 del 26 febbraio 2009- Suppl. Ordinario n.
   27) Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008;
- Eurocodice 3, Progettazione delle strutture in acciaio;
- EN 1993-1-4, Progetto di strutture in acciaio: acciai inossidabili
- Manuale di Progettazione strutturale in acciaio inossidabile lavorato a freddo (contratto RFS2-CT-2005-00036) redatto dallo Steel Construction Institute come risultato del progetto di ricerca FRAC Progetto di valorizzazione
- D.LGS Nº81 del 9 aprile 2008; Testo coordinato con il D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- DPR 547/55: Norme generali per la prevenzione degli infortuni;
- UNI EN 795:2012 Protezione contro le cadute dall'alto, dispositivi di ancoraggio, requisiti metodi di prova ed istruzioni per l'uso e la marcatura dei dispositivi di ancoraggio;
- CEN/TS16415:2013: Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute -Dispositivi di ancoraggio - Raccomandazioni per dispositivi di ancoraggio per l'uso da parte di più persone contemporaneamente
- UNI EN 365 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto; requisiti generali per le istruzioni per l'uso, la manutenzione, l'ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l'imballaggio;

DENOM	VERIFICA DEL PALO DI ANCORAGGIO H 450 PER LINEA VITA MODELLO PPLC 02				
ELABORA'	то:	DOCUMENTAZIONE DI CALCOLO		PPLC	
03	25-11-2015	Progetto	Ing. Michele Guerini	M.G.	D.G.
REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO



- UNI EN 7547 Segni grafici per segnali d'obbligo; protezione individuale obbligatoria contro le cadute;
- UNI EN 360 UNI EN 361 UNI EN362 UNI EN363 UNI EN 364 UNI EN 365 UNI EN 353 UNI EN 354 UNI EN 355: Dispositivi di caduta e protezione dall'alto. metodi di prova, connettori, per la marcatura e assorbitori di energia, sistemi di arresto
- UNI EN 8088 Lavori inerenti le coperture dei fabbricati: Criteri per la sicurezza;
- UNI EN 341 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto, dispositivi di discesa;
- UNI EN 8793 Funi d'acciaio: estremità con manicotti.
- UNI EN 358 Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto, cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro;
- UNI EN 363 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto; sistemi di arresto caduta;
- UNI 11158 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto; sistemi di arresto caduta, guida per la selezione e l'uso.
- UNI EN 517 Accessori prefabbricati per coperture, ganci di sicurezza da tetto.

Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro:

89/654/CEE - 89/655/CEE - 89/656/CEE - 90/269/CEE - 90/270/CEE - 90/394/CEE -90/679/CEE - 93/88/CEE - 95/63/CE - 97/42/CE - 98/24/CE - 99/38/CE - 99/92/CE -2001/45/CE

DENOMINAZIONE: VERIFICA DEL PALO DI ANCORAGGIO H 450 PER LINEA		0 PER LINEA VITA MODELLO PPLC 02			
ELABORA	PRATO: DOCUMENTAZIONE DI CALCOLO		PPLC 02		
03	25-11-2015	Progetto	Ing. Michele Guerini	M.G.	D.G.
REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO



# 3 <u>DEFINIZIONI CLASSI DI APPARTENENZA DEGLI ANCORAGGI SECONDO UNI</u> 795:2012

Dispositivi di classe A: ancoraggi strutturali progettati per essere fissati a superfici verticali, orizzontali ed inclinate.

Dispositivi di classe C: ancoraggi che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali (con deviazione massima di 15° rispetto all'orizzontale).

Dispositivi di classe D: comprende dispositivi di ancoraggio che utilizzano rotaie di ancoraggio rigide orizzontali.

**Dispositivi di classe E:** comprende ancoraggi a corpo morto da utilizzare su superfici orizzontali. Pe l'uso di ancoraggi a corpo morto, una superficie si intende orizzontale se devia dall'orizzontale per non più di 5°.

Si ricorda che il collegamento di operatori ad ancoraggi strutturali (cl. A - C) deve essere fatto, esclusivamente, indossando Dispositivi di Protezione Individuali (DPI).

DENOM	INAZIONE:	VERIFICA DEL PALO DI ANCORAGGIO H 45			
ELABORA	TO:	DOCUMENTAZIONE DI CALCOLO		I	PPLC 02
03	25-11-2015	Progetto	Ing. Michele Guerini	M.G.	D.G.
REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO



## 4 CARATTERISTICHE MATERIALI UTILIZZATI

## fune per linea di vita:

- FUNE DIAMETRO 8mm secondo UNI 6900/71 Acciaio inox AISI 316:
- Carico Rottura minimo garantito: 5200 daN;

# acciaio da carpenteria (valido per tutti i profili impiegati):

Acciaio S275 e S355

- tensione ammissibile bulloni cl. 8.8 τ<sub>b</sub> adm = 264 MPa
- tensione ammissibile bulloni cl. 8.8 σ<sub>b</sub> adm = 373 MPa

# S275 (ex Fe 430 B FN UNI 7070/82) (S275JR EN 10025):

tensione di calcolo

= 275

MPa

Nome del materiale	S275	
Peso specifico	[.	00785
Modulo di elasticità	[2	2060000
Coefficiente di Poisson		3
Coefficiente di dilatazione termica	Γ.	000012
Resistenza di snervamento fy per spessori <= 40 m	ım Z	2750
Resistenza di snervamento fy per spessori > 40 mm	1 2	2550
Resistenza di rottura per trazione fu per spessori <	= 40 mm 4	300
Resistenza di rottura per trazione fu per spessori >	40 mm 4	100

DENOM	INAZIONE:	VERIFICA DEL PALO DI ANCORAGGIO H 45			
ELABORA	то:	DOCUMENTAZIONE DI CALCOLO		I	PPLC 02
03	25-11-2015	Progetto	Ing. Michele Guerini	M.G.	D.G.
REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO



# \$355 (ex Fe 510 B FN UNI 7070/82) (S355JR EN 10025):

tensione di calcolo
 f<sub>d</sub> = 355 MPa

Nome del materiale S355	
Peso specifico	.00785
Modulo di elasticità	2060000
Coefficiente di Poisson	.3
Coefficiente di dilatazione termica	.000012
Resistenza di snervamento fy per spessori <= 40 mm	3550
Resistenza di snervamento fy per spessori > 40 mm	3350
Resistenza di rottura per trazione fu per spessori <= 40 mm	5100
Resistenza di rottura per trazione fu per spessori > 40 mm	4700

La resistenza di calcolo da utilizzare nei dimensionamenti delle strutture metalliche è ottenuta dividendo la resistenza caratteristica per opportuni coefficienti di sicurezza del materiale e di modello, definiti da normativa.

## Si legge infatti al §4.2.4.1.1 delle NTC 2008:

"Per le verifiche di resistenza delle sezioni delle membrature, con riferimento ai modelli di resistenza esposti nella presente normativa ed utilizzando acciai dal grado S 235 al grado S 460 di cui al § 11.3, si adottano i fattori parziali  $\gamma_{M0}$  e  $\gamma_{M2}$  indicati nella Tab. 4.2.V. Il coefficiente di sicurezza  $\gamma_{M2}$ , in particolare, deve essere impiegato qualora si eseguano verifiche di elementi tesi nelle zone di unione delle membrature indebolite dai fori.

Per valutare la stabilità degli elementi strutturali compressi, inflessi e presso-inflessi, si utilizza il coefficiente parziale di sicurezza  $y_{M1}$ .".

DENOM	DENOMINAZIONE: VERIFICA DEL PALO DI ANCORAGGIO H 450 PER LINEA VITA MODELLO PPLC 02				
ELABORA	TO:	DOCUMENTAZIONE DI CALCOLO		I	PLC 02
03	25-11-2015	Progetto	Ing. Michele Guerini	M.G.	D.G.
REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO




### Quindi i coefficienti sono definiti come segue:

Resistenza delle Sezioni di Classe 1-2-3-4	γ <sub>м0</sub> = 1,05
Resistenza all'instabilità delle membrature	$\gamma_{M1} = 1,05$
Resistenza all'instabilità delle membrature di ponti stradali e ferroviari	$\gamma_{M1} = 1,10$
Resistenza, nei riguardi della frattura, delle sezioni tese indebolite dai fori	$y_{M2} = 1,25$

tutte le parti metalliche sono previste trattate con protezione mediante zincatura elettrolitica.

# 5 AZIONI AGENTI SUI SISTEMI ANTICADUTA

Le azioni impiegate per il dimensionamento del dispositivo di classe C, con riferimento alla UNI EN 795, vengono adottate come forza sollecitante trasversale alla fune, applicate nel punto intermedio della campata, con valore relativo alla prestazione dinamica pari a 6 KN.




DENOM	DENOMINAZIONE: VERIFICA DEL PALO DI ANCORAGGIO H 450 PER LINEA VITA MODELLO PPLC 02				
ELABORA	DOCUMENTAZIONE DI CALCOLO		PPLC		
03	25-11-2015	Progetto	Ing. Michele Guerini	M.G.	D.G.
REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO



## CALCOLO LINEA VITA

# 1 - Calcolo dell'azione agente sul palo



L:	9 m	Lunghezza linea vita
FC:	6 kN	Forza sviluppata dagli utilizzatori
F1:	11,9 kN	Forza calcolata sviluppata sulla linea
α	14,57 °	Angolo generato dall'abbassamento della fune
F:	11,3 kN	Forza di trazione generata sul palo (riduzione di F1 per assorbitori)
Fr:	1,17 m	Freccia totale: allungamento fune, assorbitori, piega ancoraggi




## 2 - Calcolo l'allungamento della fune e la tensione massima


F:	11,3	kN	Forza di trazione della fune
L:	9	m	Lunghezza fune
E:	130,00	kN/mm <sup>2</sup>	Modulo elastico fune
D:	8	mm	Diametro fune
A:	50,26	mm <sup>2</sup>	Sezione fune
f:	0,58		Coefficiente riempimento fune
S:	29,15	mm <sup>2</sup>	Sezione resistente
Al:	2,69	cm	Allungamento fune
of:	3884,98	daN/cm <sup>2</sup>	Tensione massima fune

DENOM	DENOMINAZIONE: VERIFICA DEL PALO DI ANCORAGGIO H 450 PER LINEA VITA MODELLO PPLC 02				
ELABORA	NTO:	DOCUMENTAZIONE DI CALCOLO		1	PPLC 02
03	25-11-2015	Progetto	Ing. Michele Guerini	M.G.	D.G.
REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO



# 6 GEOMETRIA DEL DISPOSITIVO

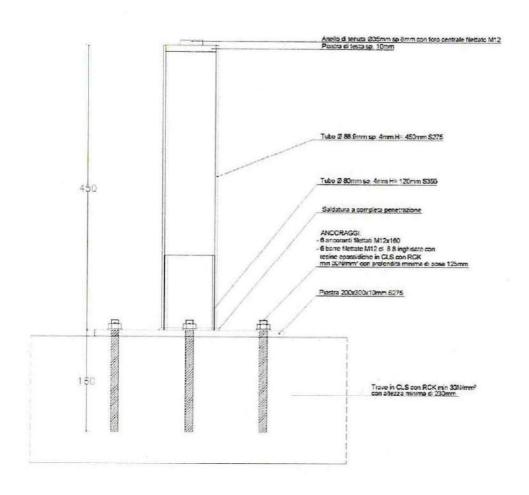



DENOM	INAZIONE:	VERIFICA DEL PALO DI ANCORAGGIO H 45	0 PER LINEA VITA MODELLO PPLC 02		
ELABORA	TO:	DOCUMENTAZIONE DI CALCOLO	JMENTAZIONE DI CALCOLO		PPLC 02
03	25-11-2015	Progetto	Ing. Michele Guerini	M.G.	D.G.
REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO



# 7 INPUT MODELLO DI CALCOLO

Condi	zioni	Concentrati	Lineari	Superf	iciali	Termici	Potenziali
	-	Descrizio	пе	1/11	1	Durata	con segno
▶1	Permanenti 2 Manutenzione _X				Per	manente	
2			tenzione_X I		Med	dia	
3	Man	utenzione_Y		1	Med	dia	
4	Man	utenzione _X1	1	1	Med	dia	
5	Delta	a T		11	Med	dia	Г

Condizio	oni	Concentrati	Lineari	Superficiali	Termici	Potenziali	Comb	inabilità per defa	ult Combinazioni
		Descrizione	Col	ore Perma	nenti Ma	nutenzione	X Ma	enutenzione_Y	Manutenzione _XY
▶1	Car	ico						The State of	
Fx					0	12	00	0	850
Fy					0		0	1200	850
Fz					0		0	0	0
Mx					0		0	0	0
Му					0		0	0	0
Mz					0		0	0	0

Condizioni	Concentrati	Lineari	Superficiali	Termici	Potenziali	Combinabilità per defa	oult Combina:	zioni	the same
		Perr	manenti (1)	Manutenzi	ione _X (2)	Manutenzione_Y (3)	Manutenzione	e_XY (4)	)elta T (5)
▶ Perman	nenti (1)	3		Stan	dard	Standard	Standa	rd	Standard
Manute	nzione _X (2)	S	tandard			Incompatibili	Incompat	tibili	Standard
Manute	nzione_Y (3)	S	tandard	Incomp	patibili		Incompat	fibili	Standard
Manute	nzione_XY (4	() S	tandard	Incomp	oatibili	Incompatibili		200	Standard
Delta T	(5)	S	tandard	Stan	dard	Standard	Standa	rd	


zioni Concer	ntrati Lineari	Superficiali	Termici	Potenziali (	Combinabilità per default	Combinazion
iglia "Unica"						
Descrizione	Permanenti	Manutenzione	X Ma	nutenzione_Y	Manutenzione XY De	elta T
1	1		0	0	0	0
2	1		0	0	1	0
3	1		0	1	0	0
4	1		1	0	0	0
	iglia "Unica" Descrizione 1	iglia "Unica"  Descrizione Permanenti 1 1	iglia "Unica"  Descrizione Permanenti Manutenzione 1 1	iglia "Unica"  Descrizione Permanenti Manutenzione X Ma 1 1 0	iglia "Unica"  Descrizione Permanenti Manutenzione_X Manutenzione_Y  1 1 0 0	iglia "Unica"  Descrizione Permanenti Manutenzione X Manutenzione Y Manutenzione XY De 1 0 0 0

DENOM	INAZIONE:				
ELABORA	ABORATO: DOCUMENTAZIONE DI CALCOLO			1	PPLC 02
03	25-11-2015	Progetto	Ing. Michele Guerini	M.G.	D.G.
REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO



# 8 RISULTATI DAL MODELLO DI CALCOLO

# Palo H=450mm




# Immagine defomata del palo

DENOM	NAZIONE:	VERIFICA DEL PALO DI ANCORAGGIO H 450			
ELABORA	TO:	DOCUMENTAZIONE DI CALCOLO		I	PPLC 02
03	25-11-2015	Progetto	Ing. Michele Guerini	M.G.	D.G.
REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO



# Report grafico dello sfruttamento delle aste; Coefficiente di sicurezza

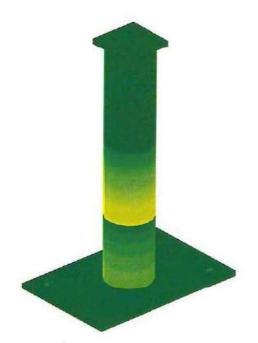

de 15 a 2	
do 1,2 e 1,5	
da 1,7 a 1,8	
de 1,5 e 1,7	
ds 1.5 a 1.6	
da 1,4 a 1,5	
6113114	
de 12 e 13	
Cx 1.1 x 1.2	
de fe 1.1	
C# 0.9 a 1	
Ca 0.8 a 0.9	
Ca 07 a 38	
Ca 0.8 a 0.7	
ds 0.5 a 0.5	
Ca DA a 0.5	
ds 0.3 a 0.4	
de 0.2 a 0.3	
ds 2,1 e 0.2	
da 6 a 0.1	

DENOM	INAZIONE:	VERIFICA DEL PALO DI ANCORAGGIO H 45	50 PER LINEA VITA MODELLO PPLC 02		
ELABORATO:		DOCUMENTAZIONE DI CALCOLO	NTAZIONE DI CALCOLO		PPLC 02
03	25-11-2015	Progetto	Ing. Michele Guerini	M.G.	D.G.
REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO



# Deformata massima in direzione X





ds 0.14 s 0.148
de 0.133 a 0.14
de 0.125 a 0.133
de 5.116 a 0.125
Ga 8.111 a 6.118
de 0.103 a 0.111
da 0.096 a 0.103
da 0.089 a 0.096
de 0.031 ± 0.039
da 0.674 a 0.051
da C 366 a 0 574
da 0.055 a 0.055
ds 0.052 a 0.055
de 0.044 a 0.052
da 0.037 a 0.044
Da 0.03 a 0.037
da 0.022 a 0.03
de 0.015 e 0.022
da 0.007 a 0.015
da 9 a 9.307 cm

DENOMI	NAZIONE:	VERIFICA DEL PALO DI ANCORAGGIO H 450	PER LINEA VITA MODELLO PPLC 02		
ELABORAT	ro:	DOCUMENTAZIONE DI CALCOLO	ALCOLO PPLO		PPLC 02
03	25-11-2015	Progetto	Ing. Michele Guerini	M.G.	D.G.
REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO



# Deformata massima in direzione X-Y

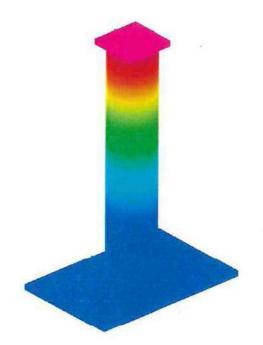



DENOM	INAZIONE:	VERIFICA DEL PALO DI ANCORAGGIO H 450	PER LINEA VITA MODELLO PPLC 02		
ELABORA	TO:	DOCUMENTAZIONE DI CALCOLO	MENTAZIONE DI CALCOLO		PPLC 02
03	25-11-2015	Progetto	Ing. Michele Guerini	M.G.	D.G.
REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO




# 11 AZIONI GENERATE NELLE SOTTOSTRUTTURE DI ANCORAGGIO

Come citato nella norma UNI EN 795 il produttore si occupa di testare e certificare il prodotto nel suo insieme, indicando le massime sollecitazioni trasmesse agli ancoraggi.

L'ingegnere qualificato, dovrà provvedere a calcolare e verificare solo l'ancoraggio (meccanico o chimico) dei dispositivi alle strutture fisse dell'edificio, oltre alle strutture stesse.


Risultante sollecitazioni dal modello di calcolo (al netto del coeff. di sicurezza pari a 2 come richiesto dalla norma UNI EN 795)



DENOMINAZIONE: VERIFICA DEL PALO DI ANCORAGGIO H 450 PER LINEA VITA MODELLO PPLC 02					
ELABORATO : DOCUMENTAZIONE DI CALCO		DOCUMENTAZIONE DI CALCOLO	OLO		PPLC 02
03	25-11-2015	Progetto	Ing. Michele Guerini	M.G.	D.G.
REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO



# 3 - Calcolo delle azioni generate sui connettori trasmesse alla sottostruttura di ancoraggio




γ	2	cs	Coefficiente di sicurezza UNI 795 per verifica ancoraggi
Fx:	11,0	kN	Componente x
Fxy:	21,9	kN	Componente x amplificato del cs
F:	11,3	kN	Forza sulla linea
Fy:	22,7	kN	Forza sulla linea amplificato del cs
Fy:	2,9	kN	Componente Y
Fyy:	5,7	kN	Componente Y amplificato del cs
h:	0,45	m	Altezza del palo
Msx:	2,6	kN*m	Momento base palo direzione x
Msy:	9,9	kN*m	Momento base palo direzione y
V:	11,3	kN	Taglio base del palo
Vγ:	22,7	kN	Taglio base del palo amplificato del cs
Anc:	4		Numero di tasselli utilizzati
V anc:	5,7	kN	Taglio sui tasselli


DENOMINAZIONE:		VERIFICA DEL PALO DI ANCORAGGIO H 450 PER LINEA VITA MODELLO PPLC 02						
ELABORATO: DOCUMENTAZIONE DI CALCOLO			PPLC 0					
03	25-11-2015	Progetto	Ing. Michele Guerini	M.G.	D.G.			
REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO			



#### Ipotesi piastra 4 tasselli



Forza di trazione sul tassello dovuta al momento My Forza di trazione sul tassello dovuta al momento Mx Forza massima di trazione sul tassello in angolo

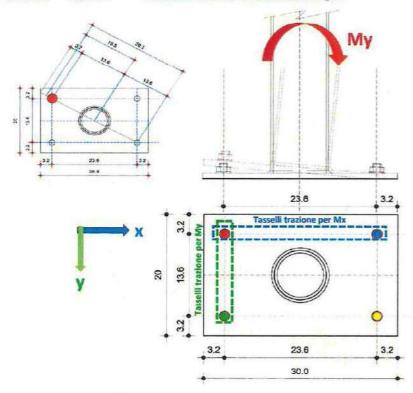


DENOMINAZIONE : VERIF		VERIFICA DEL PALO DI ANCORAGGIO H 45	VERIFICA DEL PALO DI ANCORAGGIO H 450 PER LINEA VITA MODELLO PPLC 02				
ELABORA	DOCUMENTAZIONE DI CALCOLO		PPLC 02				
03	25-11-2015	Progetto	Ing. Michele Guerini	M.G.	D.G.		
REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO		



#### Ipotesi piastra 6 tasselli

N anc X: 16,72 kN N anc y: 9,43 kN N anc max: 23,84 kN Forza di trazione sul tassello dovuta al momento My Forza di trazione sul tassello dovuta al momento Mx Forza massima di trazione sul tassello in angolo

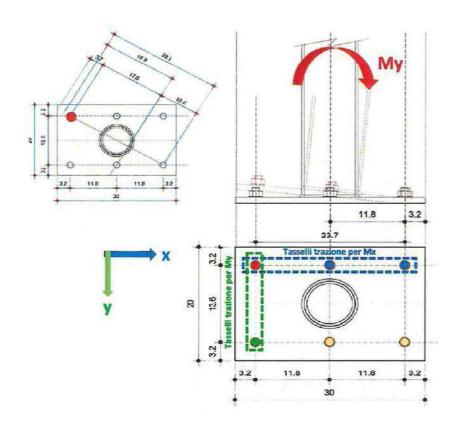


DENO					
ELABOF		3			02
03	25-11-2015	Progetto	Ing. Michele Guerini	M.G.	D.G.
REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO



### Ipotesi piastra 8 tasselli

N anc X: 11,94 kN N anc y: 9,43 kN N anc max: 21,36 kN Forza di trazione sul tassello dovuta al momento My Forza di trazione sul tassello dovuta al momento Mx Forza massima di trazione sul tassello in angolo

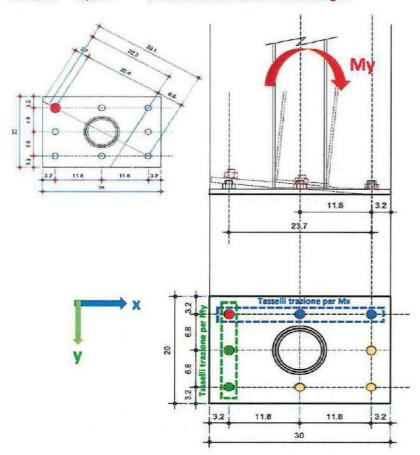

DENOM	INAZIONE:	VERIFICA DEL PALO DI ANCORAGGIO H 450 PER LINEA VITA MODELLO PPLC 02					
ELABORA	то:	DOCUMENTAZIONE DI CALCOLO	CALCOLO		PPLC 02		
03	25-11-2015	Progetto	Ing. Michele Guerini	M.G.	D.G.		
REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO		



I metodi di calcolo eseguiti sono in accordo con la Normativa vigente.

Colzate (Bg), novembre 2015

Il Professionista

POKER S.n.c. si occupa di testare e certificare secondo la UNI EN 795:12 il sistema generale dei dispositivi di ancoraggio, indicando le massime sollecitazioni che gli stessi impongono alla sottostruttura, fornendo alcune tipologie di ancoraggio standard impiegate e verificate durante la prova di certificazione. Il calcolo e la verifica degli ancoraggi (meccanici o chimici) e delle sottostrutture sulla quale i dispositivi di classe A e C vengono installati, deve essere esaminata e validata dal progettista strutturale dell'edificio generale, o da un ingegnere qualificato nominato dalla Committenza.

Il valore del carico indicato da POKER S.n.c. è da intendersi valido esclusivamente nel rispetto dell'impiego dei materiali da esso forniti (tipo di cavo metallico, tipo di assorbitore di energia, ecc.) ed in condizioni di corretto montaggio, perché l'entità della sollecitazione (essendo in presenza di un carico dinamico) dipende fortemente dalle caratteristiche dinamiche del sistema che si oppone alla caduta.

NOTA: Il seguente calcolo delle azioni sulle strutture è stato effettuato da Ns. Ingegnere strutturale (come richiesto da norma UNI EN 795:12) prendendo in considerazione la scheda tecnica del dispositivo in classe C che riporta i parametri strutturali minimi richiesti per la tenuta della struttura in conformità alla norma.

L'originale timbrato e firmato è depositato e consultabile presso gli uffici della POKER SNC.

DENOMINAZIONE: VERIFICA DEL PALO DI ANCORAGGIO H 450 PER LINEA VITA MODELLO PPLC 02					
ELABORA	то:	DOCUMENTAZIONE DI CALCOLO		PPLC 02	
03	25-11-2015	Progetto	Ing. Michele Guerini	M.G.	D.G.
REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO



# 5. CARATTERISTICHE FUNE

Materiale:

Fune diam. 8 mm in INOX AISI 316 EN 10088

Formazione:

7x19 fili preformati a destra incrociati + anima

metallica

Classe di resistenza:

147 daN/mm2

Carico rottura minima:

 $3.400 \, \mathrm{kg}$ 

Massa nominale:


0.244 PL (Kg/mt)

Grado di efficienza dell'applicazione: 0.9




## FORZA SVILUPPATA

Forze sul cavo per differenti interassi e lunghezze, valide per 3 persone

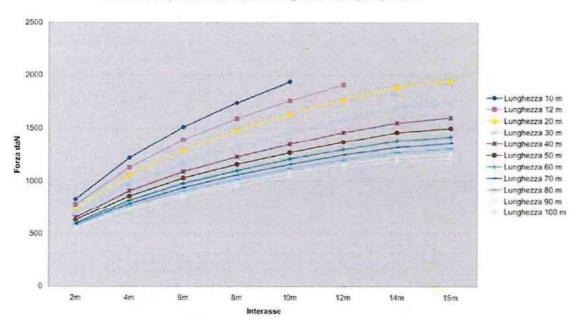

## FRECCIA SVILUPPATA

Freccia del cavo per diversi intereassi e lunghezze, valida per 3 persone

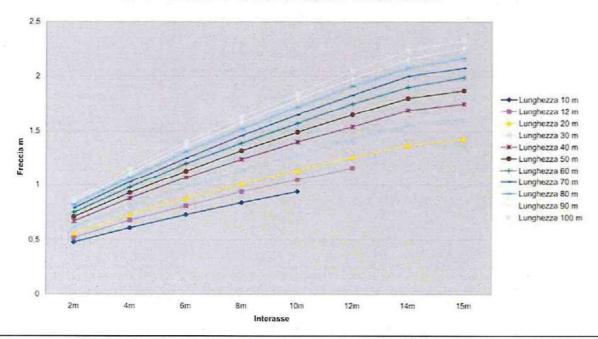

POKER S.n.c. Via Serio,6 - 24020 CASNIGO (BG) Tel. 035.710217 - Fax 035.725716

Web: www.lineevitapoker.it e.mail: info@lineevitapoker.it Cod. fiscale / P. IVA / Reg. Imp. Bg n° 03136400169 - R.E.A. Bg n° 352383



# 6. SCHEDE TECNICHE

# COD. E DESCRIZIONE DEI PRODOTTI INERENTI

PFI - A1 Punto d'ancoraggio fisso anello INOX CL. A1

PPLC2 02 Palo di ancoraggio D.90mm H.450mm base piana UNI-EN795 in classe A/C KT 60/80 Kit piastre per fissaggio su travetti L. 60/80 UNI-EN795 in classe A/C

KL-15 2 Kit linea vita 15Mt POKERLIFE per pali

El2 Elemento intermedio passante UNI-EN795 in classe C- INOX AISI-304 con inserto alluminio foro 36mm

EBM Elemento blocca moschettone

# CALCOLO DI VERIFICA STRUTTURALE

# **OGGETTO**

Verifiche sul sistema di fissaggio ,
degli ancoraggi per sistema anticaduta
Classe C UNI 795
da installarsi in copertura al complesso scolastico di
via A. Pellegrini a Genova

Committente:

OMEGA COSTRUZIONI



### 1. PREMESSA

La presente relazione di calcolo riguarda le verifiche di sicurezza ai sensi della UNI 795 relativamente alla applicazione su elementi strutturali di sistemi di anticaduta (linee-vita) da installarsi, a cura della ditta OMEGA COSTRUZIONI, sulla copertura piana del complesso scolastico di Via A. Pellegrini a Genova; in particolare, alla caldana collaborante in cls del solaio di copertura verranno installati sistemi anti-caduta Classe C con campata multipla (2 campate) e palo intermedio, del tipo di cui alla documentazione tecnica allegata;

# 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO


Allo scopo di cui alla premessa, la presente farà riferimento, nelle verifiche, alla Normativa EN 795, la quale, per la verifica all'evento dinamico di sistemi anticaduta classe C, prescrive di verificare le condizioni di carico nelle diverse casistiche. Tale forza viene, considerata applicata all'estremità del dispositivo, che verrà ancorato alla struttura per mezzo di nodo bullonato al cis della caldana con ancorante, secondo lo schema a piastre fornito dalla ditta produttrice del sistema linea vita in oggetto.

Il dispositivo è certificato dal fabbricante, quindi si condurrà il calcolo di verifica del suo ancoraggio alla struttura.

Si determineranno le sollecitazioni gravanti dall'utilizzo della linea vita con singolo operatore oppure doppio operatore.

# 3. CALCOLO DI VERIFICA

Dal grafico sotto riportato si possono valutare le sollecitazioni all'ancoraggio ultimo resistente a seconda della lunghezza di singola campata, del n di campate, e nel caso in cui siano ancorato n 1 o n 2 operatori.

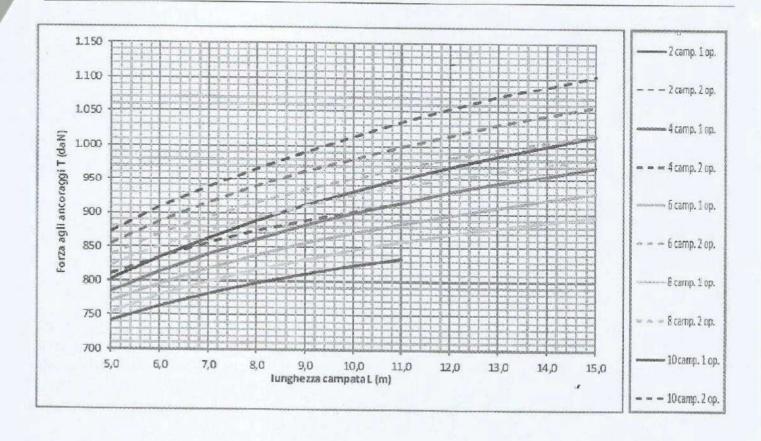

Tenendo conto che la linea vita verrà installata con due campate di dieci metri, i valori di calcolo che si svilupperanno nella configurazione di due operatori non risulterà superiore a 1020 kg

# Azione di calcolo sulla piastra di ancoraggio

Premesso che il sistema da installare è certificato per una sollecitazione massima al palo di 1800 daN, con la configurazione di carico individuata al punto precedente è stata effettuata modellazione agli elementi finiti con il Programma di calcolo Prosap, (si rimanda al link <a href="https://www.2si.it/wp-content/uploads/2022/10/Dichiarazione-Affidabilita.pdf">https://www.2si.it/wp-content/uploads/2022/10/Dichiarazione-Affidabilita.pdf</a> per la dichiarazione di affidabilità dei risultati) al fine di determinare le sollecitazioni sulle bullonature di piastra.

Si riportano di seguito i risultati del calcolo delle sollecitazioni agenti sugli ancoraggi di piastra.

# Verifica secondo il D.M. 17/01/2018 del nodo 2

# Coefficienti di sicurezza utilizzati

 $\gamma_{M0}=1.05$ 

 $\gamma_{_{\rm MI}}=1.10$ 

 $\gamma_{\text{M2}}=1.25$ 

#### Colonna

Tipo di profilo: Tondo 80x3

Materiale: Acciaio S275  $f_y = 275 \text{ N/mm}^2 f_z = 430 \text{ N/mm}^2 \gamma_{ov} = 1.25$ 

### Flangia:

Fornita per sollecitazione massima 1800 daN

## Bullonature:

Viti cl. 8.8 Dadi 8 o 10 (  $f_{yb} = 640 \text{ N/mm}^2$ ,  $f_{tb} = 800 \text{ N/mm}^2$ )

Diametro gambo  $\emptyset = 12 \text{ mm}$   $A_{res} = 84.8 \text{ mm}^2$  (ridotta per filettatura)

Diametro dado/testa d<sub>m</sub> = 19 mm

Diametro foro  $\mathcal{O}_0 = 13 \text{ mm}$ 

### Sollecitazioni:

ID O'RE & WINDOWS CONTRA						
Nodo.CMB	V2 [N]	V3 [N]	N [N]	M2 [N mm]	M3 [N mm]	T[N mm]
2.1	0.0	0.0	-49.0	0.0	0.0	0.0
2.2	15300.0	0.0	-49.0	0.0	-6885000.0	0.0
2.3	0.0	0.0	-37.7	0.0	0.0	0.0
2.4	15300.0	0.0	-37.7	0.0	-6885000.0	0.0
2.5	0.0	0.0	-37.7	0.0	0.0	0.0
2.6	8160.0	0.0	-37.7	0.0	-3672000.0	0.0

### Calcolo resistenze

Resistenza a trazione dei bulloni	$F_{tb,Rd} = 0.9 \cdot f_{tb} \cdot A_{res} / \gamma_{M2} =$	48858.1 N
Resistenza a punzonamento flangia $B_{pf,R}$	$_{\rm d} = 0.6 \cdot \pi \cdot d_{\rm m} \cdot t_{\rm f} \cdot f_{\rm tk} / \gamma_{\rm M2} =$	123200.7 N

	1	Dt.Kd	
Bull.	F <sub>f,Rd</sub> [N]	$F_{t,Rd}[N]$	
1		48858.1	
2		48858.1	
3	12167.5	12167.5	
4	12167.5	12167.5	
5	-	48858.1	*
6	~	48858.1	
7		48858.1	
8	-	48858.1	
9	12167.5	12167.5	
10	12167.5	12167.5	
11		48858.1	
12		48858.1	
Legenda			

$$\begin{split} &F_{_{f,Rd}} = M_{_{res,m}} \, / \, (\,\, B_{_{to}} \, \bullet \, R_{_{ro}} \,) \ \, \text{resistenza a flessione flangia} \\ &F_{_{f,Rd}} = min \, [\,\, F_{_{fb,Rd}} \, , \, B_{_{pf,Rd}} \, , \, F_{_{f,Rd}} \,] \ \, \text{resistenza a trazione di progetto} \end{split}$$

Resistenza a ta	glio dei bulloni	F <sub>vb,Rd</sub> =	= $0.6 \cdot f_{ib} \cdot A_{res} / \gamma_{M2} =$		32572.0 N
Bull,	F <sub>bf,x,Rd</sub> [N]	F <sub>v,x,Rd</sub> [N]	F <sub>bfvRd</sub> [N]	F <sub>v,y,Rd</sub> [N]	
1	87323.1	32572.0	103200.0	32572.0	
2	87323.1	32572.0	103200.0	32572.0	
3	87323.1	32572.0	103200.0	32572.0	
4	87323.1	32572.0	103200.0	32572.0	
5	87323.1	32572.0	103200.0	32572.0	
6	87323.1	32572.0	103200.0	32572.0	
7	87323.1	32572.0	103200.0	32572.0	
8	87323.1	32572.0	103200.0	32572.0	
9	87323.1	32572.0	103200.0	32572.0	
10	87323.1	32572.0	103200.0	32572.0	
11	87323.1	32572.0	103200.0	32572.0	
12	87323.1	32572.0	103200.0	32572.0	
Legenda					
100	220 220 23	10 STEEL			

$$\begin{split} F_{_{bf,x,Rd}} &= k * \alpha * f_{_{ik}} * \varnothing * t_{_{f}} / \gamma_{_{M2}} \text{ resistenza a rifollamento flangia in direzione x} \\ F_{_{v,x,Rd}} &= \min \left[ \ F_{_{vb,Rd}} \ , \ F_{_{bf,x,Rd}} \ \right] \text{ resistenza a taglio di progetto in direzione x} \\ F_{_{bf,y,Rd}} &= k * \alpha * f_{_{ik}} * \varnothing * t_{_{f}} / \gamma_{_{M2}} \text{ resistenza a rifollamento flangia in direzione y} \\ F_{_{v,x,Rd}} &= \min \left[ \ F_{_{vb,Rd}} \ , \ F_{_{bf,y,Rd}} \ \right] \text{ resistenza a taglio di progetto in direzione y} \end{split}$$

## Verifiche sui bulloni

1-Tagli	o e trazione	(Nodo n. 2, C	MB n. 4)						
Bull.	X [mm]	Y [mm]	F <sub>v,Ed</sub> [N]	$_{\rm vRd}$ [N]	F <sub>tEd</sub> [N	1	F <sub>t,Rd</sub> [N]	FV,	VER
1	67.00	-400.00	1275.0	32572.0	0.0	0	48858.1	0.039144	Ok
2	67.00	-300.00	1275.0	32572.0	0.0	0	48858.1	0.039144	Ok
3	67.00	-118.00	1275.0	32572.0	450.	0	12167.5	0.065563	Ok
4	67.00	118.00	1275.0	32572.0	1093.	2	12167.5	0.103321	Ok
5	67.00	300.00	1275.0	32572.0	1589.	2	48858.1	0.062378	Ok
6	67.00	400.00	1275.0	32572.0	1861.	8	48858.1	0.066362	Ok
7	-67.00	-400.00	1275.0	32572.0	0.	0	48858.1	0.039144	Ok
. 8	-67.00	-300.00	1275.0	32572.0	0.	0	48858.1	0.039144	Ok
9	-67.00	-118.00	1275.0	32572.0	450.	0	12167.5	0.065563	Ok
10	-67.00	118.00	1275.0	32572.0	1093.	2	12167.5	0.103321	Ok
11	-67.00	300.00	1275.0	32572.0	1589.	2	48858.1	0.062378	Ok
12	-67.00	400.00	1275.0	32572.0	1861.	8	48858.1	0.066362	Ok
2-Trazi	ione (Nodo	n. 2, CMB n.	4)		*				
Bull.	X [mm]	Y [mm]	F <sub>t,Ed</sub> [N]	F <sub>t,Rd</sub> [N]	FV <sub>2</sub>	VER			
1	67.00	-400.00	0.0	48858.1	0.000000	Ok			
2	67.00	-300.00	0.0	48858.1	0.000000	Ok			
3	67.00	-118.00	450.0	12167.5	0.036986	Ok			
4	67.00	118.00	1093.2	12167.5	0.089847	Ok			
5	67.00	300.00	1589.2	48858.1	0.032528	Ok			
6	67.00	400.00	1861.8	48858.1	0.038106	Ok			
7	-67.00	-400.00	0.0	48858.1	0.000000	Ok			
8	-67.00	-300.00	0.0	48858.1	0.000000	Ok			
				5					

9	-67.00	-118.00	450.0	12167.5	0.036986	Ok
10	-67.00	118.00	1093.2	12167.5	0.089847	Ok
11	-67.00	300.00	1589.2	48858.1	0.032528	Ok
12	-67.00	400.00	1861.8	48858.1	0.038106	Ok
Legend	la		CRATIA	1555512	0.030100	OK

F<sub>v.Ed</sub> forza di taglio agente sul bullone

 $F_{v,Rd}$  resistenza a taglio di progetto del bullone

F, forza di trazione agente sul bullone

F<sub>t,Rd</sub> resistenza a trazione di progetto del bullone

 $FV_1 = F_{v,Ed} / F_{v,Rd} + F_{t,Ed} / (1.4 \cdot F_{t,Rd})$ 

 $\mathrm{FV}_{2}^{'} = \mathrm{F}_{\mathrm{t,Ed}}^{'} \, / \, \mathrm{F}_{\mathrm{t,Rd}}^{'}$ 

 $VER \rightarrow FV \le 1$ 

Utilizzando ancorante Wurth Wit P 200, dalla scheda tecnica si rileva che per bullonature diaemetro 12 e che con coefficiente di sicurezza pari a 4, per profondità di ancoraggio pari ad 11 cm i carichi ammissibili risultano essere pari a 1000 daN in trazione e 1200 daN in taglio. Considerando che i valori agenti nelle condizioni considerate non superano, sia intrazione che in taglio i 200 daN, si ritiene l'ancoraggio verificao anche in ragione della dimezzata profondità di ancoraggio alla sola caldana collaborante di 5 cm


# 4. CONCLUSIONI

A seguito delle verifiche effettuate si ritiene che l'installazione dei sistemi anticaduta di cui alla documentazione allegata sia da ritenersi idonea allo scopo.


Genova, lì 20/08/2022



# DISPOSITIVO PER PROTEZIONE CADUTE DALL'ALTO EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013 CLASSE A - C

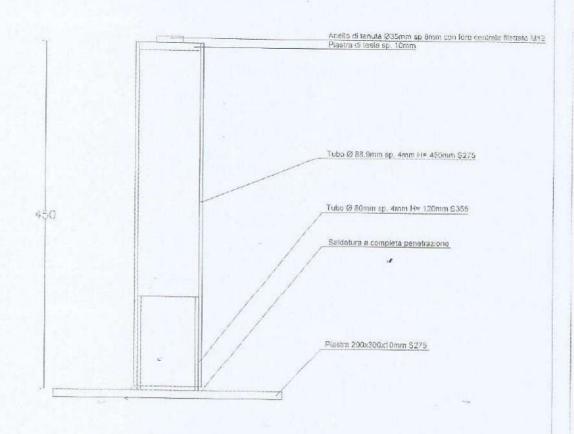

Senso dello sforzo Max. 1600 dalv

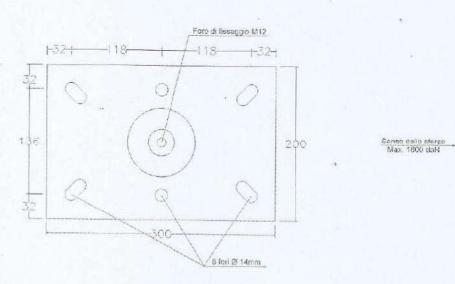

Il calcolo e la verifica degli ancoraggi (meccanici o chimici) e della sottostruttura sulla quale i dispositivi di classe A e C vengono installati, deve essere esaminata e validata dai progettista strutturale o da un ingegnere qualificato nominato dalla Committenza.




POKER S.n.c. Via Serio, 6 - 24020 CASNIGO (BG)
Tel. 035.710217 - Fax 035.725716
Web: www.lineevitapoker.it - Email: info@lineevitapoker.it
Cod. fiscale / P, IVA / Reg. Imp. Bg n° 03136400169 R.E.A. Bg 352383


ARTICOLO:


PPLC2 02

PALO BASE PIANA H.450mm

# DISPOSITIVO PER PROTEZIONE CADUTE DALL'ALTO EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013 CLASSE C

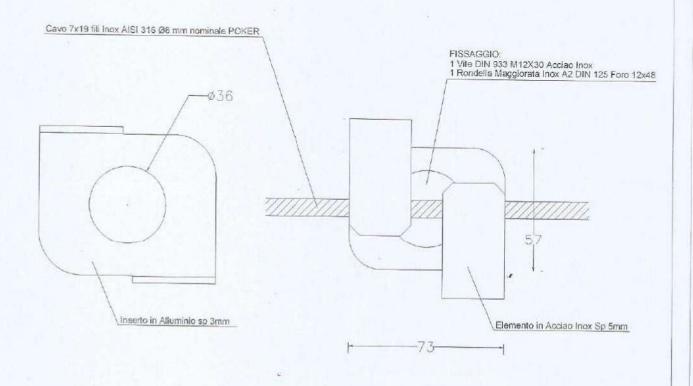









# DISPOSITIVO PER PROTEZIONE CADUTE DALL'ALTO EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013

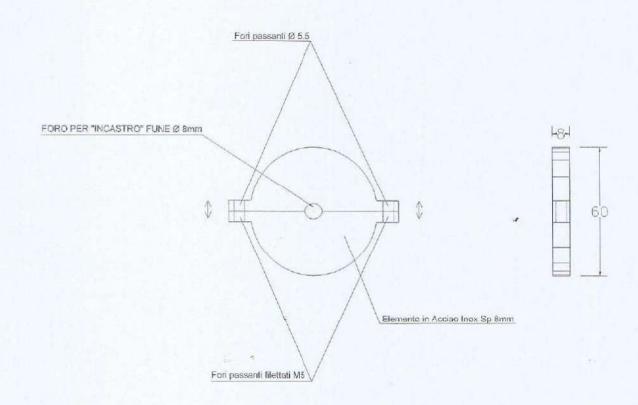



MEZZE LUNE DA ASSEMBLARE TRAMITE VITE M5 CON FORO CENTRALE PER INCASTRO FUNE



POKER S.n.c. Via Serio, 6 - 24020 CASNIGO (BG) Tel. 035.710217 - Fax 035.725716 Web: www.lineevitapoker.it - Email: info@lineevitapoker.it Cod. fiscale / P. IVA / Reg. Imp. Bg n° 03136400169 R.E.A. Bg 352383 ARTICOLO:

**EBM** 

ELEMENTO INTERMEDIO BLOCCA MOSCHETTONE SU FUNE Ø 8

2.00 affezza di encluta < 2.00 affezza di caduta >2.0) Elemento invisorme do passeantie-passacovo.
 a nepolar fune des alla intributa la populativo e info evida nella bura alti intributati nella pera di esconya in chero d'A. e sere info mare i la DIM-MODE, cer i i la Dippera altezza di caduta < 2,00 Pais of ancoraggis 6/90 mm is bose plana plana CL C-A Planto d'ancoraggis (8/90 ad anello in tierx CL A Finis matellica 9/8 erm in incx Alsi 315

Accesso tatlo - DA VERIFICANE | Elemento alcoca moschellone alterna di cadula « 2.00) Geosth, Guerlini 22025 338/6% Le processió Nulla di escribia en culo como se della culta escribia POPER escribia per escolo in con montre de despressiones en consistencia de la presenta sedecia della programa se escribia en escribia della confessione PREV. nº DATA DISEG.

SABITNAS

PIANTA DI COPERTURA BUZZA DI POSIZIONAMENTO

POKER

GUERINI GEOM. MASSIMO

SERMIT



# ANCORANTE CHIMICO WITEP 200



descrizione	Art.
cartuccia coassiale da 420 ml	5918 200 420
miscelatore statico brevettato Fill&Clean	0903 420 020

# Campi d'impiego:

- per ancoraggi pesanti in calcestruzzo, muratura piena (mattoni pieni) e muratura forata (mattoni e blocchi forati e semipieni)
- · in muratura forata, eseguire il foro a sola rotazione (senza percussione) onde salvaguardare le camere interne dei mattoni e utilizzare con bussole a rete o a calza
- · per il fissaggio di macchinari, ringhiere e recinzioni, puntoni e travi in metallo, finestre, lavabi, termosifoni, tende da sole, mobili pensili, mensole, inferiate, ecc.
- · per l'impiego in pietre naturali chiare è consigliato il WIT-EA 150 in quanto la WIT-P 200 può provocare aloni

# Resina poliestere senza stirene per impieghi universali

# Certificati: **Test Report LEED**

### Caratteristiche:

- ancorante chimico bicomponente di alta qualità e con ottime caratteristiche tixotropiche
- conforme ai requisiti LEED secondo EQ c4.1
- utilizzare sempre con miscelatore statico fornito insieme alla cartuccia
- resistente a temperatura continuativa +50°C e temporanea max. +80°C

# Vantaggi:

- di qualità superiore delle alfre resine poliestere presenti
- · un solo tipo di resina per l'impiego su più tipi di supporto
- il miscelatore statico Fill&Clean facilita la pulizia in quanto dotato di spatola di pulizia
- senza stirene e quindi poco odorante
- media resistenza agli agenti chimici ed atmosferici
- ancoraggio di diversi accessori come barre filettate, ganci, occhioli, bussole filettate ecc.

#### Istruzioni di posa in calcestruzzo e muratura piena:









Estradere min. 10 cm di resina prima dell'utilizza



basso del lare











#### Istruzioni di posa in muratura forata:









vitare il sculatore statico







resina pomendo dol basso della





Altesa dell'in-





# ANCORANTE CHIMICO WIT-P 200

Dati tecnici:

misure		M8	M10	M12	M16	M20
in calcestruzzo C20/25	trazione/kN	4,7	7,1	10,0	11,2	18,8
(zona compressa)	taglio/kN	5,1	8,3	12,0	22,3	34,9
in <b>muratura piena</b> (con prof. di ancoraggio 80 mm)	trazione e taglio/kN	1,7	1,7	1,7	1,7	+
distanza caratteristica tra ancoranti	s <sub>cr,N</sub> /mm	240	270	330	375	510
distanza minima tra ancoranti	s <sub>min</sub> /mm	40	50	60	80	100
distanza caratteristica dai bordi	c <sub>cr.N</sub> /mm	120	135	165	187	255
distanza minima dai bordi	c <sub>min</sub> /mm	40	50	60	80	100
diametro del foro	d <sub>O</sub> /mm	10	12	14	18	24
profondità foro = profondità ancoraggio	h <sub>0</sub> =h <sub>e</sub> /mm	80	90	110	125	170
spessore minimo supporto	h <sub>min</sub> /mm	110	120	140	160	220
cappia di serraggio	Nm	10	20	40	60	120

(1 kN = 100 kg)

Nate: I carichi sopra descritti sono comprensivi di un coefficiente di sicurezza ≥ 4 e si riferiscono ad ancoranti montati senza influenza da bordi o altri ancoranti. Per realizzare fissaggi con distanze tra ancoranti o dai bordi inferiori ai valori caratteristici bisogna ridurre i carichi.

Ancoraggi in muratura forața: carichi massii	ni consigliati con barre filettate	5.8 e con	dizioni di pos	a	
misure		M6	M8	M10	M12
mattoni e blocchi semipieni (es. doppio UNI)	trazione e taglio/kN	0,8	1,0	1,2	1,2
mattoni e blocchi forati leggeri	trazione e taglio/kN	0,5	0,6	0,6	0,6
distanza tra gli ancoranti ≥ mm		200			
distanza dai bardi ≥ mm		200			
dimensioni del foro		in dipendenza dalle dimensioni della bus		ella bussola	
coppia di serraggio	Nm	3	5	8	8


 $(1 \text{ kN} \cong 100 \text{ kg})$ 


Note: A causa delle differenti caratteristiche dei materiali forati non è possibile indicare carichi precisi. Per la determinazione della effettiva capacità di portata della muratura si raccomanda di effettuare prove in cartiere.
In ogni caso il carico di rottura dell'ancorante chimico è superiore alla tenuta del mattone forato.

Tempi di lavorazione e di applicazione del carico:					
temperatura nel fondo del foro;	tempo max. di lavorazione/minuti	tempo di applicazione del carico/minuti			
+5°C	25	120 "			
+10°C	15	80			
+20°C	6	45			
+25°C	5	35			
+30°C	4	25			

Temperatura della resina e della barra d'ancoraggio min. +5° Temperatura di stoccaggio tra +5 e + 25°C in luogo asciutto ed al riparo dal sole

Consiglio: usare termametra ad infrarossi







Sede Legale

Via Piacenza,84r - 16138 GENOVA

Tel. 010/8380304 - Fax. 010/8358623 e-mail: amministrazione@eurocolors.net

pec: eurocolors@aep-ped.it

Partita IVA: 01177560990

cod sdi: SUBM70N

Spett.le OMEGA COSTRUZIONI SRL Via Orefici 36 92020 San Giovanni Gemini - AG omegacostruzioni-srl@libero.it

Genova, 08/11/2022

Oggetto: Lettera di correzione Formulario di identificazione Rifiuti EDM 693433/22 del 04/11/2022 Cod. CER 170201

La presente per informarVi che nel FIR in oggetto, per un mero errore materiale, non è stata indicata nel Campo 1 - Detentore , la Partita Iva che deve intendersi: 02538540846. Fermo il resto.

Vogliate gentilmente allegare la presente al Formulario sopraindicato e di consideraria parte integrante dello stesso.

Cordiali saluti.

Eurocolors S.a.s.

**Gestione Rifluti** 

7 H R - 16154 GE la, 84 R - 16138 GE

8949871 - P.I. 01177560990

Passo Morigallo, 3



Via D. Somma, 44/46/48 R

The state of the s

ALLEGATO B

(\*) Dal primo giugno 2015 si applica il Nuovo Elenco Europeo del Rifluti contenuto nella Decisione 2014/955/UE (GUUE del 30 dicembre 2014)

(\*) Dal primo giugno 2015 si applica il Nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti contenuto nella Decisione 2014/955/UE (GUUE del 30 dicembre 2014)

ALLEGATO B

(\*) Dal primo giugno 2015 si applica il Nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti contenuto nella Decisione 2014/955/UE (GUUE del 30 dicembre 2014)

ALLEGATO B

(\*) Dal primo giugno 2015 si applica il Nuovo Etenco Europeo dei Rifiuti contenuto nella Decisione 2014/955/UE (GUUE del 30 dicembre 2014)

ALLEGATO B

MODELLO CONFORME









Data Fine Prove 03/08/2022

Spett.le Omega Costruzioni srl Via Orefici, 36 92020 San Giovanni Gemini (AG)

#### RAPPORTO DI PROVA Nº 1353/22

Data emissione 03/08/2022

Tipo campione Rifiuto
Data ricevimento campione 29/07/2022

Descrizione campione Guaina bituminosa proveniente da interventi di ripristino copertura corpo atrio A - Asili Nido "il Bruco Pellegrino".

MOGE 20899 - CIG: 9100743AB2 - CUP: B37H21009850004

Luogo del prelievo Via Pellegrini, 19 - Genova

 Data prelievo
 29/07/2022

 Campionatore
 Committente

 Confezione campione
 Busta plastica

Conservazione campione Temperatura Ambiente
Restituzione campione Si: ritira il cliente

Campo1 17 03 02 : miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame - miscele bituminose diverse da

Data Inizio Prove 29/07/2022

quelle di cui alla voce 17 03 01

Protocollo Campione 1407/1 del 29/07/22

Etichetta/Lotto 1407 tq

		PROMERRY OF TOURS OF A TOUR	ACCESSAGE AND AC	Appeter appearance of	/ Comment	5-0/90-5/0M660-1	631124001
Indagine Metodo	eseguita	Risultato	U.M	Metodo	LQ	Limiti	Rif.
Cadmio s.	S.	0,12	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,05	v. cod pericoli	UE1272
CAS:	7440-43-9	Cod. Pericoli: H330	0-2;H341;H35	0;H372;H410;H361			
Arsenico		0,22	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,5	v. cod pericoli	UE1272
CAS:	7440-38-2	Cod. Pericoli: H410	);H331;H301;	H400			
Cromo tota	ale	0,23	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,5	v. cod pericoli	UE1272
CAS:	7440-47-3	Cod. Pericoli: H334	1;H319;H400;	H410			
Nichel		Inferiore al limite minimo di	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,5	v. cod pericoli	UE1272
		quantificazione					
CAS:	7440-02-0	Cod. Pericoli: H317	7;H351;H372				
Piombo		Inferiore al limite minimo di	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,5	v. cod pericoli	UE1272
		quantificazione					
CAS:	7439-92-1	Cod. Pericoli: H373	3;H360;H332;	H302;H410;H400			
Zinco		0,15	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,5	v. cod pericoli	UE1272
CAS:	7440-66-6	Cod. Pericoli: H260	);H250;H400;	H410			









Indagine Metodo	eseguita	Risultato	U.M	Metodo	LQ	Limiti	Rif.
Selenio		0,23	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,5	v. cod pericoli	UE1272
CAS:	7782-49-2	Cod. Pericoli: H413	;H331;H301;				
Mercurio		Inferiore al limite minimo di	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,5	v. cod pericoli	UE1272
CAS:	7439-97-6	quantificazione Cod. Pericoli: H372	;H330-2;H41	0;H360;H400			
Rame e i s	suoi composti	Inferiore al limite minimo di quantificazione	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,05	v. cod pericoli	UE1272
CAS:	1317-39-1	Cod. Pericoli: H332	;H302;H318;	H400;H410			
Stagno e s	suoi composti	Inferiore al limite minimo di quantificazione	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	1	v. cod pericoli	UE1272
CAS:	7440-31-5	Cod. Pericoli: H335	;H319				
Berillio		0,6	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	1	v. cod pericoli	UE1272
CAS:	7440-41-7	Cod. Pericoli: H350	;H330-2;H30	1;H372;H319;H335;H315;H317			
Manganes	se (Mn)	4,2	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	1	v. cod pericoli	UE1272
CAS:	7439-96-5	Cod. Pericoli: H319	;H228	11005.2009			
Idrocarbur	i C10-C40	Inferiore al limite minimo di quantificazione	mg/Kg	UNI EN 14039:2005	1		
	BURI POLICICLICI	*		IRSA CNR 25 Q.64 Vol.3			
AROMATI Na	aftalene	Inferiore al limite minimo di	mg/Kg		0,01	≤ 10	UE1342
j	CAS: 91-20-3	quantificazione Cod. Pericoli: H302	;H351;H400;	H410			
Ac	cenaftilene	Inferiore al limite minimo di	mg/Kg		0,01	≤ 10	UE1342
	CAS: 208-96-8	quantificazione Cod. Pericoli: H310	)-1;H330-1;H	302;H315;H319;H335			
Ac	cenaftene	Inferiore al limite minimo di	mg/Kg		0,01	≤ 10	UE1342
	CAS: 83-32-9	quantificazione Cod. Pericoli: H319	;H400;H410;	H411;H315;H335			
Flu	uorene	Inferiore al limite minimo di quantificazione	mg/Kg		0,01	≤ 10	UE1342
	CAS: 86-73-7		;H410;H411;	H315;H319;H302;H317;H319;H	335		
Fe	enantrene	Inferiore al limite minimo di quantificazione	mg/Kg		0,01	≤ 10	UE1342









GESTIONE RIFIUTI | ALBO GEST AMB | iscr. cat 8 cat 10 PA14557

agine eseguita todo	Risultato	U.M	Metodo	LQ	Limiti	Rif.
CAS: 85-01-8	Cod. Pericoli: H302	:H400;H410;H31	5;H317;H351;H319;H3	335		
Antracene	Inferiore al limite minimo di quantificazione	mg/Kg		0,01	≤ 10	UE1342
CAS: 120-12-7	Cod. Pericoli: H315	:H319;H317;H40	0;H410;H335			
Pirene	Inferiore al limite minimo di	mg/Kg		0,01	s 10	UE1342
CAS: 129-00-00	quantificazione	·U310·U335·U40	0;H410;H302;H332;H4	113·H330_1		
Benzo(a)antracene	Inferiore al limite	mg/Kg	0,11410,11302,11332,11	0,01	≤ 10	UE1342
Benzo(a)ana doene	minimo di quantificazione	mgmg		0,01	3 10	
CAS: 56-55-3	Cod. Pericoli: H350	:H400;H410				
Crisene	Inferiore al limite minimo di	mg/Kg		0,01	≤ 10	UE1342
CAS: 218-01-9	quantificazione Cod. Pericoli: H350	:H400;H341;H41	0			
Benzo(b)fluorantene	Inferiore al limite minimo di	mg/Kg		0,01	≤ 10	UE1342
CAS: 205-99-2	quantificazione Cod. Pericoli: H350	:H400;H410				
Benzo(k)fluorantene	Inferiore al limite minimo di	mg/Kg		0,01	< 10	UE1342
CAS: 207-08-9	quantificazione Cod. Pericoli: H350					
Benzo(a)pirene	Inferiore al limite minimo di	mg/Kg		0,01	≤ 10	UE1342
CAS: 50-32-8	quantificazione Cod. Pericoli: H317	;h340;H350;H36	0;H400;H410			
Indeno(1,2,3-cd)pirene	Inferiore al limite minimo di	mg/Kg		0,01	≤ 10	UE1342
CAS: 193-39-5	quantificazione Cod. Pericoli: H351					
Dibenzo(a,h)antracene	Inferiore al limite minimo di	mg/Kg		0,01	≤ 10	UE1342
CAS: 57-70-3	quantificazione Cod. Pericoli: H350	:H400;H410				
Benzo(ghi)perilene	Inferiore al limite minimo di quantificazione	mg/Kg		0,01	≤ 10	UE1342
CAS: 191-24-2	Cod. Pericoli: H400	:H410;H413				
Fluorantene	Inferiore al limite minimo di quantificazione	mg/Kg		0,01	≤ 10	UE1342
CAS: 206-44-0	Cod. Pericoli: H302	:H410:H400:H31	9;H332			









Indagine eseguita Metodo	Risultato	U.M	Metodo	LQ	Limiti	Rif.
Dibenzo(a,e)pirene	Inferiore al limite minimo di quantificazione	mg/Kg		0,01	≤ 10	UE1342
CAS: 192-65-4	Cod. Pericoli: H350	:H341				
Dibenzo(a,h)pirene	Inferiore al limite minimo di quantificazione	mg/Kg		0,01	≤ 10	UE1342
CAS: 189-64-0	Cod. Pericoli: H341	:H350				
Dibenzo(a,i)pirene	Inferiore al limite minimo di quantificazione	mg/Kg		0,01	≤ 10	UE1342
CAS: 189-55-9	Cod. Pericoli: H341	:H350				
Dibenzo(a,l)pirene	Inferiore al limite minimo di quantificazione	mg/Kg		0,01	≤ 10	UE1342
CAS: 191-30-0	Cod. Pericoli: H341	:H350				
Benzo(e)acefenantrilene	Inferiore al limite minimo di	mg/Kg		0,01	≤ 10	UE1342
CAS: 205-99-2	quantificazione Cod. Pericoli: H350	:H400:H410				
Benzo(e)pirene	Inferiore al limite minimo di	mg/Kg		0,01	≤ 10	UE1342
CAS: 192-97-2	quantificazione Cod. Pericoli: H350	:H400;H410				
Benzo(j)fluorantene	Inferiore al limite minimo di quantificazione	mg/Kg		0,01	≤ 10	UE1342
CAS: 205-82-3	Cod. Pericoli: H350	F		020023	E 194	(1)
Somm. policiclici aromatici	inferiore al limite di quantificazione	mg/Kg		0,01	≤ 10	UE1342
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI			IRSA CNR 23 b Q.64 Vol.3			
Sommatoria	Inferiore al limite minimo di quantificazione					
MTBE	Inferiore al limite minimo di quantificazione					
cumene	Inferiore al limite minimo di	mg/Kg s.s.		0,05	v. cod pericoli	UE1272
CAS: 98-82-8	quantificazione Cod. Pericoli: H226	·H304·H335·H41	11			
trimetilbenzene	Inferiore al limite minimo di		6. Es			
CAS: 95-63-6	quantificazione Cod. Pericoli: H226	:H315;H319;H33	32;H335;H411			









Indagine eseguita Metodo	Risultato	U.M	Metodo	LQ	Limiti	Rif.
dipentene  CAS: 138-86-3	Inferiore al limite minimo di quantificazione Cod. Pericoli: H226	mg/Kg s.s.	H400·H410	0,05	v. cod pericoli	UE1272
benzene	Inferiore al limite minimo di	mg/Kg s.s.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		v. cod pericoli	UE1272
CAS: 71-43-2	quantificazione Cod. Pericoli: H225	5;H304;H315;	H319;H340;H350;H372;H412			
etilbenzene	Inferiore al limite minimo di quantificazione	mg/Kg s.s.			v. cod pericoli	UE1272
CAS: 100-41-4	Cod. Pericoli: H225		H373;H412			paletanistellower is
stirene	Inferiore al limite minimo di quantificazione	mg/Kg s.s.			v. cod pericoli	UE1272
CAS: 100-42-5	Cod. Pericoli: H226	5;H315;H319;	H332;H361;H372			
toluene	Inferiore al limite minimo di	mg/Kg s.s.			v. cod pericoli	UE1272
CAS: 108-88-3	quantificazione Cod. Pericoli: H225	5:H304:H315:	H336;H361;H373;H412			
xilene	Inferiore al limite minimo di	mg/Kg s.s.		0,05	v. cod pericoli	UE1272
CAS: 1330-20-7	quantificazione Cod. Pericoli: H226	6;H312;H315;	H332;H319;H335;H373;H304;F	1412		
Policlorobifenili (PCB)	Inferiore al limite minimo di	mg/Kg	EPA 3550C 2000 + EPA 8270D 1998	5	≤ 50	UE1342
CAS: 1336-36-3	quantificazione Cod. Pericoli: H410	);H400;H373				
Inquinanti Organici Persistenti (°)		10 TV				
esabromociclododecano	Inferiore al limite minimo di	mg/Kg			≤ 1.000	UE1342
CAS: 25637-99-4	quantificazione Cod. Pericoli: H400	);H361;H362;	H410			
endosulfan	Inferiore al limite minimo di guantificazione	mg/Kg			≤ 50	UE1342
CAS: 115-29-7	Cod. Pericoli: H300	D-1;H312;H33	0-2;H400;H410			
esaclorobutadiene	Inferiore al limite minimo di	mg/Kg			≤ 100	UE1342
CAS: 87-68-3	quantificazione Cod. Pericoli: H302	2;H312;H315;	H317;H332;H400			
naftaleni policlorurati (PCN)	Inferiore al limite minimo di quantificazione	mg/Kg			< 10	UE1342









gine eseguita odo	Risultato	U.M	Metodo	LQ	Limiti	Rif.
Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP)	Inferiore al limite minimo di quantificazione	mg/Kg			≤ 10.000	UE1342
CAS: 85535-84-8	Cod. Pericoli: H35	1;H400;H410				
tetrabromodifeniletere	Inferiore al limite minimo di	mg/Kg			≤ 1.000	UE1342
pentabromodifeniletere	quantificazione Inferiore al limite minimo di	mg/Kg			≤ 1.000	UE1342
esabromodifeniletere	quantificazione Inferiore al limite minimo di	mg/Kg			≤ 1.000	UE1342
eptabromodifeniletere	quantificazione Inferiore al limite minimo di	mg/Kg			≤ 1.000	UE1342
decabromodifeniletere	quantificazione Inferiore al limite minimo di quantificazione					
DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofe niletano)	Inferiore al limite	mg/Kg			≤ 50	UE1342
CAS: 50-29-3	Cod. Pericoli: H30	2;H332;H351;H36	);H362;H372;H411			
clordano	Inferiore al limite minimo di quantificazione	mg/Kg			≤ 50	UE1342
CAS: 57-74-9	Cod Pericoli: H30	2;H312;H351;H400	);H410			
esaclorocicloesani (compreso lindano)	Inferiore al limite minimo di	mg/Kg			≤ 50	UE1342
CAS: 608-73-1	quantificazione Cod. Pericoli: H30	1:H312:H332:H37	3:H400:H410			
dieldrin	Inferiore al limite minimo di	mg/Kg	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		≤ 50	UE1342
CAS: 60-57-1	quantificazione Cod. Pericoli: H30	1;H310-1;H351;H3	72;H400;H410			
endrin	Inferiore al limite minimo di	mg/Kg			≤ 50	UE1342
CAS: 72-20-8	quantificazione Cod. Pericoli: H30	0-2;H311;H400;H4	10			
eptacloro	Inferiore al limite minimo di quantificazione	mg/Kg			≤ 50	UE1342
CAS: 76-44-8	Cod. Pericoli: H30	0-2;H351;H373;H4	10			
esaclorobenzene	Inferiore al limite minimo di quantificazione	mg/Kg			≤ 50	UE1342









Indagine ese	guita	Risultato	U.M	Metodo	LQ	Limiti	Rif.
V	118-74-1	Cod. Pericoli: H35	0i;H372;H400;I	H410			
clordece	one	Inferiore al limite minimo di quantificazione	mg/Kg			≤ 50	UE1342
CAS:	143-50-0	Cod. Pericoli: H30	1;H311;H351;F	H400;H410			
aldrin		Inferiore al limite minimo di quantificazione	mg/Kg			s 50	UE1342
CAS:	309-00-2	Cod. Pericoli: H40	0;H410;H311;H	H301;H351;H372			
pentacle	probenzene	Inferiore al limite minimo di quantificazione	mg/Kg			≤ 50	UE1342
CAS:	608-93-5	Cod. Pericoli: H22	8;H302;H400;H	H410			
mirex		Inferiore al limite minimo di quantificazione	mg/Kg			≤ 50	UE1342
CAS:	2385-85-5		2;H312;H351;F	H361;H362;H400;H410			
toxafen	е	Inferiore al limite minimo di quantificazione	mg/Kg			≤ 50	UE1342
CAS:	8001-35-2	Cod. Pericoli: H30	1;H312;H315;F	H335;H351;H400;H410			
esabror	nobifenile	Inferiore al limite minimo di quantificazione	mg/Kg			< 50	UE1342
CAS:	36355-01-8	Cod. Pericoli: H35	1				
ed este		Inferiore al limite minimo di quantificazione	4.1.1044.1.1004.1	1054-11400-11440-11045-11040-1	1005		
	87-86-5			H351;H400;H410;H315;H319;F	1335	0.29	1154242
	erfluorottano sulfonato rivati (PFOS)	Inferiore al limite minimo di quantificazione	mg/ Kg			≤ 50	UE1342
Н		7,6	Unità di pH	CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1985		[5,5 - 12]	5.2.98
RESIDUO SEC	CO a 105° C	86	%	CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984	0,1		
Residuo fisso a	(550 °C)	80	%	CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984	0,1		
Amianto (°)		Assente	%	D.M. 06/09/94 All. 1			
		050020000000000000000000000000000000000	1577				

## CARATTERISTICHE DI PERICOLO Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014

Caratteristica di pericolo	Cod. Pericolo	Risultato	Limite di conc.
HP 4 - IRRITANTE - IRRITAZIONE CUTANEA E LESIONI OCULARI			
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni ocular	∑ H314	Inferiore al limite	≥ 1% e < 5%. Se ≥ 5% vedi HP 8









## CARATTERISTICHE DI PERICOLO Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014

Caratteristica di pericolo	Cod. Pericolo	Risultato	Limite di cond
Provoca gravi lesioni oculari	∑ H318	Inferiore al limite	≥ 10%
Provoca irritazione cutanea	∑ H315 + ∑H319	Inferiore al limite	≥ 20%
HP 5 - TOSSICITA' SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) / TOSSICITA' IN O	CASO DI ASPIRAZIO	NE	
Provoca danni agli organi	H370	Inferiore al limite	≥ 1%
Può provocare danni agli organi	H371	Inferiore al limite	≥ 10%
Può irritare le vie respiratorie	H335	Inferiore al limite	≥ 20%
Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta	H372	Inferiore al limite	≥ 1%
Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta	H373	Inferiore al limite	≥ 10%
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie	∑ H304	Inferiore al limite	≥ 10%
Viscosità cinematica totale a 40 °C	∑H304	Non Applicabile	≤ 20,5
HP 6 - TOSSICITA' ACUTA			
Letale se ingerito (cat.1)	∑ H300-1	Inferiore al limite	≥ 0,1%
Letale se ingerito (cat. 2)	∑ H300-2	Inferiore al limite	≥ 0,25%
Tossico se ingerito	Σ H301	Inferiore al limite	≥ 5%
Nocivo se ingerito	∑ H302	Inferiore al limite	≥ 25%
Letale a contatto con la pelle (cat. 1)	∑ H310-1	Inferiore al limite	≥ 0,25%
Letale a contatto con la pelle (cat. 2)	∑ H310-2	Inferiore al limite	≥ 2,5%
Tossico per contatto con la pelle	Σ H311	Inferiore al limite	≥ 15%
Nocivo per contatto con la pelle	∑ H312	Inferiore al limite	≥ 55%
Letale se inalato (cat. 1)	∑ H330-1	Inferiore al limite	≥ 0,1%
Letale se inalato (cat. 2)	∑ H330-2	Inferiore al limite	≥ 0,5%
Tossico se inalato	∑ H331	Inferiore al limite	≥ 3,5%
Nocivo se inalato	∑ H332	Inferiore al limite	≥ 22,5%
P7 - CANCEROGENO			
Può provocare il cancro	H350	Inferiore al limite	≥ 0,1%
Sospettato di provocare il cancro	H351	Inferiore al limite	≥ 1%
HP 8 - CORROSIVO			
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari	∑ H314	Inferiore al limite	≥ 5%
HP 10 - TOSSICO PER LA RIPRODUZIONE			
Può nuocere alla fertilità o al feto	H360	Inferiore al limite	≥ 0,3%
Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto	H361	Inferiore al limite	≥ 3%
HP 11 - MUTAGENO			
Può provocare alterazioni genetiche	H340	Inferiore al limite	≥ 0,1%
Sospettato di provocare alterazioni genetiche	H341	Inferiore al limite	≥ 1,0%
HP 12 - LIBERAZIONE DI GAS A TOSSICITA' ACUTA			
A contatto con l'acqua libera un gas tossico	EUH029	Sostanze non presenti	
A contatto con acidi libera un gas tossico	EUH031	Sostanze non presenti	







Sostanze non presenti

Sostanze non presenti

Sostanze non presenti



#### SEGUE RAPPORTO DI PROVA Nº 1353/22

## CARATTERISTICHE DI PERICOLO Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014

EUH032 Sostanze non presenti  H317 Inferiore al limite $\geq 10\%$ H334 Inferiore al limite $\geq 10\%$ $\Sigma H400 Inferiore al limite \geq 25\% 00x\Sigma H410 + 0xE H411 + EH412$
H334 Inferiore al limite ≥ 10% $ \Sigma \text{ H400} \qquad \text{Inferiore al limite} ≥ 25\% $ $ 00x\Sigma H410 + \text{Inferiore al limite} ≥ 25\% $ $ 0x\Sigma H411 + $
H334 Inferiore al limite ≥ 10% $ \Sigma \text{ H400} \qquad \text{Inferiore al limite} ≥ 25\% $ $ 00x\Sigma H410 + \text{Inferiore al limite} ≥ 25\% $ $ 0x\Sigma H411 + $
$\Sigma$ H400 Inferiore al limite ≥ 25% $00x\Sigma$ H410 + Inferiore al limite ≥ 25% $0x\Sigma$ H411 +
$00x\Sigma$ H410 + Inferiore al limite ≥ 25% $0x\Sigma$ H411 +
$00x\Sigma$ H410 + Inferiore al limite ≥ 25% $0x\Sigma$ H411 +
0x∑H411 +
range — An Die graphen v. Handerschausen
∑H412
410 + ∑H411 Inferiore al limite ≥ 25%
1412 + ∑H413
H420 Inferiore al limite ≥ 0,1%
1412 + ∑H4

## (°) Prova eseguita in subappalto

Esplosivo allo stato secco

Può formare perossidi esplosivi

#### Note legislative

(UE1272) = REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Così come modificato dal REGOLAMENTO (UE) 2016/1179 del 19 Luglio 2016. (UE1342) = REGOLAMENTO (UE) N. 1342/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2014 recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V Incertezza = Il valore è da intendersi come incertezza estesa con fattore di copertura K=2,26 per nove gradi effettivi di libertà al 95% di probabilità. Nel caso di prove microbiologiche su acque, alimenti e matrici analoghe, l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia". Limiti previsti dalla Tabella dell'Allegato 3 al DM 05.02.98 come modificato dal DM 186/06

Protocollo Campione

1407/2 del 29/07/22

Data Inizio Prove 29/07/2022

**EUH001** 

**EUH019** 

**EUH044** 

Data Fine Prove 03/08/2022

Etichetta/Lotto

1407 cess

Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato

					D	.lgs 121 d	lel 03/09/2	020
Indagine eseguita Metodo	Risultato	U.M	Metodo	LQ	Tab. 2	Tab. 5	Tab. 5a	Tab.6
Arsenico	Inferiore al limite minimo di quantificazione	mg/l	UNI EN ISO 10802 2004+UNI EN 12457-2 2004+UNI EN 12506 2004+UNI EN ISO 11885 2009	0,03	0,05	0,2	0,2	2,5

Pagina 9 di 13









					D.lgs 121 del 03/09/2020			
Indagine eseguita Metodo	Risultato	U.M	Metodo	LQ	Tab. 2	Tab. 5	Tab. 5a	Tab.6
Bario	Inferiore al limite minimo di quantificazione	mg/l	UNI EN ISO 10802 2004+UNI EN 12457-2 2004+UNI EN 12505 2004+UNI EN ISO 11885 2009	0,05	2	10	10	30
Cadmio	Inferiore al limite minimo di quantificazione	mg/l	UNI EN ISO 10802 2004+UNI EN 12457-2 2004+UNI EN 12505 2004+UNI EN ISO 11885 2009	0,002	0,004	0,1	0,1	0,5
Rame	Inferiore al limite minimo di quantificazione	mg/l		0,01	0,2	5	5	10
Mercurio	Inferiore al limite minimo di quantificazione	mg/l	UNI EN ISO 10802 2004+UNI EN 12457-2 2004+UNI EN 12503 2004+UNI EN 1483 2008	0,0005	0,001	0,02	0,02	0,2
Molibdeno	0,12	mg/l	UNI EN ISO 10802 2004+UNI EN 12457-2 2004+UNI EN 12503 2004+UNI EN ISO 11885 2009	0,02	0,05	1	1	3
Nichel	Inferiore al limite minimo di quantificazione	mg/l	UNI EN ISO 10802 2004+UNI EN 12457-2 2004+UNI EN 12506 2004+UNI EN ISO 11885 2009	0,01	0,04	1	1	4
Piombo	0,14	mg/l	UNI EN ISO 10802 2004+UNI EN 12457-2 2004+UNI EN 12506 2004+UNI EN ISO 11885 2009	0,02	0,05	1	1	5
Antimonio	0,5	mg/l	UNI EN ISO 10802 2004+UNI EN 12457-2 2004+UNI EN 12506 2004+UNI EN ISO 11885 2009	0,03	0,006	0,07	0,07	0,5
Selenio	0,36	mg/l	UNI EN ISO 10802 2004+UNI EN 12457-2 2004+UNI EN 12506 2004+UNI EN ISO 11885 2009	0,001	0,01	0,05	0,05	0,7
Zinco	Inferiore al limite minimo di quantificazione	mg/l	UNI EN ISO 10802 2004+UNI EN 12457-2 2004+UNI EN 12503 2004+UNI EN ISO 11885 2009	0,01	0,4	5	5	20
Carbonio organico disciolto (D.O.C.)	11	mg/l	UNI EN 10802 2004 - UNI EN 13370 2004 - UNI EN 1484 1999	0,1	50	100	80	100
Fluoruri ( come ione)	0,5	mg/l	UNI EN ISO 10802 2004+UNI EN 12457-2 2004+UNI EN 12506 2004+UNI EN ISO 10304-1 2009	0,1	0,1	15	15	50
Solfati (come ione)	26	mg/l	UNI EN ISO 10304-1	0,5	100	5000	2000	5000









						D.lgs 121 del 03/09/2020			
Indagine eseguita Metodo	Risultato	U.M	Metodo	LQ	Tab. 2	Tab. 5	Tab. 5a	Tab.6	
Cloruri (come ione)	38	mg/l	UNI EN ISO 10304-1	0,5	80	2500	1500	2500	
Cromo totale	Inferiore al limite minimo di quantificazione	mg/l	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,01	0,05	1	1	7	

#### Note legislative

D.lgs 121 del 03/09/2020

(Tab. 2) = Tabella 2 - Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti inerti.
 (Tab. 5) = Tabella 5 - Limite di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi.

(Tab. 5a) = Tabella 5a - Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilita' di rifiuti pericolosi stabili non reattivi in discariche per rifiuti non pericolosi.

(Tab. 6) = Tabella 6 - Limite di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti pericolosi.

#### Pareri ed Interpretazioni

UNI 10802 - Criteri Monoliticità (Appendice A - Punto A.3.2)

- 1) Dimensioni del campione < 4 cm in ogni direzione;
- 2) Campione non palòersemente frantumabile per compressione manuale;
- 3) Risulta integro alla fine della prova di eluizione nelle 48h;
- 4) Presenta un contenuto di materiale di granulometria < ai 4 cm minore del 30% in peso.









#### Commento

Visto il decreto legislativo 121 del 03/09/2020

Visti i risultati dell'inagine analitica; Viste le correlazioni tra i codici di pericolo (H) e le caratteristiche di pericolo (HP) di cui al Regolamento UEn 1357/2014; viste le concentrazioni limite di cui al Regolamento UE 1357/2014 per le sostanze pericolose e le concentrazioni limite di cui al Regolamento UE 1342/2014 per i P.O.P.;

Visto il Regolamento UE n.997/2017 del 08 Giungo 2017 che modifica l'All. III della Direttiva 2008/98/CE definendo nuovi criteri per l'attribuzione della caratteristica di pericolo Ecotossico (HP14), in linea con quanto previsto dal Regolamento CE n.1272/2008;

Vista la Decisione 2014/955/UE ai fini dell'assegnazione del codice CER.

Valutati i risultati analitici effettuati sui parametri chimico-fisici significativi e pertinenti, e visto che lo stesso presenta valori delle concentrazioni delle sostanze elencate inferiori a quelle definite nell'allegato D alla Parte IV del D.lgsvo 152/06 e ss.mm.ii.

Considerato che le sommatorie delle concentrazioni delle sostanze ai fini della classificazione della pericolosità, come definito sia dal Reg UE 1357/2014, sia dal Reg. UE 1179/2016, sia dal Reg. UE 1021/19, sia dal Reg UE 636/19 e dal Regolamento CE n. 1272/2008 risultano inferiori ai limiti per definire il rifiuto pericoloso, ed inoltre viste le caratteristiche tecniche e chimiche del rifiuto, il medesimo può classificarsi dunque come

## Rifiuto Speciale non Pericoloso sotto la voce

"Miscele Bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame - miscele bituminose diverse da quelli di cui alla voce 17 03 01\* "

Codice CER: 17 03 02

Note Incertezza = Il valore è da intendersi come incertezza estesa con fattore di copertura K=2 effettivi di libertà al 95% di probabilità. Nel caso di prove microbiologiche su acque, alimenti e matrici analoghe, l'incertezza e stesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

Note Incertezza = II valore è da intendersi come incertezza estesa con fattore di copertura K=2 effettivi di libertà al 95% di probabilità.

Nel caso di prove microbiologiche su acque, alimenti e matrici analoghe, l'incertezza e stesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

Conservazione della documentazione relativa alle prove. Le registrazioni tecniche delle prove effettuate sono conservate dal Laboratorio per 48 mesi, i Rapporti di Prova per 48 mesi. Al termine di tale periodo tutte le registrazioni saranno distrutte in maniera tale da proteggere la riservatezza dei dati del cliente e saranno smaltite secondo le leggi vigenti al momento dello smaltimento.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati. E' fatto assoluto divieto di modificare anche parzialmente i dati contenuti.

Pagina 12 di 13









Marcella Ponzio

ENERGIAMBIENTE ST

U.M. = Unità di misura

LQ = Limite di quantificazione per le prove chimiche

ND = Non Determinato

Fine rapporto di prova

Responsabili di Prova

Piero Vitale



Il Responsabile del Laboratorio

Dott Sta Marta Licata

II Responsabile Aziendale
Dott. Stefano Mancuso

Pagina 13 di 13

SEDE LEGALE | viale Eucalyptus, 34 | 90044 Carini (PA) | tel fax +39 | 091 | 824 | 9208 | p | IVA | 02613660816 | REA TP184025 | SDI | 03AF | 0241 | energiambientesing/pec.it

ANALISI CHIMICHE | CONSULENZA AMBIENTALE | AMBIENTI CONFINATI | UFFICI E LAB | tel fax +39 333 664 2377 | via San Leonardo 11/B | 91011 Alcamo (TP)

TECNOLOGIE DEL TRATTAMENTO ACQUE ARIA RIFIUTI | PROD E VENDITA | tel +39 339 424 2142 | c.da Conza SS 187 km 35,600 | 91014 C.mare del Golfo (TP)









Spett.le Omega Costruzioni srl Via Orefici, 36 92020 San Giovanni Gemini (AG)

#### RAPPORTO DI PROVA Nº 1350/22

Data emissione 03/08/2022

Tipo campione Rifiuto

Data ricevimento campione 29/07/2022

Descrizione campione Pannello in fibra di legno proveniente da interventi di ripristino copertura corpo atrio A - Asili Nido "il Bruco

Pellegrino". MOGE 20899 - CIG: 9100743AB2 - CUP: B37H21009850004

Luogo del prelievo Via Pellegrini, 19 - Genova

 Data prelievo
 29/07/2022

 Campionatore
 Committente

 Confezione campione
 Busta plastica

 Conservazione campione
 Temperatura Ambiente

 Restituzione campione
 Si: ritira il cliente

Campo1 17 02 01 : legno, vetro e plastica - legno

Protocollo Campione 1404/1 del 29/07/22 Data Inizio Prove 29/07/2022 Data Fine Prove 03/08/2022

Etichetta/Lotto 1404 tq

Indagine Metodo	eseguita	Risultato	U.M	Metodo	LQ	Limiti	Rif.
Cadmio s.	s.	0,3	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,05	v. cod pericoli	UE1272
CAS:	7440-43-9	Cod. Pericoli: H	330-2;H341;H35	0;H372;H410;H361			
Arsenico		0,6	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,5	v. cod pericoli	UE1272
CAS:	7440-38-2	Cod. Pericoli: H-	410;H331;H301;I	H400			
Cromo tota	ale	0,9	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,5	v. cod pericoli	UE1272
CAS:	7440-47-3	Cod. Pericoli: H	334;H319;H400;I	H410			
Nichel		Inferiore al limite minimo di quantificazione	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,5	v. cod pericoli	UE1272
CAS:	7440-02-0	Cod. Pericoli: H	317;H351;H372				
Piombo		Inferiore al limite minimo di guantificazione	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,5	v. cod pericoli	UE1272
CAS:	7439-92-1		373;H360;H332;I	H302;H410;H400			
Zinco		1,4	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,5	v. cod pericoli	UE1272
CAS:	7440-66-6	Cod. Pericoli: H.	260;H250;H400;I	H410			









eseguita	Risultato	U.M	Metodo	LQ	Limiti	Rif.
	Inferiore al limite minimo di	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,5	v. cod pericoli	UE1272
	quantificazione					
7782-49-2	Cod. Pericoli: H413	;H331;H301;	H373			
	Inferiore al limite	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN	0,5	v. cod pericoli	UE1272
	minimo di		11885:2009			
	quantificazione					
7439-97-6		;H330-2;H41	0;H360;H400			
suoi composti	2,1	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,05	v. cod pericoli	UE1272
1317-39-1	Cod. Pericoli: H332	;H302;H318;	H400;H410			
suoi composti	Inferiore al limite	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN	1	v. cod pericoli	UE1272
	minimo di		11885:2009			
	quantificazione					
7440-31-5	Cod. Pericoli: H335	;H319				
	Inferiore al limite	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN	1	v. cod pericoli	UE1272
	minimo di		11885:2009			
	guantificazione					
7440-41-7		;H330-2;H30	1;H372;H319;H335;H315;H317			
e (Mn)	0,195	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN	1	v. cod pericoli	UE1272
7439-96-5	Cod. Pericoli: H319	;H228	11000.2000			
i C10-C40	Inferiore al limite	mg/Kg	UNI EN 14039:2005	1		
	minimo di					
	7782-49-2  7439-97-6 suoi composti 1317-39-1 suoi composti 7440-31-5  7440-41-7 e (Mn) 7439-96-5	Inferiore al limite minimo di quantificazione  7782-49-2  Cod. Pericoli: H413  Inferiore al limite minimo di quantificazione  7439-97-6  Suoi composti  2,1  1317-39-1  Cod. Pericoli: H332  Suoi composti  Inferiore al limite minimo di quantificazione  7440-31-5  Inferiore al limite minimo di quantificazione  Cod. Pericoli: H335  Inferiore al limite minimo di quantificazione  Cod. Pericoli: H350  (Mn)  0,195  Cod. Pericoli: H319  7439-96-5  Cod. Pericoli: H319	Inferiore al limite mg/Kg minimo di quantificazione  7782-49-2 Cod. Pericoli: H413;H331;H301;  Inferiore al limite mg/Kg minimo di quantificazione  7439-97-6 Cod. Pericoli: H372;H330-2;H41  suoi composti 2,1 mg/Kg  1317-39-1 Cod. Pericoli: H332;H302;H318;  suoi composti Inferiore al limite mg/Kg minimo di quantificazione  7440-31-5 Cod. Pericoli: H335;H319  Inferiore al limite mg/Kg minimo di quantificazione  7440-41-7 Cod. Pericoli: H350;H330-2;H30  e (Mn) 0,195 mg/Kg  7439-96-5 Cod. Pericoli: H319;H228  i C10-C40 Inferiore al limite mg/Kg	Inferiore al limite mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009  7782-49-2  Cod. Pericoli: H413;H331;H301;H373  Inferiore al limite mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009  7439-97-6  Cod. Pericoli: H372;H330-2;H410;H360;H400  suoi composti 2,1 mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009  1317-39-1  Cod. Pericoli: H332;H302;H318;H400;H410  suoi composti Inferiore al limite mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009  7440-31-5  Inferiore al limite mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009  7440-41-7  Cod. Pericoli: H335;H319  Inferiore al limite mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009  7440-41-7  Cod. Pericoli: H350;H330-2;H301;H372;H319;H335;H315;H317  e (Mn) 0,195 mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11895:2009  7439-96-5  Cod. Pericoli: H319;H228  UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11895:2009	Inferiore al limite mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009  7782-49-2  Inferiore al limite mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009  Inferiore al limite mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009  Inferiore al limite mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009  7439-97-6  God. Pericoli: H372;H330-2;H410;H360;H400  Inferiore al limite mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009  Inferiore al limite mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009  Inferiore al limite mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009  Inferiore al limite mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009  Inferiore al limite mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009  Inferiore al limite mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009  Inferiore al limite mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009  Inferiore al limite mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009  Inferiore al limite mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009  Inferiore al limite mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009  Inferiore al limite mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009  Inferiore al limite mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009  Inferiore al limite mg/Kg UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	Inferiore al limite   mg/Kg   UNI EN 13657:2004 + UNI EN   0,5   v. cod pericoli   11885:2009   minimo di   quantificazione   Cod. Pericoli:   H413;H331;H301;H373   UNI EN 13657:2004 + UNI EN   0,5   v. cod pericoli   minimo di   quantificazione   Cod. Pericoli:   H372;H330-2;H410;H360;H400   11885:2009   minimo di   quantificazione   Cod. Pericoli:   H372;H330-2;H410;H360;H400   11885:2009   minimo di   11885:2009   minimo di   quantificazione   UNI EN 13657:2004 + UNI EN   0,05   v. cod pericoli   1317-39-1   Cod. Pericoli:   H332;H302;H318;H400;H410   minimo di   quantificazione   Cod. Pericoli:   H335;H319   UNI EN 13657:2004 + UNI EN   1   v. cod pericoli   11885:2009   minimo di   quantificazione   Cod. Pericoli:   H335;H319   UNI EN 13657:2004 + UNI EN   1   v. cod pericoli   minimo di   quantificazione   Cod. Pericoli:   H350;H330-2;H301;H372;H319;H335;H315;H317   e (Mn)

## CARATTERISTICHE DI PERICOLO Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014

Caratteristica di pericolo	Cod. Pericolo	Risultato	Limite di conc
HP 4 - IRRITANTE - IRRITAZIONE CUTANEA E LESIONI OCULARI			
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni ocular	∑ H314	Inferiore al limite	≥ 1% e < 5%. Se ≥ 5% vedi HP 8
Provoca gravi lesioni oculari	∑ H318	Inferiore al limite	≥ 10%
Provoca irritazione cutanea	$\Sigma$ H315 + $\Sigma$ H319	Inferiore al limite	≥ 20%
Provoca danni agli organi Può provocare danni agli organi	H370 H371	Inferiore al limite	≥ 10%
HP 5 - TOSSICITA' SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) / TOSSICITA' IN (	CASO DI ASPIRAZION H370	E Inferiore al limite	≥ 1%
Può irritare le vie respiratorie	H335	Inferiore al limite	≥ 20%
Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta	H372	Inferiore al limite	
			≥ 1%
Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta	H373	Inferiore al limite	≥ 1% ≥ 10%
Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie	H373 Σ H304	Inferiore al limite Inferiore al limite	RESIDENCE.









## CARATTERISTICHE DI PERICOLO Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014

Caratteristica di pericolo	Cod. Pericolo	Risultato	Limite di cond
HP 6 - TOSSICITA' ACUTA			
Letale se ingerito (cat.1)	∑ H300-1	Inferiore al limite	≥ 0,1%
Letale se ingerito (cat. 2)	∑ H300-2	Inferiore al limite	≥ 0,25%
Tossico se ingerito	∑ H301	Inferiore al limite	≥ 5%
Nocivo se ingerito	∑ H302	Inferiore al limite	≥ 25%
Letale a contatto con la pelle (cat. 1)	∑ H310-1	Inferiore al limite	≥ 0,25%
Letale a contatto con la pelle (cat. 2)	∑ H310-2	Inferiore al limite	≥ 2,5%
Tossico per contatto con la pelle	∑ H311	Inferiore al limite	≥ 15%
Nocivo per contatto con la pelle	∑ H312	Inferiore al limite	≥ 55%
Letale se inalato (cat. 1)	∑ H330-1	Inferiore al limite	≥ 0,1%
Letale se inalato (cat. 2)	∑ H330-2	Inferiore al limite	≥ 0,5%
Tossico se inalato	∑ H331	Inferiore al limite	≥ 3,5%
Nocivo se inalato	∑ H332	Inferiore al limite	≥ 22,5%
HP 7 - CANCEROGENO			Sent In Testing
Può provocare il cancro	H350	Inferiore al limite	≥ 0,1%
Sospettato di provocare il cancro	H351	Inferiore al limite	≥ 1%
HP 8 - CORROSIVO			
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari	∑ H314	Inferiore al limite	≥ 5%
HP 10 - TOSSICO PER LA RIPRODUZIONE			
Può nuocere alla fertilità o al feto	H360	Inferiore al limite	≥ 0,3%
Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto	H361	Inferiore al limite	≥ 3%
HP 11 - MUTAGENO			
Può provocare alterazioni genetiche	H340	Inferiore al limite	≥ 0,1%
Sospettato di provocare alterazioni genetiche	H341	Inferiore al limite	≥ 1,0%
HP 12 - LIBERAZIONE DI GAS A TOSSICITA' ACUTA			
A contatto con l'acqua libera un gas tossico	EUH029	Sostanze non presenti	
A contatto con acidi libera un gas tossico	EUH031	Sostanze non presenti	
A contatto con acidi libera un gas altamente tossico	EUH032	Sostanze non presenti	
HP 13 - SENSIBILIZZANTE			
Può provocare una reazione allergica della pelle	H317	Inferiore al limite	≥ 10%
Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	H334	Inferiore al limite	≥ 10%
HP14 - ECOTOSSICO			
Tossicità acuta per l'ambiente acquatico	∑ H400	Inferiore al limite	≥ 25%
Tossicità cronica per l'ambiente acquatico	100x∑H410 + 10x∑H411 + ∑H412	Inferiore al limite	≥ 25%
Tossicità cronica per l'ambiente acquatico	ΣH412 ΣH410 + ΣH411 +ΣH412 + ΣH413	Inferiore al limite	≥ 25%









CARATTERIST	ICHE DI PER	RICOLO
Allegato III - Regolamento	UE) N. 1357/	2014 del 18/12/2014

Caratteristica di pericolo	Cod. Pericolo	Risultato	Limite di conc
Riduce lo strato di ozono	H420	Inferiore al limite	≥ 0,1%
HP 15 - RIFIUTO CHE NON POSSIEDE DIRETTAMENTE UNA DELLE CARAT MANIFESTARLA SUCCESSIVAMENTE	TERISTICHE DI PERICOLO	SUMMENZIONATE MA	PUO'
Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio	H205	Sostanze non presenti	
Esplosivo allo stato secco	EUH001	Sostanze non presenti	
Può formare perossidi esplosivi	EUH019	Sostanze non presenti	
Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato	EUH044	Sostanze non presenti	

#### Note legislative

(UE1272) = REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Così come modificato dal REGOLAMENTO (UE) 2016/1179 del 19 Luglio 2016. (UE1342) = REGOLAMENTO (UE) N. 1342/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2014 recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V Incertezza = II valore è da intendersi come incertezza estesa con fattore di copertura K=2,26 per nove gradi effettivi di libertà al 95% di probabilità. Nel caso di prove microbiologiche su acque, alimenti e matrici analoghe, l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

	04/2 del 29/07/22 04 cess	Data Inizio Prove 29/07/2022			Data Fine Prove 03/08/2022		
Indagine eseguita Metodo	Risultato	U.M	Metodo	LQ	Limiti	Rif.	
pH	8,2	Unità di pH	CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1985		[5,5 - 12]	5.2.98	
Conducibilità a 20°C	209						
FLUORURI (come ione)	0,7	mg/l	UNI EN ISO 10304-1	0,1	≤ 1,5	5.2.98	
Cloruri	32	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,5	≤ 100	5,2.98	
Nitrati (come ione NO3)	1,3	mg/l	UNI EN ISO 10304-1	1	≤ 50	5.2.98	
Solfati (come SO4)	56	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		≤ 250	5.2.98	
Richiesta Chimica di Ossigeno (COD	) 21	mg/l	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003	5	≤ 30		
Bario	Inferiore al limite minimo di guantificazione	mg/l	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,01	≤ 1	5.2.98	
CAS: 7440-39-3	Cod. Pericoli: H261	1;H315;H319;I	H335				
Rame	Inferiore al limite minimo di	mg/l		0,01	≤ 0,05	5.2.98	
CAS: 1317-39-1	quantificazione Cod. Pericoli: H332	2;H302;H318;I	H400;H410				









Indagine Metodo	e eseguita	Risultato	U.M	Metodo	LQ	Limiti	Rif.
Zinco		Inferiore al limite minimo di quantificazione	mg/l	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,01	≤ 3	5.2.98
CAS:	7440-66-6	Cod. Pericoli: H260;	H250;H400;F	H410			
Berillio		Inferiore al limite minimo di	µg/l	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,01	≤ 10	5.2.98
CAS:	7440-41-7	quantificazione Cod. Pericoli: H350:	H330-2:H30	1;H372;H319;H335;H315;H317	•		
Cobalto	110 - He to the - to the letter	\$1000000000000000000000000000000000000	10.01 (10.426)	UNI EN 13657:2004 + UNI EN	0,1	≤ 250	5.2.98
	7440 40 4	0,56	µg/l	11885:2009	0,1	\$ 250	0.2.00
CAS:	7440-48-4	Cod. Pericoli: H334;	H317;H413				
Nichel		Inferiore al limite minimo di	µg/l	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,05	≤ 10	5.2.98
CAS:	7440-02-0	quantificazione Cod. Pericoli: H317;	H351:H372				
Vanadio			734	UNI EN 13657:2004 + UNI EN	0.05	- 2E0	5.2.98
vanadio		Inferiore al limite minimo di quantificazione	µg/l	11885:2009	0,05	≤ 250	5.2.86
CAS:	7440-62-2	Cod. Pericoli: H413					
Arsenico		Inferiore al limite minimo di	μg/l	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,1	≤ 50	5.2.98
CAS:	7440-38-2	quantificazione Cod. Pericoli: H410;	U221·U201·I	1400			
CAS.	7440-36-2	Cod. Pericoli. 11410,	nss 1,nsu 1,1				
Cadmio s	S.	Inferiore al limite minimo di	µg/l	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009		≤ 5	5.2.98
CAS:	7440-43-9	quantificazione Cod. Pericoli: H330-	2:H341:H350	D:H372:H410:H361			
Piombo		Inferiore al limite	μg/l	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,1	≤ 50	5.2.98
		quantificazione					
CAS:	7439-92-1	Cod. Pericoli: H373;	H360;H332;F	H302;H4 <mark>10</mark> ;H400			
Selenio		Inferiore al limite minimo di	μg/l	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,1	≤ 10	5.2.98
		quantificazione					
CAS:	7782-49-2	Cod. Pericoli: H413;	H331;H301;F	H373			
Mercurio		Inferiore al limite minimo di	μg/l	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,1	≤ 1	5.2.98
010	7400 07 0	quantificazione		0.11000.11400			
CAS:	7439-97-6	Cod. Pericoli: H372;	H330-2;H410	TO STATE OF THE PROPERTY OF TH	9-0-0-0	45K.25	y neongeons
Cromo tot	ale	0,2	µg/l	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,01	≤ 50	5.2,98









Indagine eseguita Metodo	Risultato	U.M	Metodo	LQ	Limiti	Rif.	
Amianto (°)	Assente	mg/l	D.M. 06/09/94 All. 1		≤ 30	5.2.98	

(°) Prova eseguita in subappalto

#### Note legislative

Limiti previsti dalla Tabella dell"Allegato 3 al DM 05.02.98 come modificato dal DM 186/06

#### Pareri ed Interpretazioni

Visti i risultati dell'indagine analitica si può affermare che il campione sottoposto al Test di cessione risulta conforme.

#### Commento

Visto il decreto legislativo 121 del 03/09/2020

Visti i risultati dell'inagine analitica; Viste le correlazioni tra i codici di pericolo (H) e le caratteristiche di pericolo (HP) di cui al Regolamento UEn 1357/2014; viste le concentrazioni limite di cui al Regolamento UE 1357/2014 per le sostanze pericolose e le concentrazioni limite di cui al Regolamento UE 1342/2014 per i P.O.P.;

Visto il Regolamento UE n.997/2017 del 08 Giungo 2017 che modifica l'All. III della Direttiva 2008/98/CE definendo nuovi criteri per l'attribuzione della caratteristica di pericolo Ecotossico (HP14), in linea con quanto previsto dal Regolamento CE n.1272/2008;

Vista la Decisione 2014/955/UE ai fini dell'assegnazione del codice CER.

Valutati i risultati analitici effettuati sui parametri chimico-fisici significativi e pertinenti, e visto che lo stesso presenta valori delle concentrazioni delle sostanze elencate inferiori a quelle definite nell'allegato D alla Parte IV del D.lgsvo 152/06 e ss.mm.ii.

Considerato che le sommatorie delle concentrazioni delle sostanze ai fini della classificazione della pericolosità, come definito sia dal Reg UE 1357/2014, sia dal Reg. UE 1179/2016, sia dal Reg. UE 1021/19, sia dal Reg UE 636/19 e dal Regolamento CE n. 1272/2008 risultano inferiori ai limiti per definire il rifiuto pericoloso, ed inoltre viste le caratteristiche tecniche e chimiche del rifiuto, il medesimo può classificarsi dunque come

## RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO, sotto la voce

## "LEGNO" CER 17 02 01

Note Incertezza = Il valore è da intendersi come incertezza estesa con fattore di copertura K=2 effettivi di libertà al 95% di probabilità. Nel caso di prove microbiologiche su acque, alimenti e matrici analoghe, l'incertezza e stesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

Note Incertezza = Il valore è da intendersi come incertezza estesa con fattore di copertura K=2 effettivi di libertà al 95% di

Pagina 6 di 7









probabilità.

Nel caso di prove microbiologiche su acque, alimenti e matrici analoghe, l'incertezza e stesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

Conservazione della documentazione relativa alle prove. Le registrazioni tecniche delle prove effettuate sono conservate dal Laboratorio per 48 mesi, i Rapporti di Prova per 48 mesi. Al termine di tale periodo tutte le registrazioni saranno distrutte in maniera tale da proteggere la riservatezza dei dati del cliente e saranno smaltite secondo le leggi vigenti al momento dello smaltimento.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati. E' fatto assoluto divieto di modificare anche parzialmente i dati contenuti.

U.M. = Unità di misura

LQ = Limite di quantificazione per le prove chimiche

ND = Non Determinato

Fine rapporto di prova

Marcella Ponzio

Responsabili di Prova

Piero Vitale



Il Responsabile del Laboratorio
Dott sea Maria Licata

Dott Il Offinico
TA MARTA

II Responsabile Aziendale Dott. Stefano Mancuso

Pagina 7 di 7

Pag

SEDE LEGALE | viale Eucalyptus, 34 | 90044 Carini (PA) | tel fax +39 | 091 | 824 | 9208 | p | IVA | 02613660816 | REA TP184025 | SDI | 03AF | 024 | 9208 | p | IVA | 02613660816 | REA TP184025 | SDI | 03AF | 024 | 9208 | p | IVA | 02613660816 | REA TP184025 | SDI | 03AF | 024 | 9208 | p | IVA | 02613660816 | REA TP184025 | SDI | 03AF | 024 | 9208 | p | IVA | 02613660816 | REA TP184025 | SDI | 03AF | 024 | 9208 | p | IVA | 02613660816 | REA TP184025 | SDI | 03AF | 024 | 9208 | p | IVA | 02613660816 | REA TP184025 | SDI | 03AF | 024 | 9208 | p | IVA | 02613660816 | REA TP184025 | SDI | 03AF | 024 | 9208 | p | IVA | 02613660816 | REA TP184025 | SDI | 03AF | 024 | 9208 | p | IVA | 02613660816 | REA TP184025 | SDI | 03AF | 024 | 9208 | p | IVA | 02613660816 | REA TP184025 | SDI | 03AF | 024 | 9208 | p | IVA | 02613660816 | REA TP184025 | SDI | 03AF | 024 | 9208 | p | IVA | 02613660816 | REA TP184025 | SDI | 03AF | 024 | 9208 | p | IVA | 02613660816 | REA TP184025 | SDI | 03AF | 024 | 9208 | p | IVA | 02613660816 | REA TP184025 | SDI | 03AF | 024 | 9208 | p | IVA | 02613660816 | REA TP184025 | SDI | 03AF | 024 | 9208 | p | IVA | 02613660816 | REA TP184025 | SDI | 03AF | 024 | 9208 | p | IVA | 02613660816 | REA TP184025 | SDI | 024 | 9208 | p | IVA | 02613660816 | P | 124 | 9208 | p | IVA | 02613660816 | P | 124 | 9208 | p | IVA | 02613660816 | P | 124 | 9208 | p | IVA | 02613660816 | P | 124 | 9208 | p | IVA | 02613660816 | P | 124 | 9208 | p | IVA | 02613660816 | P | 124 | 9208 | p | IVA | 02613660816 | P | 124 | 9208 | p | IVA | 02613660816 | P | 124 | 9208 | P | IVA | 02613660816 | P | 124 | 9208 | P | IVA | 02613660816 | P | 124 | P | IVA | 02613660816 | P | 124 | P | IVA | P

ANALISI CHIMICHE | CONSULENZA AMBIENTALE | AMBIENTI CONFINATI | UFFICI E LAB | tel fax +39 333 664 2377 | via San Leonardo 11/B | 91011 Alcamo (TP)

TECNOLOGIE DEL TRATTAMENTO ACQUE ARIA RIFIUTI | PROD E VENDITA | tel +39 339 424 2142 | c.da Conza SS 187 km 35,600 | 91014 C.mare del Golfo (TP)









Data Fine Prove 03/08/2022

Spett.le Omega Costruzioni srl Via Orefici, 36 92020 San Giovanni Gemini (AG)

## RAPPORTO DI PROVA Nº 1351/22

Data emissione 03/08/2022

Tipo campione Rifiuto

Data ricevimento campione 29/07/2022

Descrizione campione Misto di demolizione proveniente da interventi di ripristino copertura corpo atrio A - Asili Nido "il Bruco Pellegrino".

MOGE 20899 - CIG: 9100743AB2 - CUP: B37H21009850004

Luogo del prelievo Via Pellegrini, 19 - Genova

 Data prelievo
 29/07/2022

 Campionatore
 Committente

 Confezione campione
 Busta plastica

Conservazione campione Temperatura Ambiente
Restituzione campione Si: ritira il cliente

Campo1 17 09 04 : altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione,

Data Inizio Prove 29/07/2022

diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

Protocollo Campione 1405/1 del 29/07/22

Etichetta/Lotto 1405 tq

Indagine Metodo	eseguita	Risultato	U.M	Metodo	LQ	Limiti	Rif.
Cadmio s.	S.	Inferiore al limite minimo di quantificazione	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,05	v. cod pericoli	UE1272
CAS:	7440-43-9	Cod. Pericoli: H330-	-2;H341;H35	0;H372;H410;H361			
Arsenico		Inferiore al limite minimo di quantificazione	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,5	v. cod pericoli	UE1272
CAS:	7440-38-2	Cod. Pericoli: H410,	H331;H301;	H400			
Cromo tota	ale	0,57	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,5	v. cod pericoli	UE1272
CAS:	7440-47-3	Cod. Pericoli: H334,	H319;H400;	H410			
Nichel		Inferiore al limite minimo di quantificazione	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,5	v. cod pericoli	UE1272
CAS:	7440-02-0	Cod. Pericoli: H317,	H351;H372				
Piombo		Inferiore al limite minimo di	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,5	v. cod pericoli	UE1272
		quantificazione					
CAS:	7439-92-1	Cod. Pericoli: H373;	H360;H332;	H302;H410;H400			









Indagine Metodo	eseguita	Risultato	U.M	Metodo	LQ	Limiti	Rif.
Zinco		0,89	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,5	v. cod pericoli	UE1272
CAS:	7440-66-6	Cod. Pericoli: H260	;H250;H400;	H410			
Selenio		Inferiore al limite minimo di	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,5	v. cod pericoli	UE1272
CAS:	7782-49-2	quantificazione Cod. Pericoli: H413	;H331;H301;	H373			
Mercurio		Inferiore al limite minimo di quantificazione	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,5	v. cod pericoli	UE1272
CAS:	7439-97-6	Cod. Pericoli: H372	;H330-2;H41	0;H360;H400			
Rame e i s	suoi composti	0,7	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,05	v. cod pericoli	UE1272
CAS:	1317-39-1	Cod. Pericoli: H332	;H302;H318;	H400;H410			
Stagno e s	suoi composti	Inferiore al limite minimo di quantificazione	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	1	v. cod pericoli	UE1272
CAS:	7440-31-5	Cod. Pericoli: H335	;H319				
Berillio		Inferiore al limite minimo di quantificazione	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	1	v. cod pericoli	UE1272
CAS:	7440-41-7		;H330-2;H30	1;H372;H319;H335;H315;H317			
Manganes	se (Mn)	0,6	mg/Kg	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	1	v. cod pericoli	UE1272
CAS:	7439-96-5	Cod. Pericoli: H319	;H228				
Idrocarbur	i C10-C40	Inferiore al limite minimo di guantificazione	mg/Kg	UNI EN 14039:2005	1		

## CARATTERISTICHE DI PERICOLO Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014

Caratteristica di pericolo	Cod. Pericolo	Risultato	Limite di conc
HP 4 - IRRITANTE - IRRITAZIONE CUTANEA E LESIONI OCULARI			
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni ocular	∑ H314	Inferiore al limite	≥ 1% e < 5%. Se ≥ 5% vedi HP 8
Provoca gravi lesioni oculari	∑ H318	Inferiore al limite	≥ 10%
Provoca irritazione cutanea	∑ H315 + ∑H319	Inferiore al limite	≥ 20%
HP 5 - TOSSICITA' SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) / TOSSICITA' IN	CASO DI ASPIRAZION	E	
Provoca danni agli organi	H370	Inferiore al limite	≥ 1%
Può provocare danni agli organi	H371	Inferiore al limite	≥ 10%
Può irritare le vie respiratorie	H335	Inferiore al limite	≥ 20%
Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta	H372	Inferiore al limite	≥ 1%
Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ricetuta	H373	Inferiore al limite	≥ 10%









## CARATTERISTICHE DI PERICOLO Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014

Caratteristica di pericolo	Cod. Pericolo	Risultato	Limite di cond
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie	∑ H304	Inferiore al limite	≥ 10%
Viscosità cinematica totale a 40 °C	∑H304	Non Applicabile	≤ 20,5
HP 6 - TOSSICITA' ACUTA			
Letale se ingerito (cat.1)	∑ H300-1	Inferiore al limite	≥ 0,1%
Letale se ingerito (cat. 2)	∑ H300-2	Inferiore al limite	≥ 0,25%
Tossico se ingerito	∑ H301	Inferiore al limite	≥ 5%
Nocivo se ingerito	∑ H302	Inferiore al limite	≥ 25%
Letale a contatto con la pelle (cat. 1)	∑ H310-1	Inferiore al limite	≥ 0,25%
Letale a contatto con la pelle (cat. 2)	∑ H310-2	Inferiore al limite	≥ 2,5%
Tossico per contatto con la pelle	∑ H311	Inferiore al limite	≥ 15%
Nocivo per contatto con la pelle	∑ H312	Inferiore al limite	≥ 55%
Letale se inalato (cat. 1)	∑ H330-1	Inferiore al limite	≥ 0,1%
Letale se inalato (cat. 2)	∑ H330-2	Inferiore al limite	≥ 0,5%
Tossico se inalato	∑ H331	Inferiore al limite	≥ 3,5%
Nocivo se inalato	∑ H332	Inferiore al limite	≥ 22,5%
HP 7 - CANCEROGENO			
Può provocare il cancro	H350	Inferiore al limite	≥ 0,1%
Sospettato di provocare il cancro	H351	Inferiore al limite	≥ 1%
HP 8 - CORROSIVO			
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari	∑ H314	Inferiore al limite	≥ 5%
HP 10 - TOSSICO PER LA RIPRODUZIONE			
Può nuocere alla fertilità o al feto	H360	Inferiore al limite	≥ 0,3%
Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto	H361	Inferiore al limite	≥ 3%
HP 11 - MUTAGENO			
Può provocare alterazioni genetiche	H340	Inferiore al limite	≥ 0,1%
Sospettato di provocare alterazioni genetiche	H341	Inferiore al limite	≥ 1,0%
HP 12 - LIBERAZIONE DI GAS A TOSSICITA' ACUTA			
A contatto con l'acqua libera un gas tossico	EUH029	Sostanze non presenti	
A contatto con acidi libera un gas tossico	EUH031	Sostanze non presenti	
A contatto con acidi libera un gas altamente tossico	EUH032	Sostanze non presenti	
HP 13 - SENSIBILIZZANTE			
Può provocare una reazione allergica della pelle	H317	Inferiore al limite	≥ 10%
Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	H334	Inferiore al limite	≥ 10%
HP14 - ECOTOSSICO			
Tossicità acuta per l'ambiente acquatico	∑ H400	Inferiore al limite	≥ 25%









CARATTERISTICHE DI PERICOLO
Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014

Caratteristica di pericolo	Cod. Pericolo	Risultato	Limite di conc
Tossicità cronica per l'ambiente acquatico	100x∑H410 +	Inferiore al limite	≥ 25%
	10x∑H411 +		
	∑H412		
Tossicità cronica per l'ambiente acquatico	ΣH410 + ΣH411	Inferiore al limite	≥ 25%
	+∑H412 + ∑H413		
Riduce lo strato di ozono	H420	Inferiore al limite	≥ 0,1%

## HP 15 - RIFIUTO CHE NON POSSIEDE DIRETTAMENTE UNA DELLE CARATTERISTICHE DI PERICOLO SUMMENZIONATE MA PUO' MANIFESTARI A SUCCESSIVAMENTE

Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio	H205	Sostanze non presenti
Esplosivo allo stato secco	EUH001	Sostanze non presenti
Può formare perossidi esplosivi	EUH019	Sostanze non presenti
Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato	EUH044	Sostanze non presenti

#### Note legislative

(UE1272) = REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Così come modificato dal REGOLAMENTO (UE) 2016/1179 del 19 Luglio 2016. (UE1342) = REGOLAMENTO (UE) N. 1342/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2014 recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V Incertezza = II valore è da intendersi come incertezza estesa con fattore di copertura K=2,26 per nove gradi effettivi di libertà al 95% di probabilità. Nel caso di prove microbiologiche su acque, alimenti e matrici analoghe, l'incertezza estesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

Protocollo Campione	1405/2 del 29/07/22	Data Inizio Prove 29/07/2022	Data Fine Prove 03/08/2022
Etichetta/Lotto	1405 cess		

Indagine eseguita Metodo	Risultato	U.M	Metodo	LQ	Limiti	Rif.
рН	8,2	Unità di pH	CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1985		[5,5 - 12]	5.2.98
Conducibilità a 20°C	426					
FLUORURI (come ione)	0,8	mg/l	UNI EN ISO 10304-1	0,1	≤ 1,5	5.2.98
Cloruri	45	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,5	≤ 100	5.2.98
Nitrati (come ione NO3)	0,8	mg/l	UNI EN ISO 10304-1	1	≤ 50	5.2.98
Solfati (come SO4)	203	mg/l	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003		≤ 250	5.2.98
Richiesta Chimica di Ossigeno (COD)	17	mg/l	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003	5	≤ 30	
Bario	Inferiore al limite minimo di	mg/l	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,01	≤ 1	5.2.98
CAS: 7440-39-3	quantificazione Cod. Pericoli: H26	1;H315;H319;F	1335			









e Inferiore al limite minimo di		mg/l		0,01	≤ 0,05	5.2.98
	quantificazione					
1317-39-1	Cod. Pericoli: H332;	H302;H318;	H400;H410			
	0,9	mg/l	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,01	≤ 3	5.2.98
7440-66-6	Cod. Pericoli: H260;	H250;H400;	H410			
	Inferiore al limite minimo di	µg/l	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,01	≤ 10	5.2.98
7440-41-7		H330-2:H30	01:H372:H319:H335:H315:H317			
	0,7	μg/l	UNI EN 13657:2004 + UNI EN	0,1	≤ 250	5.2.98
7440-48-4	Cod. Pericoli: H334;	H317;H413	11003.2009			
	Inferiore al limite minimo di	µg/l	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,05	≤ 10	5.2.98
7440-02-0	quantificazione Cod. Pericoli: H317;	H351;H372				
	1,4	µg/I	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,05	≤ 250	5.2.98
7440-62-2	Cod. Pericoli: H413					
NAME	Inferiore al limite minimo di quantificazione	µg/I	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,1	≤ 50	5.2.98
7440-38-2	Cod. Pericoli: H410;	H331;H301;	H400			
).	Inferiore al limite minimo di	μg/l	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009		≤ 5	5.2.98
7440-43-9		2;H341;H35	io;H372;H410;H361			
	Inferiore al limite minimo di	µg/l	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,1	≤ 50	5.2.98
7439-92-1		H360:H332:	·H302·H410·H400			
por-1650505050505000	and the second control of the second control		11 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	W0020	225	
	Inferiore al limite minimo di	μg/l	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,1	≤ 10	5.2.98
7782-49-2	quantificazione Cod. Pericoli: H413;	H33 <mark>1;H3</mark> 01;	H373			
	Inferiore al limite minimo di	µg/l	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,1	≤ 1	5.2.98
7439-97-6		H330-2:H41	0:H360:H400			
	7440-66-6  7440-41-7  7440-48-4  7440-02-0  7440-62-2  7440-38-2  5.  7440-43-9	7440-66-6  Cod. Pericoli: H260;  Inferiore al limite minimo di quantificazione Cod. Pericoli: H350;  0,7  7440-48-4  Cod. Pericoli: H334;  Inferiore al limite minimo di quantificazione Cod. Pericoli: H317;  1,4  7440-62-2  Cod. Pericoli: H413  Inferiore al limite minimo di quantificazione Cod. Pericoli: H410;  Inferiore al limite minimo di quantificazione Cod. Pericoli: H330-  Inferiore al limite minimo di quantificazione Cod. Pericoli: H330-  Inferiore al limite minimo di quantificazione Cod. Pericoli: H373;  Inferiore al limite minimo di quantificazione Cod. Pericoli: H373;  Inferiore al limite minimo di quantificazione Cod. Pericoli: H413;  Inferiore al limite minimo di quantificazione Cod. Pericoli: H413;  Inferiore al limite minimo di quantificazione Cod. Pericoli: H413;  Inferiore al limite minimo di quantificazione Cod. Pericoli: H413;	0,9 mg/l  7440-66-6 Cod. Pericoli: H260;H250;H400;  Inferiore al limite μg/l minimo di quantificazione  7440-41-7 Cod. Pericoli: H350;H330-2;H30  0,7 μg/l  7440-48-4 Cod. Pericoli: H334;H317;H413  Inferiore al limite μg/l minimo di quantificazione  7440-02-0 Cod. Pericoli: H317;H351;H372  1,4 μg/l  7440-62-2 Cod. Pericoli: H413  Inferiore al limite μg/l minimo di quantificazione  7440-38-2 Cod. Pericoli: H410;H331;H301;  Inferiore al limite μg/l minimo di quantificazione  7440-43-9 Cod. Pericoli: H330-2;H341;H35  Inferiore al limite μg/l minimo di quantificazione  7439-92-1 Cod. Pericoli: H373;H360;H332;  Inferiore al limite μg/l minimo di quantificazione  7782-49-2 Cod. Pericoli: H413;H331;H301;  Inferiore al limite μg/l minimo di quantificazione  Cod. Pericoli: H413;H331;H301;  Inferiore al limite μg/l minimo di quantificazione  Cod. Pericoli: H413;H331;H301;	1,4	1,4	0,9   mg/l   UNI EN 13657:2004 + UNI EN   0,01   ≤ 3









Indagine eseguita Metodo	Risultato	U.M	Metodo	LQ	Limiti	Rif.
Cromo totale	0,12	μg/l	UNI EN 13657:2004 + UNI EN 11885:2009	0,01	≤ 50	5.2.98
Amianto (°)	Assente	mg/l	D.M. 06/09/94 All. 1		≤ 30	5.2.98

(°) Prova eseguita in subappalto

#### Note legislative

Limiti previsti dalla Tabella dell"Allegato 3 al DM 05.02.98 come modificato dal DM 186/06

#### Pareri ed Interpretazioni

Visti i risultati dell'indagine analitica si può affermare che il campione sottoposio al Test di cessione risulta conforme.

#### Commento

Visto il decreto legislativo 121 del 03/09/2020

Visti i risultati dell'inagine analitica; Viste le correlazioni tra i codici di pericolo (H) e le caratteristiche di pericolo (HP) di cui al Regolamento UEn 1357/2014; viste le concentrazioni limite di cui al Regolamento UE 1357/2014 per le sostanze pericolose e le concentrazioni limite di cui al Regolamento UE 1342/2014 per i P.O.P.;

Visto il Regolamento UE n.997/2017 del 08 Giungo 2017 che modifica l'All. III della Direttiva 2008/98/CE definendo nuovi criteri per l'attribuzione della caratteristica di pericolo Ecotossico (HP14), in linea con quanto previsto dal Regolamento CE n.1272/2008;

Vista la Decisione 2014/955/UE ai fini dell'assegnazione del codice CER.

Valutati i risultati analitici effettuati sui parametri chimico-fisici significativi e pertinenti, e visto che lo stesso presenta valori delle concentrazioni delle sostanze elencate inferiori a quelle definite nell'allegato D alla Parte IV del D.lgsvo 152/06 e ss.mm.ii.

Considerato che le sommatorie delle concentrazioni delle sostanze ai fini della classificazione della pericolosità, come definito sia dal Reg UE 1357/2014, sia dal Reg. UE 1179/2016, sia dal Reg. UE 1021/19, sia dal Reg UE 636/19 e dal Regolamento CE n. 1272/2008 risultano inferiori ai limiti per definire il rifiuto pericoloso, ed inoltre viste le caratteristiche tecniche e chimiche del rifiuto, il medesimo può classificarsi dunque come

RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO, sotto la voce

"Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03"

Codice CER: 17.09.04

Pagina 6 di 7

SEDE LEGALE | viale Eucalyptus, 34 90044 Carini (PA) | tel fax +39 091 824 9208 | p IVA 02613660816 | REA TP184025 | SDI 6JXPS2J | energiambientesrl@pec.it









Incertezza = II valore è da intendersi come incertezza estesa con fattore di copertura K=2 effettivi di libertà al 95% di probabilità. Nel caso di prove microbiologiche su acque, alimenti e matrici analoghe, l'incertezza e stesa è da intendersi come "intervallo di fiducia"

Note Incertezza = Il valore è da intendersi come incertezza estesa con fattore di copertura K=2 effettivi di libertà al 95% di probabilità.

Nel caso di prove microbiologiche su acque, alimenti e matrici analoghe, l'incertezza e stesa è da intendersi come "intervallo di fiducia".

Conservazione della documentazione relativa alle prove. Le registrazioni tecniche delle prove effettuate sono conservate dal Laboratorio per 48 mesi, i Rapporti di Prova per 48 mesi. Al termine di tale periodo tutte le registrazioni saranno distrutte in maniera tale da proteggere la riservatezza dei dati del cliente e saranno smaltite secondo le leggi vigenti al momento dello smaltimento.

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati. E' fatto assoluto divieto di modificare anche parzialmente i dati contenuti.

U.M. = Unità di misura

LQ = Limite di quantificazione per le prove chimiche

ND = Non Determinato

Fine rapporto di prova

ERGIAMBIEN Il Tecnico

Marcella Ponzio

Responsabili di Prova

Piero Vitale

Il Responsabile del Laboratorio Dott ssa Marta Licata

Dott

Il Responsabile Aziendale Dott. Stefano Mancuso

Pagina 7 di 7

NIORO ALI SEDE LEGALE | viale Eucalyptus, 34 90044 Carini (PA) | tel fax +39 091 824 9208 | p IVA 02613660816 | REA TP184025 | SDi outrosul jenergiambientesni@pec.it

ANALISI CHIMICHE | CONSULENZA AMBIENTALE | AMBIENTI CONFINATI | UFFICI E LAB | tel fax +39 333 664 2377 | via San Leonardo 11/B | 91011 Alcamo (TP)



## Scheda Tecnica

## Dati Commerciali e Generali

Tipo Prodotto Esterni/Interni - Illuminazione di

emergenza

Modello Ticinque LED Codice 8586

Descrizione TICINQUE IP65 LED 18W SE 8H

Codice EAN 8002219504906

Colori disponibili Bianco Segnale RAL 9003

Applicazione Uffici, Ambienti

Pubblici, Industrie, Illuminazione di

emergenza

Peso Netto [kg] 1.8

Dimensioni [mm] 549x147x43

Pezzi per Confezione 6



## Caratteristiche Tecniche

 Volume [m3]
 0.004301

 Classe Isolamento
 II

 Grado IP
 65

 Grado Tenuta agli Urti IK
 7

 Tenuta al Fuoco [°C]
 850

Materiale Policarbonato

Tipo Alimentazione Sorgente in Apparecchio autonomo

Emergenza

Modalità Operativa in Emergenza Non permanente Batteria LiFe 9.6V 1.5Ah

Sistema di Diagnosi Apparecchio senza diagnosi
Sistema di Controllo in Emergenza Automatico senza controllo remoto

 Distanza di Visibilità (EN1838) [m]
 28

 Tensione [V]
 230

 Corrente di Alimentazione [A]
 0.104

 Frequenza [Hz]
 50

 Fattore di Potenza (cos (fi))
 0.07

Potenza Apparecchio [W] 2
Flusso Apparecchio in Emergenza 260

lm1


Autonomia [h] 8

Sorgente CCT 4000 K - CRI 80

Indice Rischio Fotobiologico (EN Rischio 0

62471)





## Parametri Fotometrici

 Rilievo
 8586e8h

 Codice CIE
 [57,89,98,100,100]

 Tipo Ottica
 Simmetrica

#### Note

Flusso SE[lm]: 260 \_\_\_\_\_\_ Autonomia[h]: 8

## Norme

2014/35/EU 2014/30/EU

874/2012/CE

2009/125/CE

2004/108/CE

CEI EN 62471

CEI EN 62034

CEI EN 60598-2-2

CEI EN 60598-2-22

## Marchi









Spett.

Omega Costruzioni srl

Via Orefici, 36

San Giovanni Gemini (AG)
92020

Genova, 20 febbraio 2023

Oggetto: Dichiarazione di corretto montaggio di nº 5 plafoniere d'emergenza

Vs. Rif. CIG: 9100743AB2 - CUP: B37H21009850004

Il sottoscritto Per. Ind. Giuseppe Cattuto in qualità di responsabile tecnico della società BCV Impianti s.r.l. sotto la propria responsabilità:

#### **DICHIARA**

Di avere svolto i lavori a servizio del Vs. cliente in Via Pellegri 19 – Genova; Riferimento CIG 9100743AB2.

Inoltre ha provveduto ad accertare:

- ✓ Che i materiali installati siano adatti al luogo di installazione
- ✓ Seguito la norma CEI 64 8
- ✓ Controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Pertanto il sottoscritto

## **CERTIFICA**

che gli impianti elettrici sono stati realizzati conformemente alle norme di cui alla L.186 del 01.03.68 ed altre disposizioni vigenti in materia.

**BCV** Impianti S.r.l.

y. Ldv ws



# POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO (Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103, comma 6, del d. Igs 50/2016)

La presente Scheda Tecnica 1.4 costituisce parte integrante della Garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.4 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018



Garanzia fideiussoria n.	Codice Controll	0	Rilascia	ta da: Agenzia di	<b>REVO UNDE</b>	RWRITING - Milano		
1999134	61	Cod.	300	Prov. MI	Subagente	83 - Roveda Roberto		Codice Rischio 115
Garante "REVO Insurance	e S.p.A."							
R.E.A			PE	C			C.F./P.IVA	
VR - 451759			re	vo@pec.revoins	urance.com		05850710	962
Sede			In	dirizzo			CAP	Prov.
Verona			Vi	ale dell'Agricolt	ura 7		37135	VR
Contraente (Obbligato Pri	ncipale):		PE	C			C.F./P.IVA	)
C.A.R. CONSORZIO ARTI COOP.	GIANI ROMAGNOI	.o soc	. ca	r.car@cert.cna.i	:		01685300	400/01685300400
Sede			In	dirizzo			CAP	Prov.
RIMINI			VI	A CADUTI DI M	ARZABOTTO,	47	47900	RN
Stazione appaltante (Bene	ficiario)		PE	C			C.F. / P. I.V	.A.
COMUNE DI GENOVA			cc	DMUNEGENOV/	A@POSTEMAI	LCERTIFICATA.IT	00856930	102
Comune			In	dirizzo			CAP	Prov.
GENOVA			VI	A DI FRANCIA 1			16149	GE

Descrizione opera/servizio/fornitura

Lavori di "Ripristino copertura corpo atrio A - Asilo Nido II Bruco Pellegrino", in Via Pellegrini 19, Genova. CUP B37H21009850004 - MOGE 20899 Codice CIG 9100743AB2

Luogo di esecuzione	VEDACI	DESCRIZION OPERA
Luogo di esecuzione	VEDASI	DESCRIZION OPERA

Valore c	apitale della rata di saldo	Tasso di interesse			Somma Garantita		
(Somma €	garantita in linea capitale) 4.267,38	tasso di interesse legale vige tempo necessario per la defi di collaudo/regolare esecuzi conformità	nitività del certificato	€	4.694,12		
EURO	quattromiladuecentosessantasette/ 38	5,00 %		EURO	quattromilaseicentonovantaquattro/12		
Data iniz	zio garanzia fideiussoria: v. art. 2 Schema	Tipo 1.4	Data cessazione gara	anzia fide	eiussoria: v. art.2 Schema Tipo 1.4		

Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal 29/3/2023 al 29/3/2025

al tasso lordo del 1,596 %.

Sono operanti i seguenti allegati: ====

	Netto	Accessori	Spese	Imponibile	Imposte	Totale Euro
PREMIO	111,11	22,22	0,00	133,33	16,67	150,00

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

**Il Contraente** 

II Garante

REVO INSURANCE S.P.A.

Firmato in Digitale da: ALBERTO MINALI

Emessa in 4 esemplari ad un solo effetto il 19/6/2023 in Milano.

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235.

#### VERIFICA VALIDITA DELLA POLIZZA

La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da AgiD (www.agid.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di REVO Insurance S.p.a (www.revoinsurance.com), selezionando "Servizi", "Verifica Firma Digitale" digitando poi il "Numero di Polizza" e il "Codice controllo" riportati su questo documento.

Mod. ELB03 - Ed. 11/22

Pag. 1 di 1

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO



# SCHEMA TIPO 1.4 (d.m. 31/2018) GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO NUMERO 1999134

(Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

#### Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell'opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice.

#### Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;

b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità, allorché si estingue ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

#### Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è pari all'importo della rata di saldo erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture, e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (artt. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice). L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.

#### Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente, - recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e degli importi dovuti dal Contraente, ai sensi dell'art.

1.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

#### Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

#### Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

#### Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

#### Art. 8 - Rinvio alle norme di legge


Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

REVO Insurance S.p.A.

Firmato in Digitale da:

ALBERTO MINALI





#### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DELL'ASSICURATORE

resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000

Il sottoscritto Alberto Minali, (VR) – Viale dell'Agricoltura 7 (autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo Cauzioni ed Altri Danni ai Beni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 03 giugno 2008, all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo Responsabilità Civile Generale con provvedimento ISVAP n. 2712 del 12 giugno 2009, all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo Infortuni, Incendio ed Elementi Naturali ed al Ramo Assistenza con provvedimento IVASS 0214274/16 del 16 novembre 2016, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami Malattia, Corpi di veicoli terrestri - esclusi quelli ferroviari, Corpi di veicoli ferroviari, Corpi di veicoli marittimi, Iacustri e fluviali, Merci trasportate, Responsabilità civile aeromobili, Responsabilità civile veicoli marittimi, Iacustri e fluviali - limitatamente alla responsabilità del vettore, Credito e Perdite pecuniarie e dell'attività riassicurativa nei rami Infortuni, Incendio ed elementi naturali, Altri danni ai beni e Responsabilità civile generale con provvedimento IVASS n. 0067277/22 del 29 marzo 2022), consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace,

#### **DICHIARA**

che, in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 30 novembre 2021, in estratto autentico a cura del Dott. Marco Ferrari, Notaio in Milano, Repertorio n° 6452, è legittimato ad esercitare atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare a sottoscrivere polizze assicurative, comprese fideiussioni, per tipologia e importi richiesti.

**REVO INSURANCE S.P.A.** 

Firmato in Digitale da:
ALBERTO MINALI

Mod. ELB602 - Ed. 11/22

Pag. 1 di 1

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO
