

KEY PLAN/SECTION

CLIENTE/CLIENT

COMUNE DI GENOVA
AREA TECNICA



DIREZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE
SETTORE ATTUAZIONE OPERE IDRAULICHE

FIRMA/SIGNAT.

[Handwritten signature]



NUMERO/NUMBER

0

PROGETTISTA/DESIGNER



PLANNING & MANAGEMENT S.r.l.

Via Corsica, 2/15 - 16128 Genova
Tel. 010 588149 Fax 010 594422
e-mail info@pmingegneria.it

ING. CESARE GEMME

COMMESSA/JOB

LOCALITA'/SITE


LAVORI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DELLA TOMBINATURA DEL
TORRENTE RIO TORRE DI QUEZZI (DETTO BISAGNETTO)-COD. GULP 12496
PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO/TITLE


CRONOPROGRAMMA

	SIGLA/INITIALS	DATA/DATE	SCALA/SCALE	FOR./SIZE	DOCUMENTO N./DOCUMENT Nr.	REV.	
DISEGN./DRAWN	E. S.	OTT .2016		A4	E630POGE001		
CONTR./CHECKED	L. M.	OTT .2016				foglio sheet 000	cont. su cont. on 000
APPROV./APPROV.	C. G.	OTT .2016					

LAVORI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DELLA TOMBINATURA DEL TORRENTE RIO TORRE DI QUEZZI (DETTO BISAGNETTO)

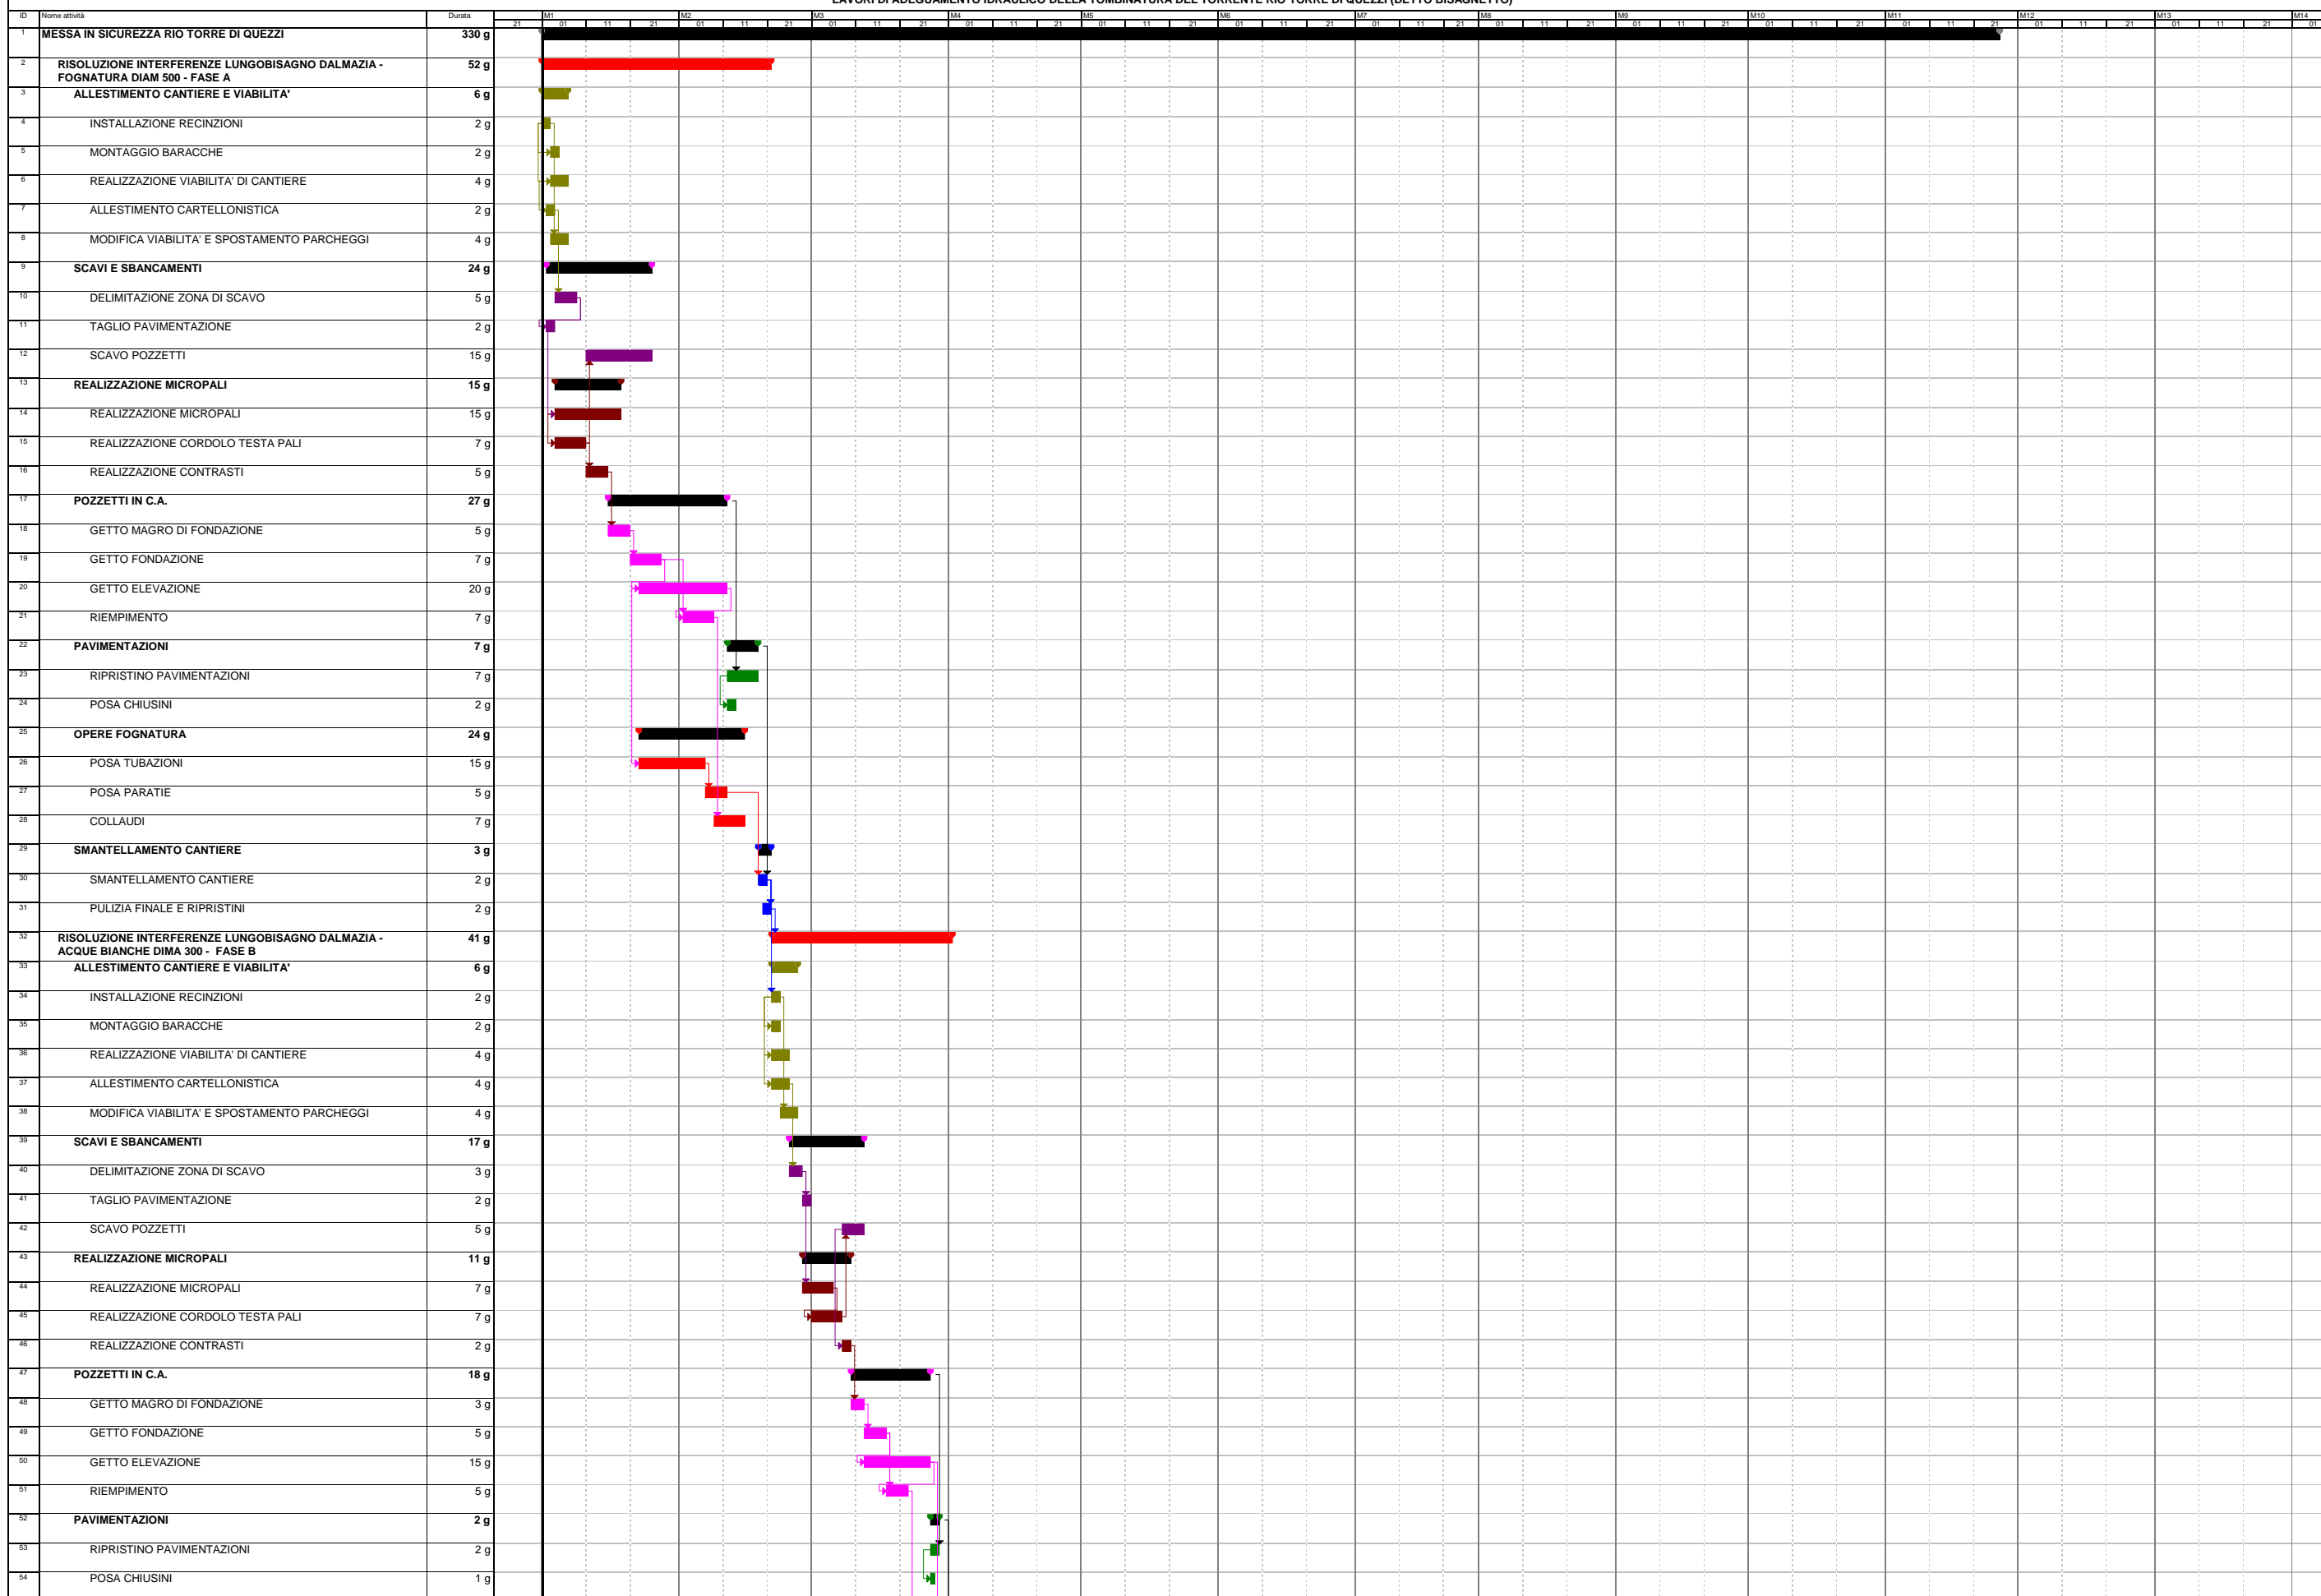

LAVORI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DELLA TOMBINATURA DEL TORRENTE RIO TORRE DI QUEZZI (DETTO BISAGNETTO)

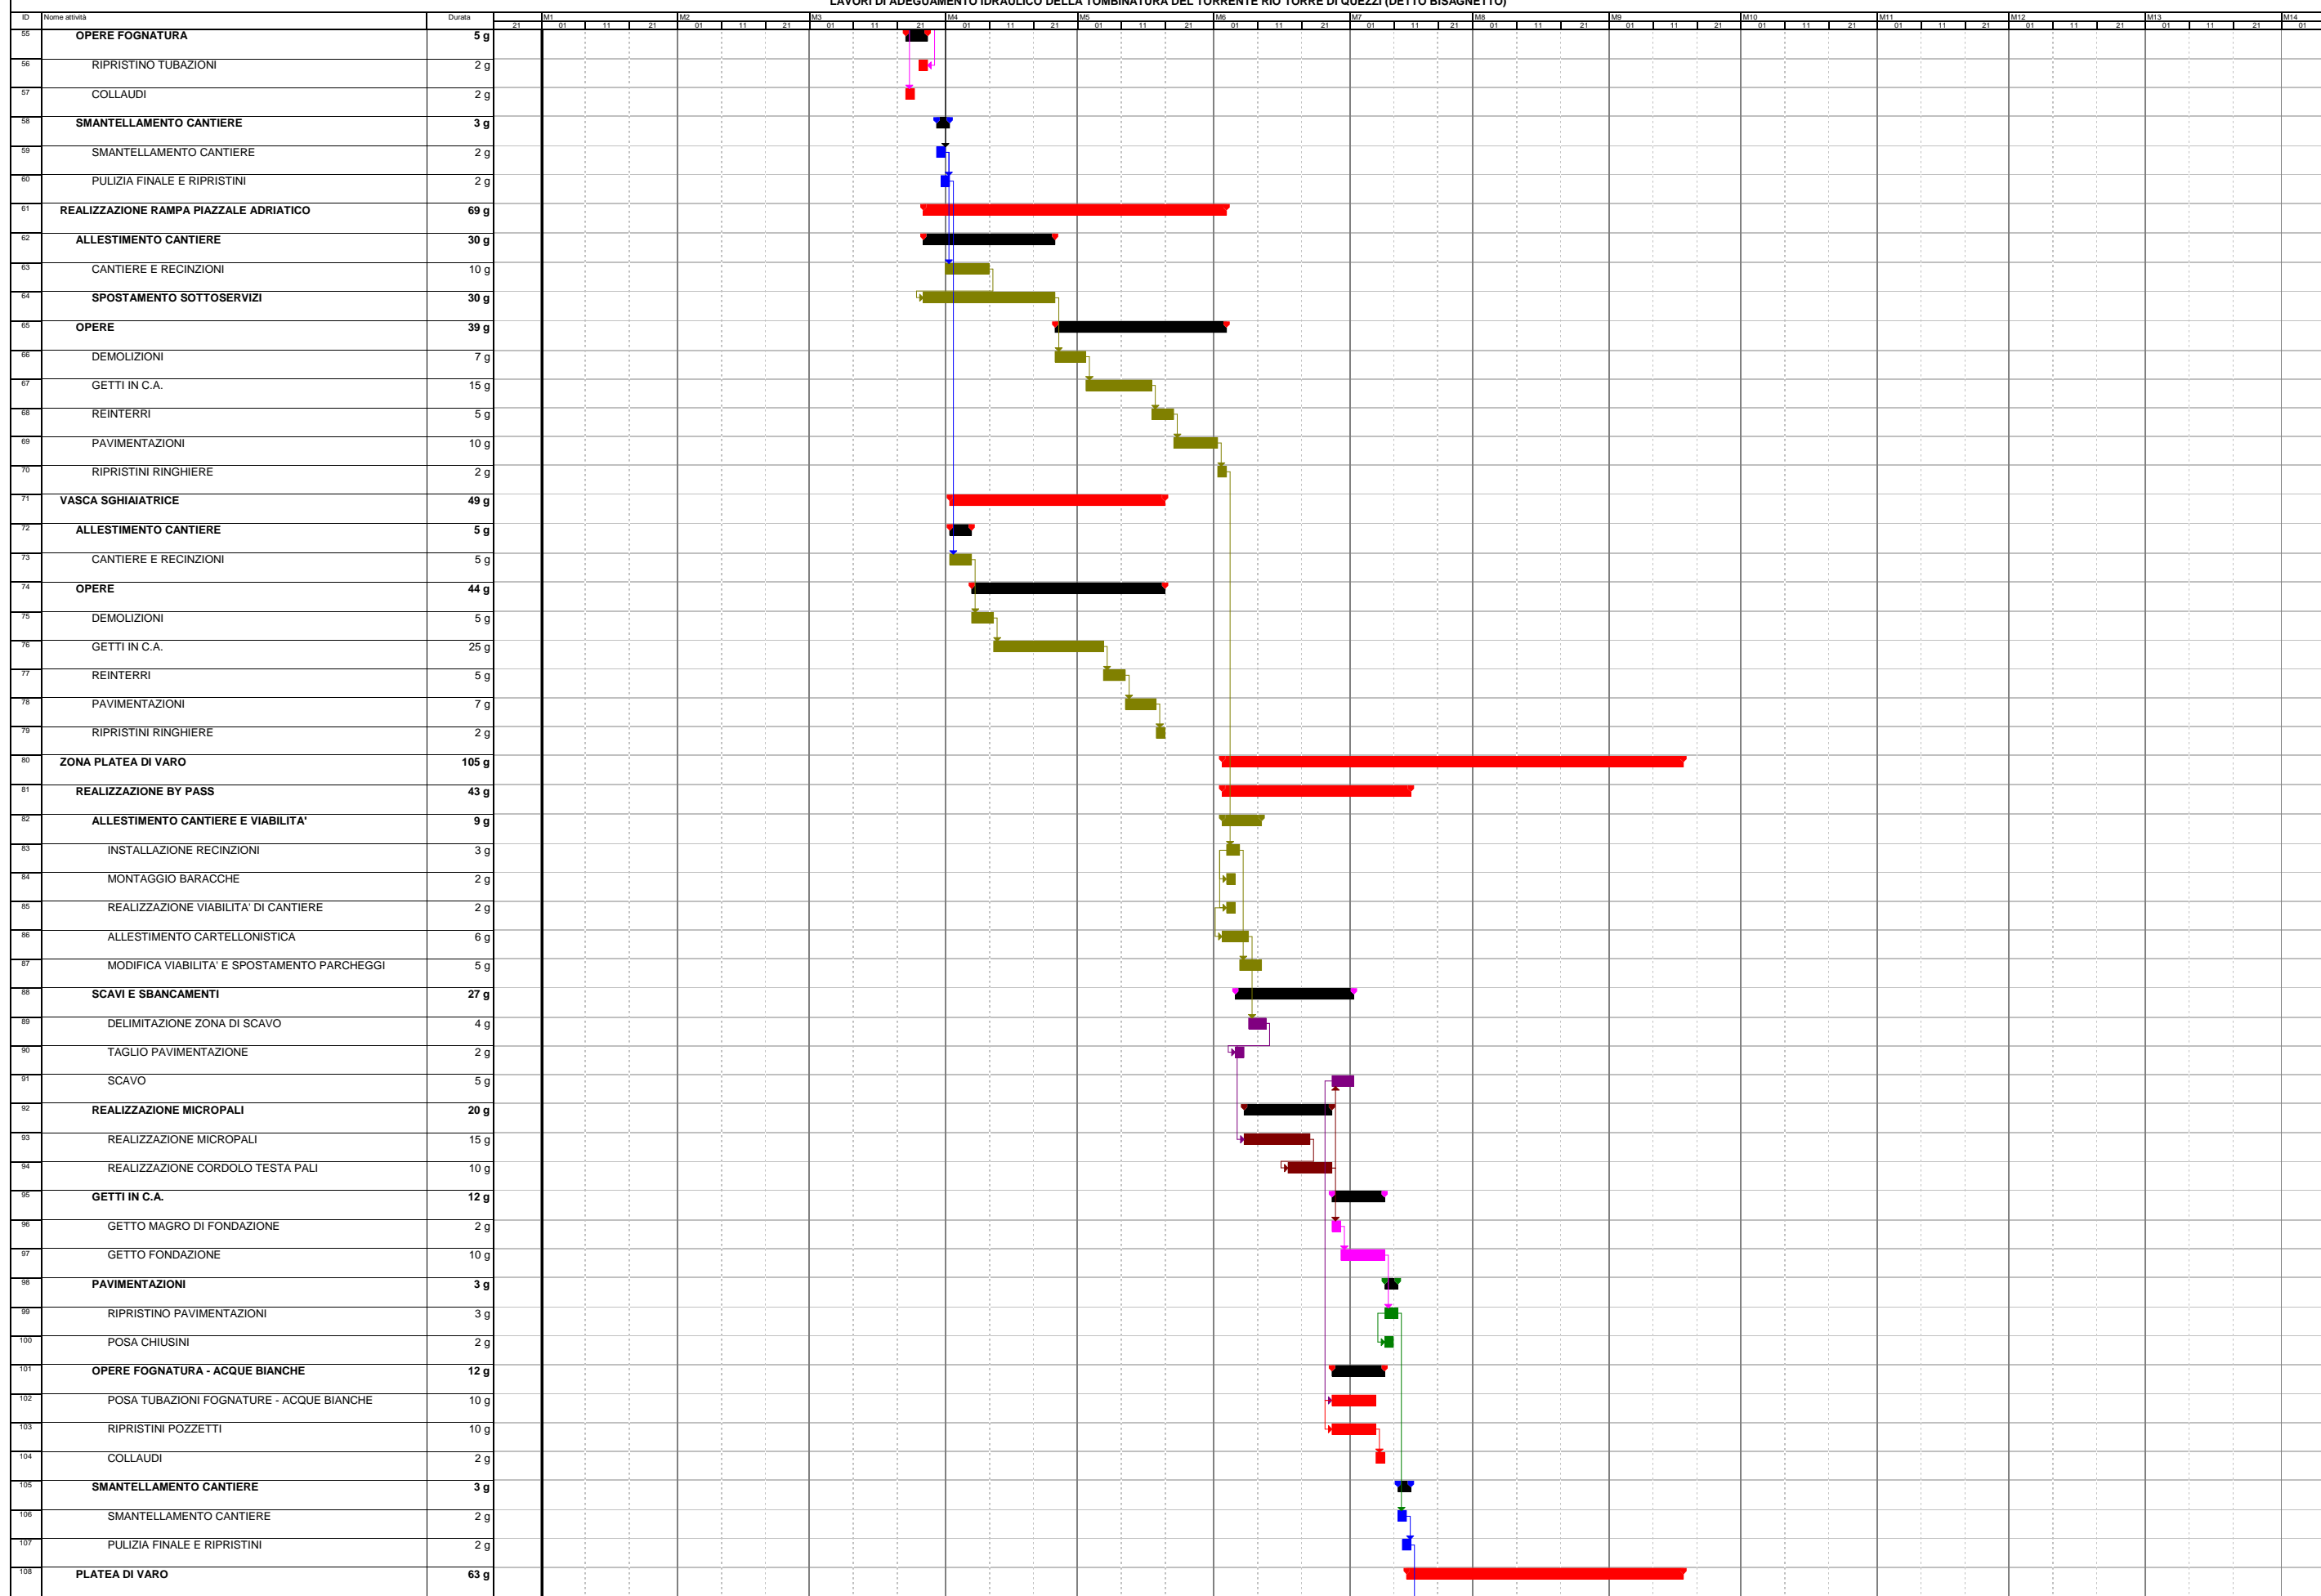

LAVORI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DELLA TOMBINATURA DEL TORRENTE RIO TORRE DI QUEZZI (DETTO BISAGNETTO)

ID	Nome attività	Durata	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14
109	ALLESTIMENTO CANTIERE E VIABILITA'	9 g														
110	INSTALLAZIONE RECINZIONI	3 g														
111	MONTAGGIO BARACCHE	2 g														
112	REALIZZAZIONE VIABILITA' DI CANTIERE	4 g														
113	ALLESTIMENTO CARTELLONISTICA	3 g														
114	MODIFICA VIABILITA' E SPOSTAMENTO PARCHEGGI	5 g														
115	SCAVI E SBANCAMENTI	13 g														
116	DELIMITAZIONE ZONA DI SCAVO	4 g														
117	TAGLIO PAVIMENTAZIONE	2 g														
118	SCAVO	10 g														
119	REALIZZAZIONE MICROPALI	9 g														
120	REALIZZAZIONE MICROPALI	7 g														
121	REALIZZAZIONE CORDOLO TESTA PALI	7 g														
122	GETTI IN C.A.	12 g														
123	GETTO MAGRO DI FONDAZIONE	2 g														
124	GETTO FONDAZIONE	10 g														
125	GETTO MURO REGGISPINTA	10 g														
126	PAVIMENTAZIONI	7 g														
127	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI	7 g														
128	POSA CHIUSINI	2 g														
129	MESSA IN SICUREZZA LINEA TERNA	7 g														
130	CONCI PREFABBRICATI	14 g														
131	POSA CONCI PREFABBRICATI	7 g														
132	SPINTA CONCI	7 g														
133	CONTROLLO SPINTA E SIGILLATURA CONCI	2 g														
134	SMANTELLAMENTO CANTIERE	3 g														
135	SMANTELLAMENTO CANTIERE	2 g														
136	PULIZIA FINALE E RIPRISTINI	2 g														
137	REALIZZAZIONE SCATOLARE PREFABBRICATO	98 g														
138	POSA PREFABBRICATO ZONA PLATEA VARO	8 g														
139	POSA CONCI	5 g														
140	SIGILLATURA CONCI	2 g														
141	IMPERMEABILIZZAZIONI	3 g														
142	REINTERRI	3 g														
143	POSA PREFABBRICATO TRA PICCH. 7 E 6	21 g														
144	SCAVI E SBANCAMENTI	7 g														
145	DELIMITAZIONE MURO REGGISPINTA	4 g														
146	TAGLIO PAVIMENTAZIONE	2 g														
147	SCAVO	4 g														
148	SCATOLARE	12 g														
149	GETTO MAGRO E POSA CONCI	7 g														
150	SIGILLATURA CONCI	2 g														
151	IMPERMEABILIZZAZIONI	5 g														
152	REINTERRI	3 g														
153	PAVIMENTAZIONI	3 g														
154	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI	3 g														
155	POSA CHIUSINI	2 g														
156	POSA PREFABBRICATO TRA PICCH. 6 E RAMPA PIAZZALE ADRIATICO	23 g														
157	ALLESTIMENTO CANTIERE E VIABILITA'	8 g														
158	INSTALLAZIONE RECINZIONI	3 g														
159	REALIZZAZIONE VIABILITA' DI CANTIERE	3 g														
160	ALLESTIMENTO CARTELLONISTICA	4 g														
161	MODIFICA VIABILITA' E SPOSTAMENTO PARCHEGGI	4 g														
162	SCAVI E SBANCAMENTI	7 g														

LAVORI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DELLA TOMBINATURA DEL TORRENTE RIO TORRE DI QUEZZI (DETTO BISAGNETTO)

ID	Nome attività	Durata	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14
163	DEMOLIZIONE MARCIAPIEDI	5 g														
164	TAGLIO PAVIMENTAZIONE	2 g														
165	SCAVO	4 g														
166	SCATOLARE	12 g														
167	GETTO MAGRO E POSA CONCI	7 g														
168	SIGILLATURA CONCI	2 g														
169	IMPERMEABILIZZAZIONI	5 g														
170	REINTERRI	3 g														
171	PAVIMENTAZIONI	5 g														
172	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI	5 g														
173	POSA CHIUSINI	2 g														
174	POSA PREFABBRICATO TRA PICCH. 4 E PICCH. 2	28 g														
175	ALLESTIMENTO CANTIERE E VIABILITA'	8 g														
176	INSTALLAZIONE RECINZIONI	3 g														
177	REALIZZAZIONE VIABILITA' DI CANTIERE	4 g														
178	ALLESTIMENTO CARTELLONISTICA	4 g														
179	MODIFICA VIABILITA' E SPOSTAMENTO PARCHEGGI	4 g														
180	SCAVI E SBANCAMENTI	7 g														
181	DEMOLIZIONE MARCIAPIEDI	5 g														
182	TAGLIO PAVIMENTAZIONE	2 g														
183	SCAVO	5 g														
184	SCATOLARE	11 g														
185	GETTO MAGRO E POSA CONCI	7 g														
186	SIGILLATURA CONCI	3 g														
187	IMPERMEABILIZZAZIONI	3 g														
188	REINTERRI	3 g														
189	PAVIMENTAZIONI	4 g														
190	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI	4 g														
191	POSA CHIUSINI	2 g														
192	POSA PREFABBRICATO TRA PICCH. 2 ED IMBOCCO VECCHIO SCATOLARE	31 g														
193	ALLESTIMENTO CANTIERE E VIABILITA'	8 g														
194	INSTALLAZIONE RECINZIONI	3 g														
195	REALIZZAZIONE VIABILITA' DI CANTIERE	3 g														
196	ALLESTIMENTO CARTELLONISTICA	3 g														
197	MODIFICA VIABILITA' E SPOSTAMENTO PARCHEGGI	4 g														
198	SCAVI E SBANCAMENTI	7 g														
199	DEMOLIZIONE MARCIAPIEDI	5 g														
200	TAGLIO PAVIMENTAZIONE	2 g														
201	SCAVO	5 g														
202	SCATOLARE	11 g														
203	GETTO MAGRO E POSA CONCI	7 g														
204	SIGILLATURA CONCI	3 g														
205	IMPERMEABILIZZAZIONI	3 g														
206	REINTERRI	3 g														
207	ZONA IMBOCCO DI MONTE	24 g														
208	DEMOLIZIONI	4 g														
209	GETTI IN C.A.	20 g														
210	PAVIMENTAZIONI	3 g														
211	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI	3 g														
212	POSA CHIUSINI	2 g														
213	SMANTELLAMENTO CANTIERE	9 g														
214	SMANTELLAMENTO CANTIERE E DEMOLIZIONE RAMPA	7 g														
215	PULIZIA FINALE E RIPRISTINI	3 g														

