




CANT A0 - FASE 0 - scala 1:500

- Realizzazione layout di cantiere
- Demolizione cordolo spartitraffico centrale
- Asfaltatura area interessata dal cordolo
- Realizzazione segnaletica orizzontale provvisoria

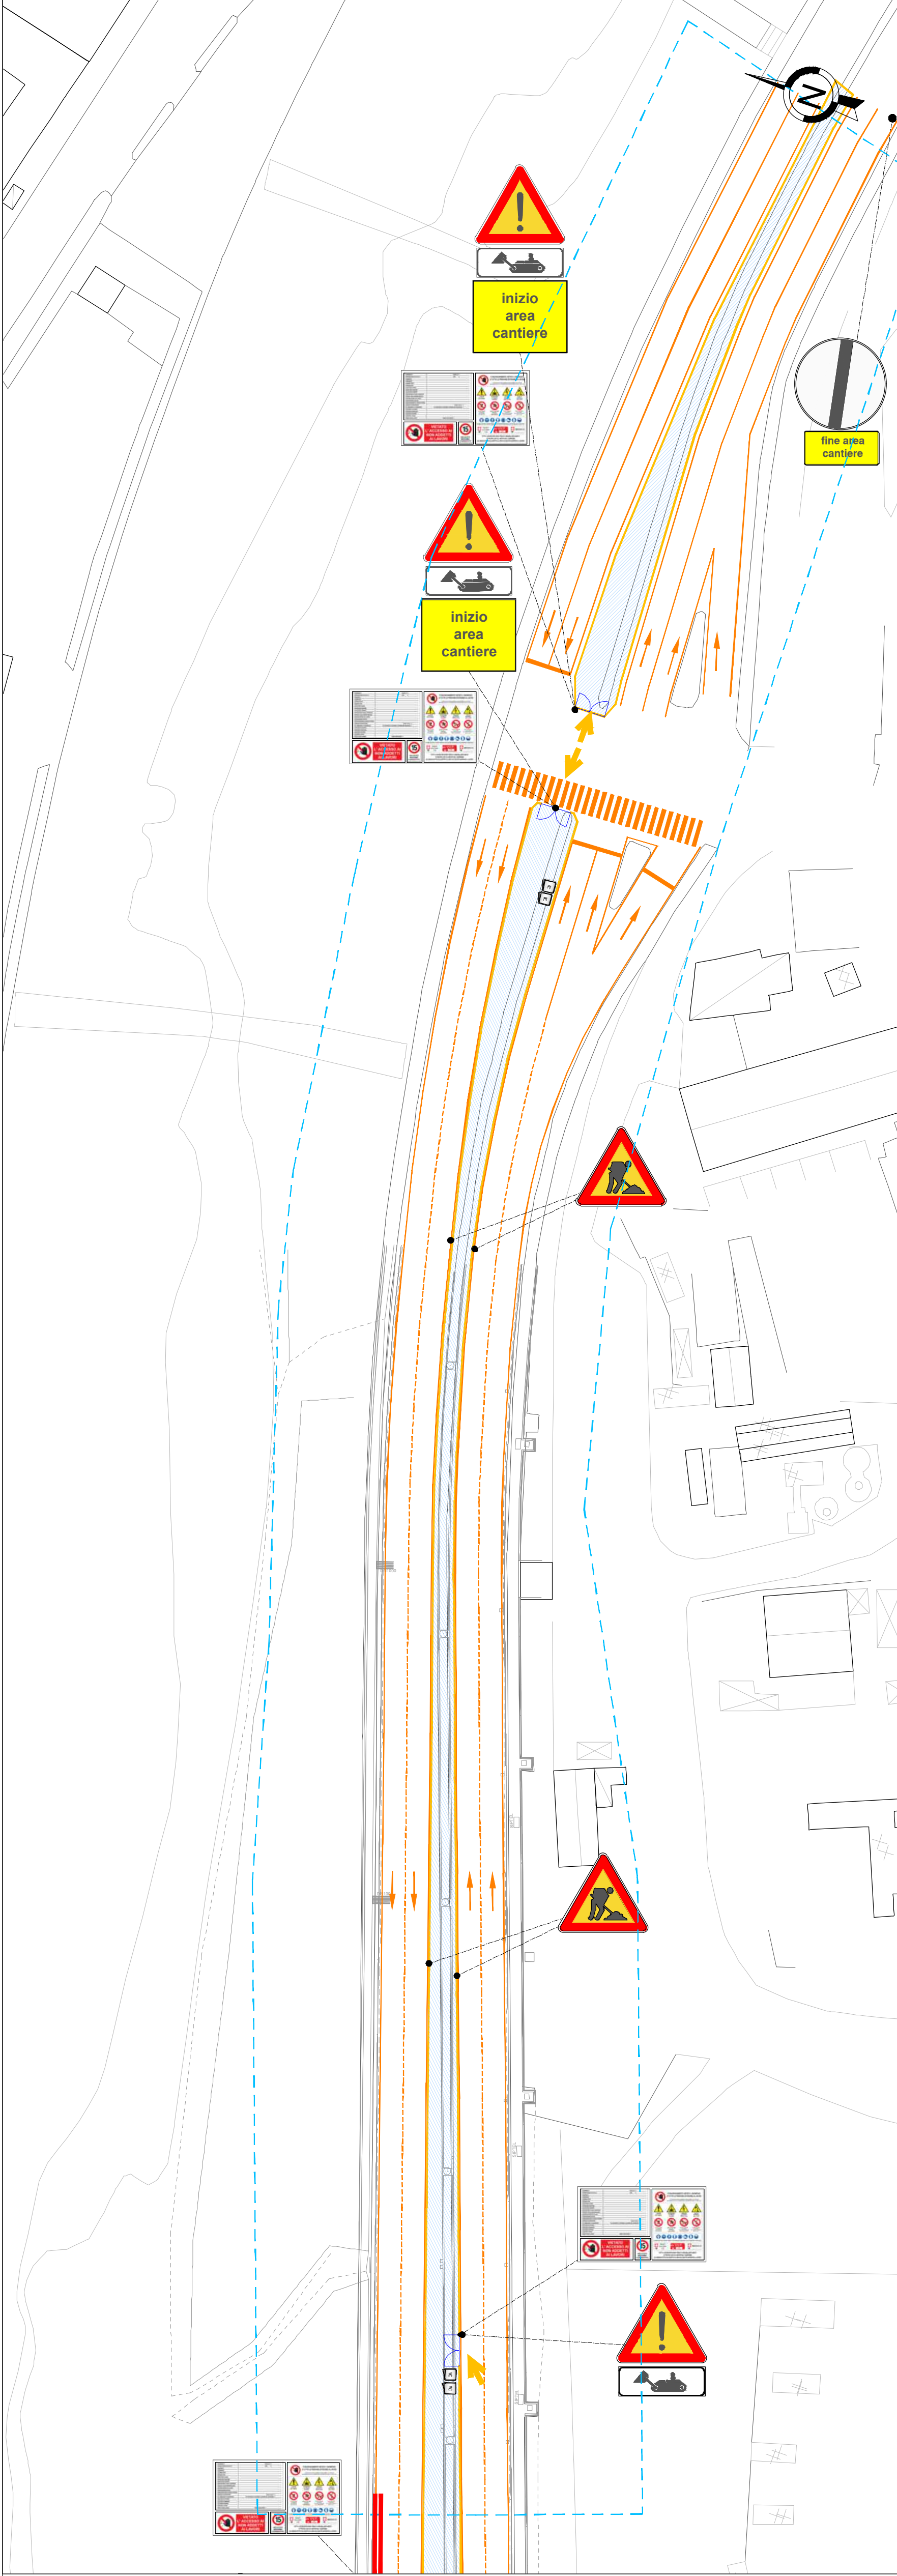

CANT A0 - FASE 1 - scala 1:500


- Realizzazione layout di cantiere
- modifica o realizzazione nuovi SSV
- Sistemazione marciapiedi nord

VIABILITA'

- Chiusura una corsia in direzione sud su via Gelasio Adamoli

VIABILITA' ALTERNATIVA

- Via Molassana

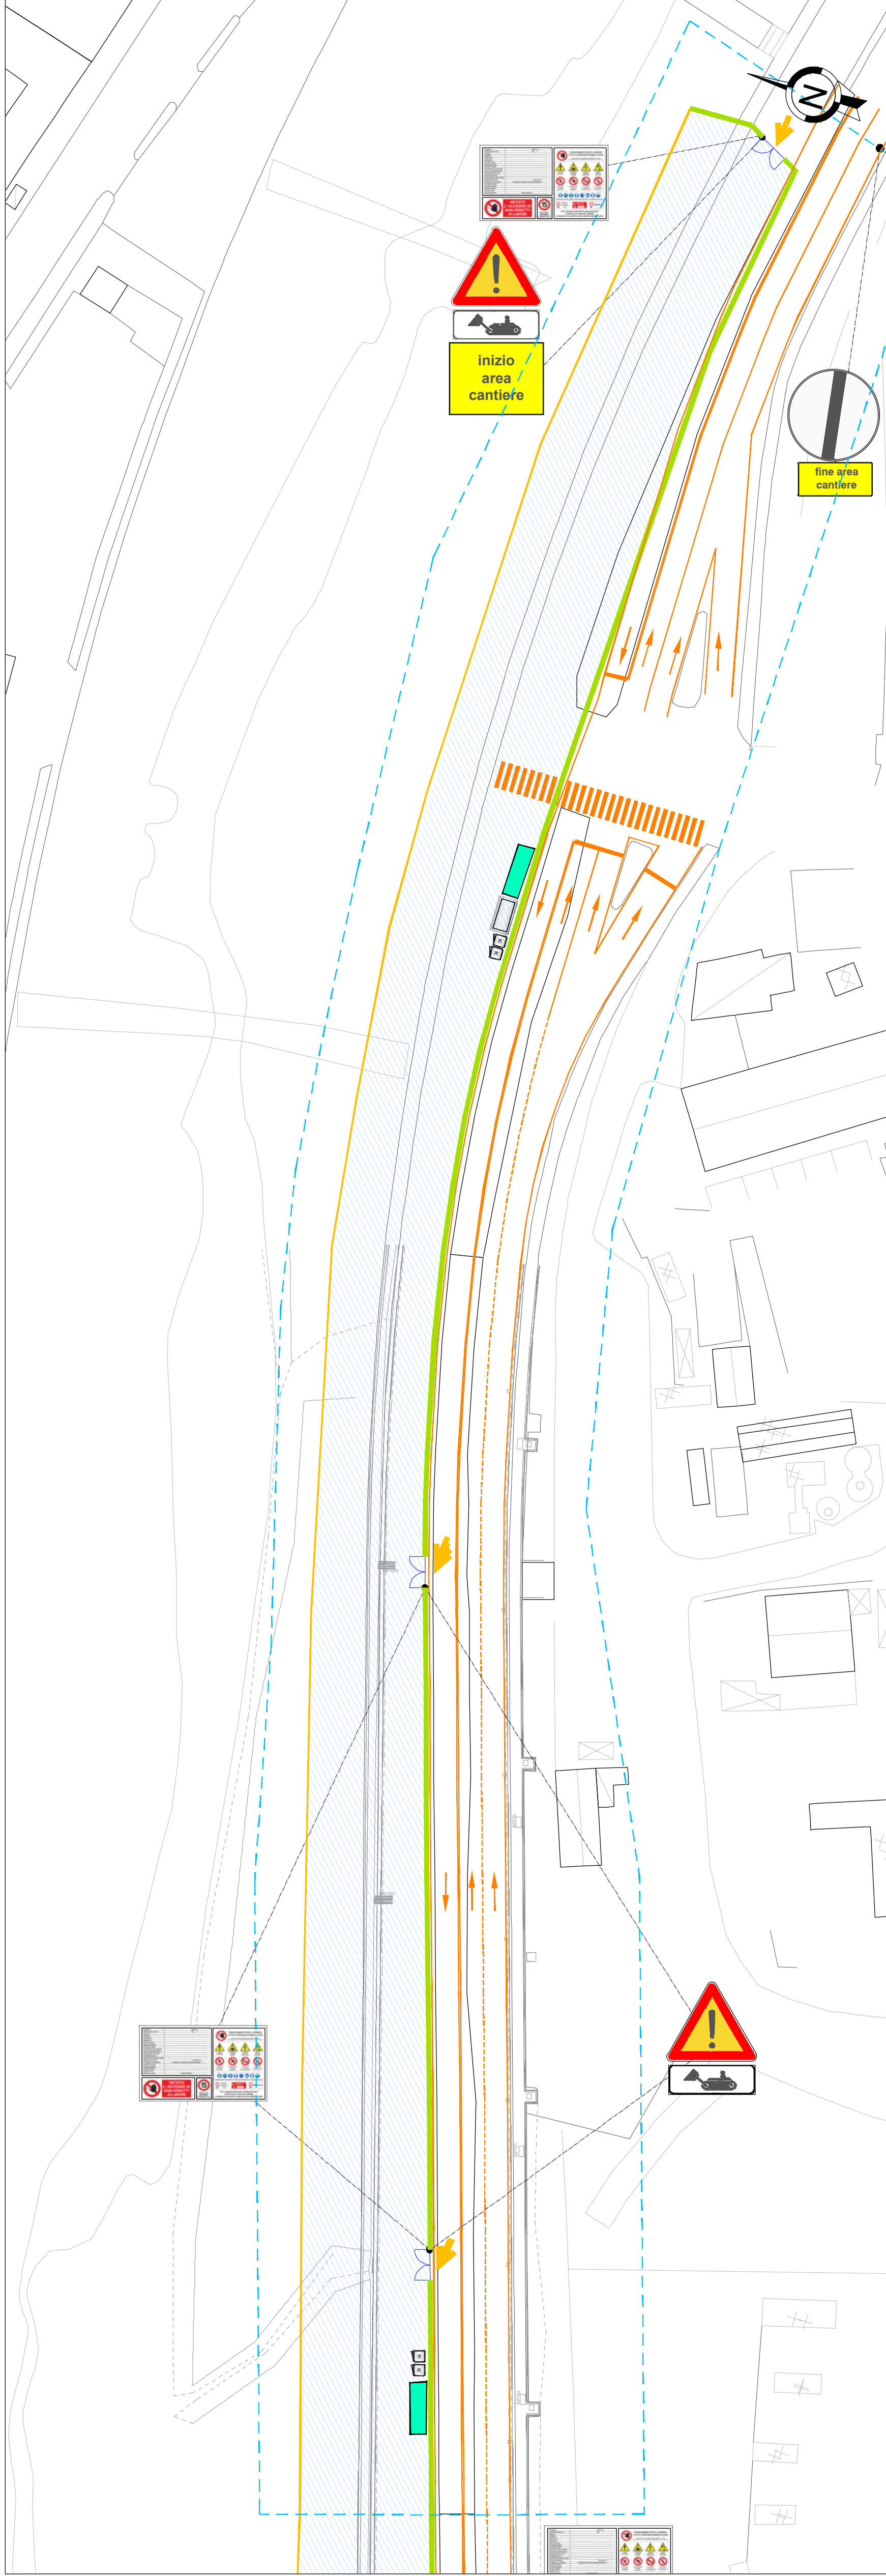

CANT A0 - FASE 2 - scala 1:500


- ampliamento cantiere all'interno dell'alveo
- Demolizioni porzioni di argine
- Realizzazioni pile e pulvino
- Realizzazioni sistemazioni urbane lato nord

VIABILITA'

- Chiusura una corsia in direzione sud su via Gelasio Adamoli

VIABILITA' ALTERNATIVA

- Via Molassana

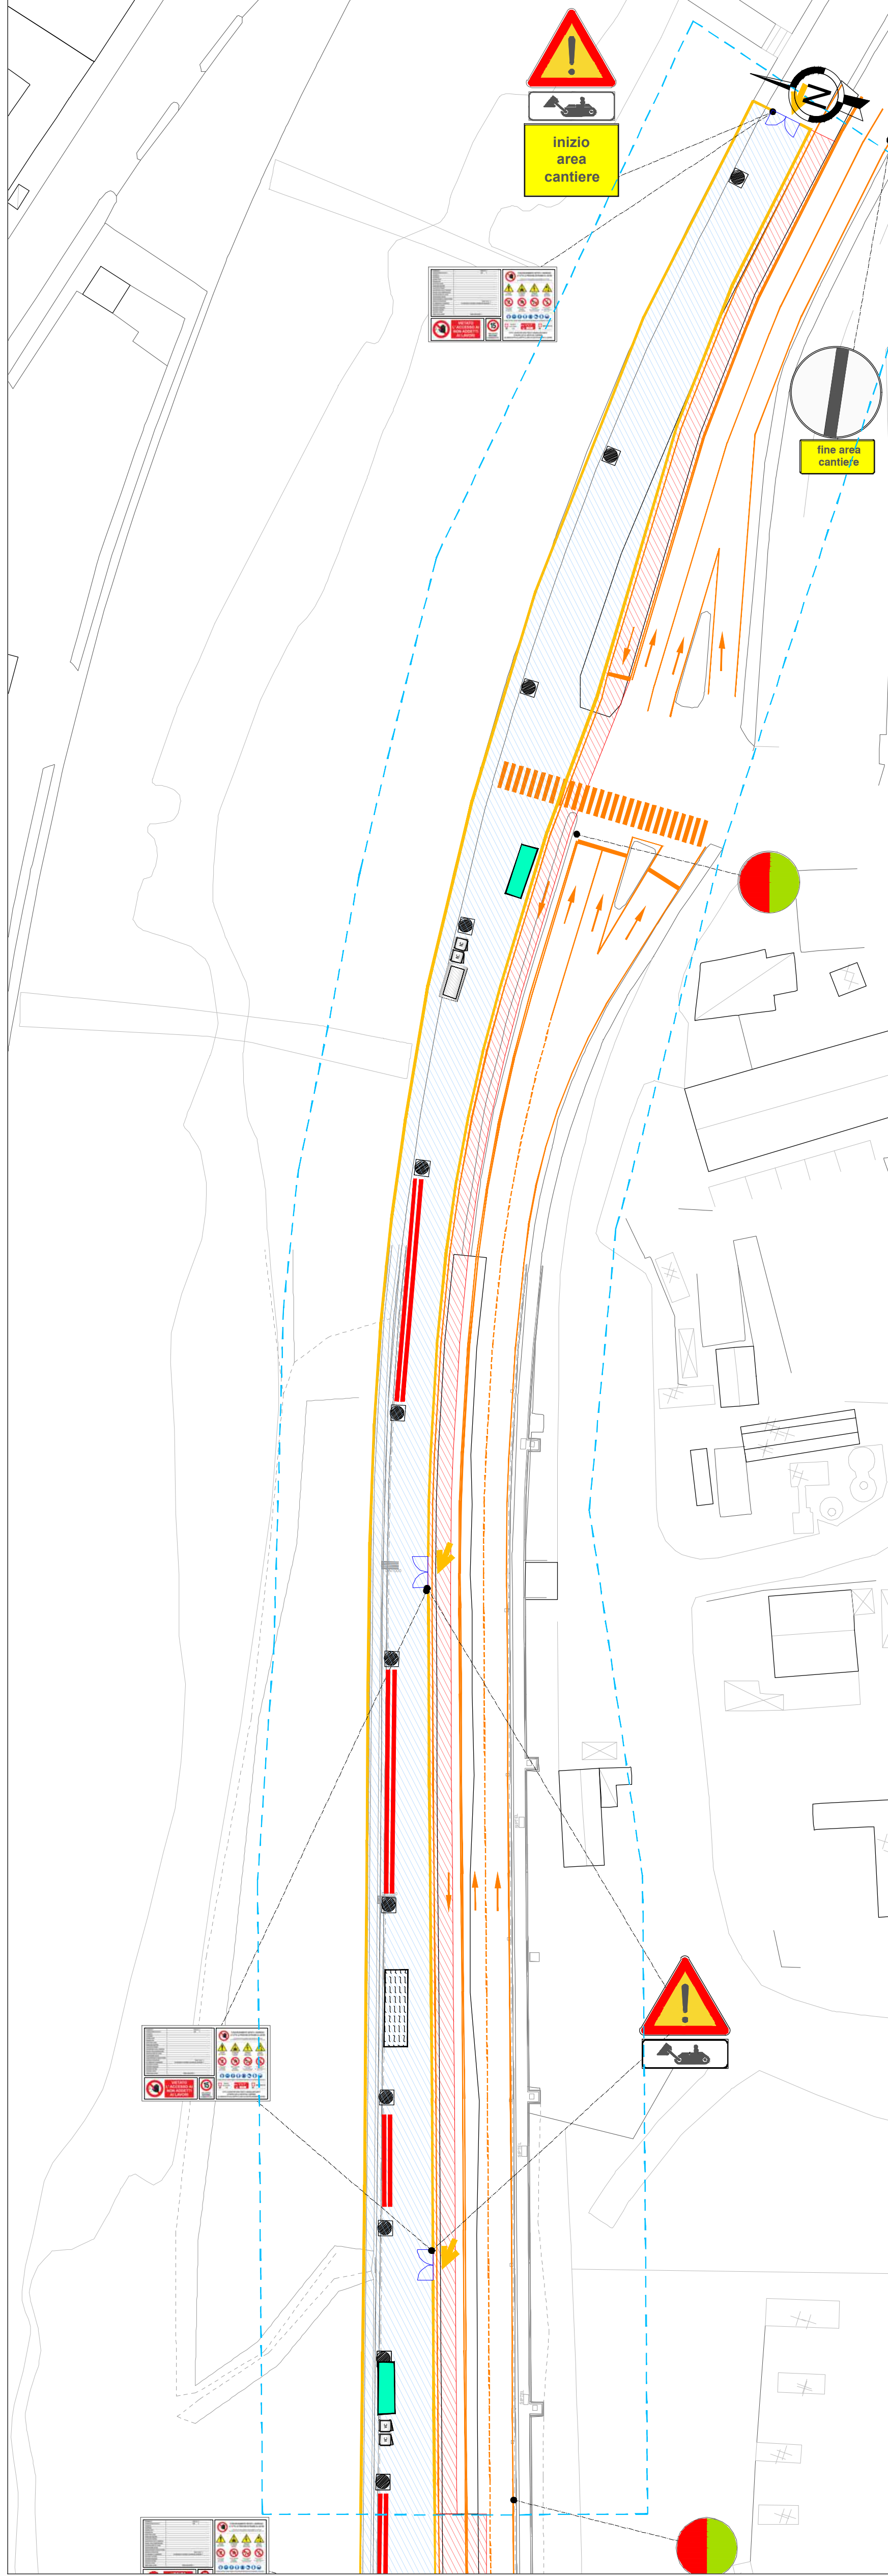

CANT A0 - FASE 3 - scala 1:500


- Ampliamento per porzioni del cantiere, con conseguente diminuzione della sezione stradale e istituzione di senso unico alternato in notturna.
- Costruzione e posa degli impalcati, con posa notturna dello stesso per tratti, attraverso la chiusura di una porzione di carreggiata e il posizionamento di movieri per il controllo del traffico a senso alternato.
- Realizzazione delle travature di collegamento e della soletta degli impalcati
- Realizzazione OO.CC. stazione

VIABILITA'

- Chiusura una corsia in direzione sud su via Gelasio Adamoli

VIABILITA' ALTERNATIVA

- Via Molassana

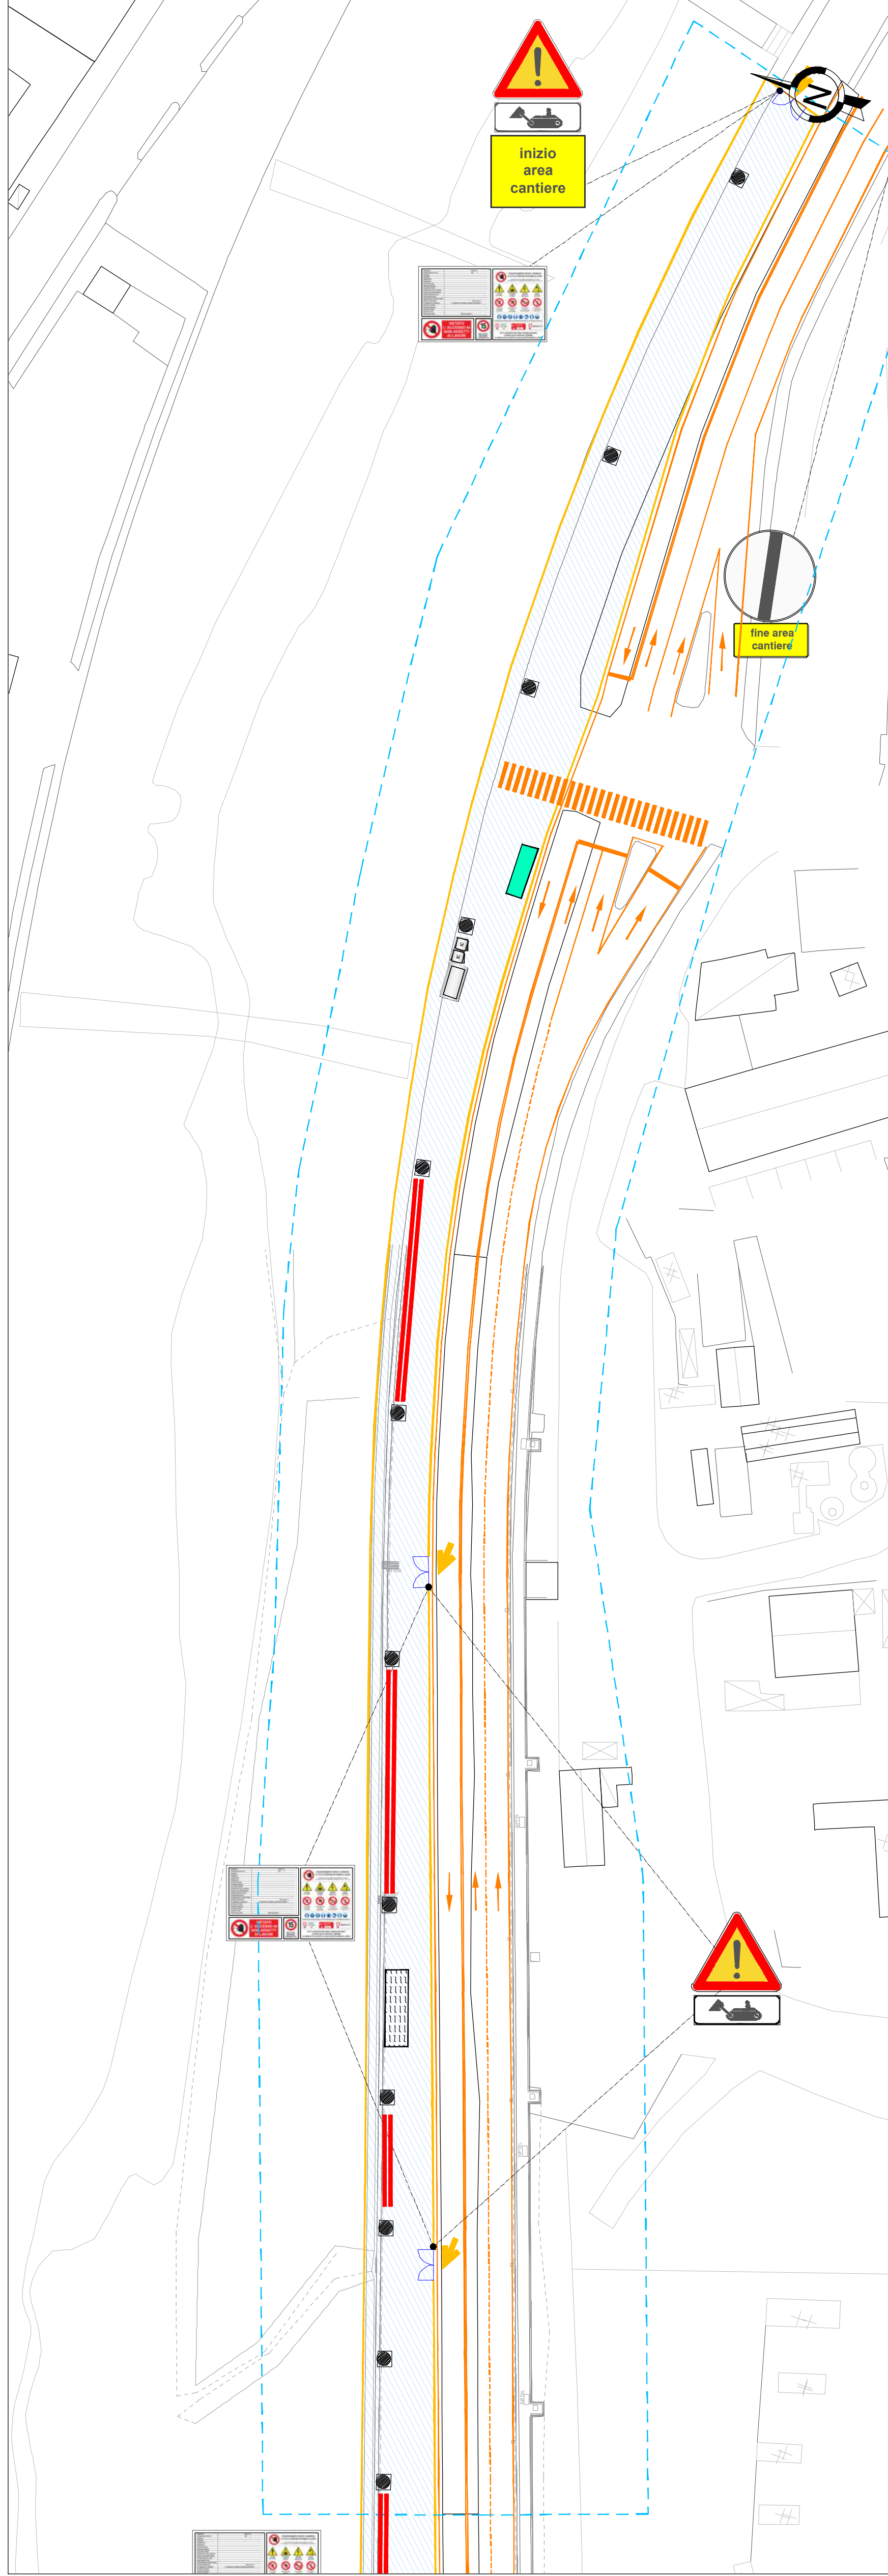

CANT A0 - FASE 4 - scala 1:500

- Realizzazione armamento
- Realizzazione impianti
- realizzazione finiture
- Completamento stazione

VIABILITA'

- Chiusura una corsia in direzione sud su via Gelasio Adamoli

VIABILITA' ALTERNATIVA

- Via Molassana

Legenda

Ingombro cantiere		Area di cantiere temporanea		Recinzione leggera		New Jersey in plastica		Box di cantiere		Area stoccaggio materiali		Moviere	
Area di cantiere		Recinzione pesante		Cancello di cantiere		WC di cantiere		Entrata/Uscita cantiere		Ponteggio		Ponteggio autosollevante monocolonna	

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	07/03/2025	Adeguamento al parere del CSLPP e altri Enti e allineamento progetto	A. Cacciatore	D. Salvo	S. Caminelli	P. Cucino							
Rev.	Date	Descrizione	Rivisto	Verificato	Approvato	Autorizzato							

Progetto 12	Responsabile Unico del Progetto Ing. E. Scardelli	Responsabile Unico del Progetto Ing. E. Scardelli	Responsabile Unico del Progetto Ing. E. Scardelli	Responsabile Unico del Progetto Ing. E. Scardelli	Responsabile Unico del Progetto Ing. E. Scardelli	Responsabile Unico del Progetto Ing. E. Scardelli	Responsabile Unico del Progetto Ing. E. Scardelli	Responsabile Unico del Progetto Ing. E. Scardelli	Responsabile Unico del Progetto Ing. E. Scardelli	Responsabile Unico del Progetto Ing. E. Scardelli	Responsabile Unico del Progetto Ing. E. Scardelli	Responsabile Unico del Progetto Ing. E. Scardelli	Responsabile Unico del Progetto Ing. E. Scardelli
Carta 19	Scale: 1:500	Data: 07/03/2025	Commissa	Fase	Lotto	Disciplina	WBS	Tipo	Numero	Foglio	Rev.		
			MGE1	P4	LV	SIC	COM	T	006	00	A		
