



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Finanziato dal Unione Europea dell'iniziativa NextGenerationEU
Misura M2C2 - 4.2 Sviluppo trasporto rapido di Massa

CUP B31E20000230001

COMMITTENTE:



COMUNE DI GENOVA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ALBERTO BITOSSI
IL DIRETTORE ESECUTORE DEL CONTRATTO
ANTONIO ROSSA

**PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA PER IL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (RETE FILOVIARIA E STRUTTURE
CONNESSE)**

PROGETTAZIONE

MANDATARIA



MANDANTE

MANDANTE

MANDANTE



TECHNITAL


DEPOSITO STAGLIENO - OFFICINA PARCHEGGIO
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE
Dott. Ing. Alessandro Peresso


SCALA :

-

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
E 2 1 D	0 0	D	Z 1	D X	C A 0 0 0 0	0 0 2	A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione a seguito CdS	TECHNITAL	06/2023	S. Noto	06/2023	M. Marinelli	06/2023	A. Peresso Giugno 2023 



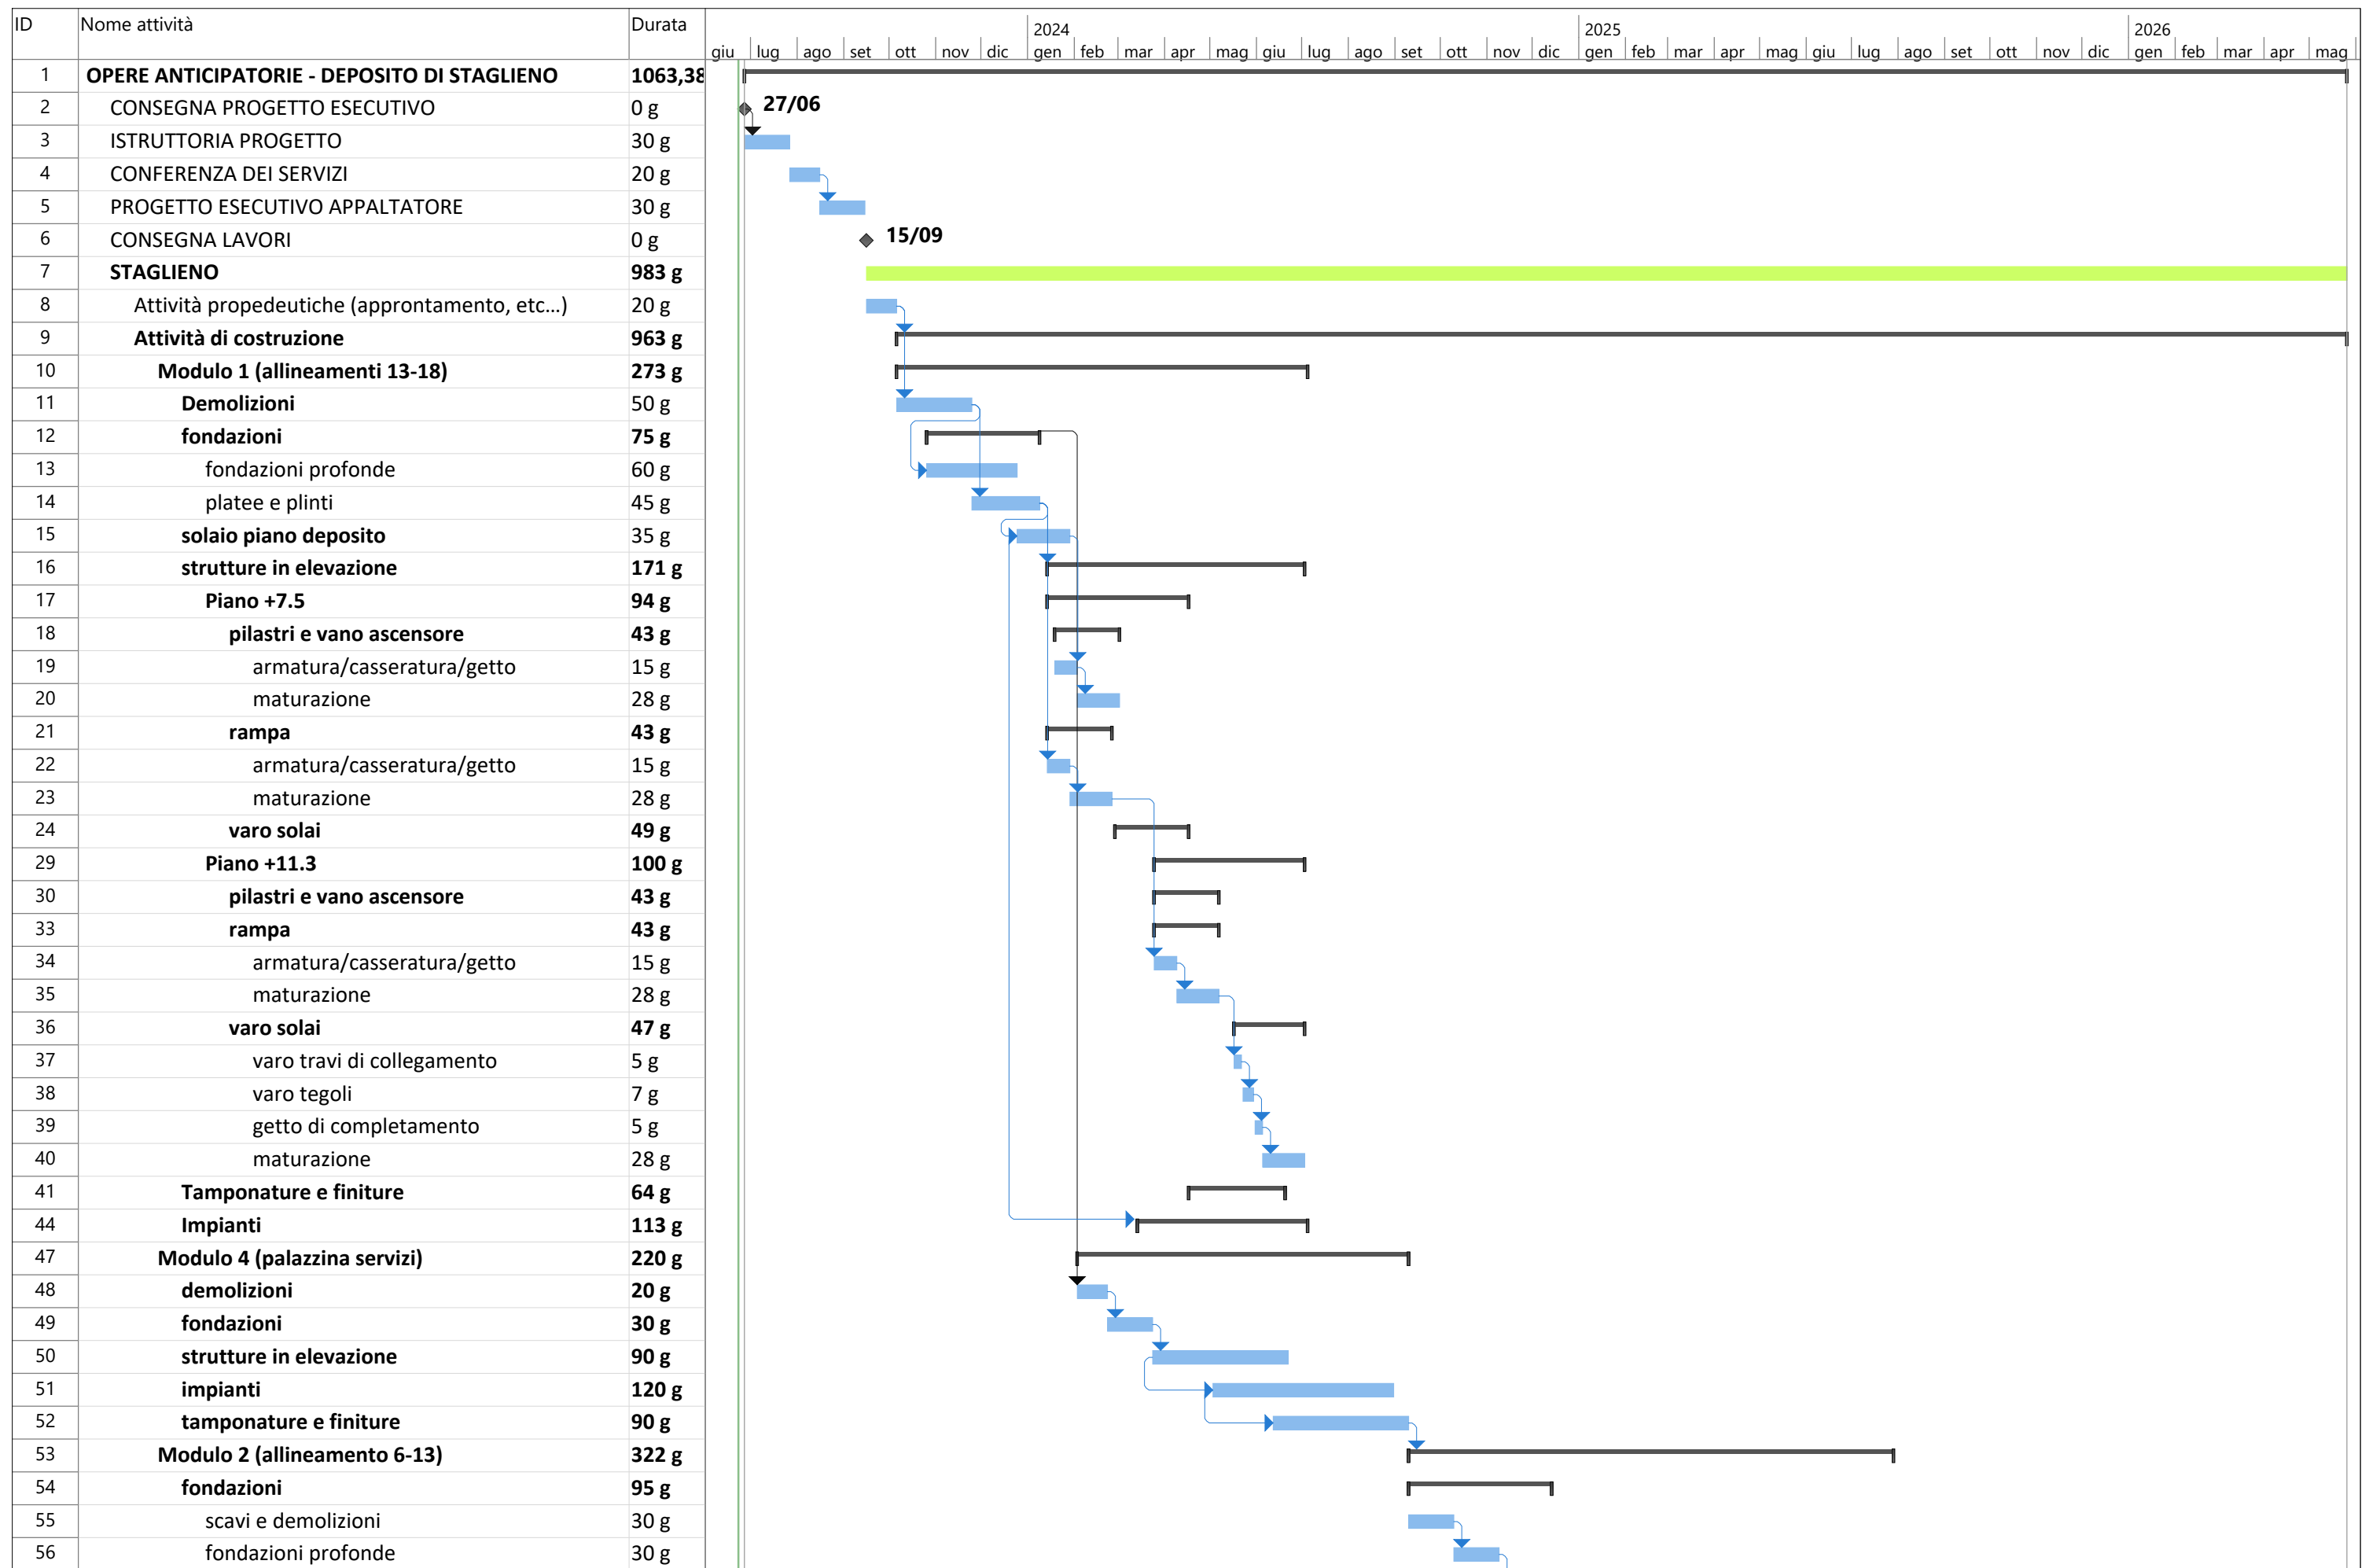

ID	Nome attività	Durata	2024												2025					2026					
			giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr
104	varo travi di collegamento	5 g																							
105	varo tegoli	7 g																							
106	getto di completamento	5 g																							
107	maturazione	28 g																							
108	Piano +11.3	80 g																							
109	pilastrini e vano ascensore	33 g																							
110	armatura/casseratura/getto	5 g																							
111	maturazione	28 g																							
112	varo solai	47 g																							
113	varo travi di collegamento	5 g																							
114	varo tegoli	7 g																							
115	getto di completamento	5 g																							
116	maturazione	28 g																							
117	Piano +15	80 g																							
118	pilastrini e vano ascensore	33 g																							
119	armatura/casseratura/getto	5 g																							
120	maturazione	28 g																							
121	varo solai	47 g																							
122	varo travi di collegamento	5 g																							
123	varo tegoli	7 g																							
124	getto di completamento	5 g																							
125	maturazione	28 g																							
126	Tamponature e finiture	151 g																							
127	<Nuova attività>	0 g																							
128	<Nuova attività>	0 g																							
129	Impianti	136 g																							
130	<Nuova attività>	0 g																							
131	<Nuova attività>	0 g																							
132	Completamento finiture esterne	90 g																							
133	Completamento impianti	90 g																							
134	Attrezzaggio officina	180 g																							
135	COLLAUDI	45 g																							

