REVISIONE	DATA	OGGETTO DELLA REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	VERIFICATO	APPROVATO
3	120706	seconda emissione	Claudio Cuda	P. Montaldo	Alfonso Femia	Alfonso Femia
2	120523	seconda revisione	Claudio Cuda	P. Montaldo	Alfonso Femia	Alfonso Femia

C O M U N E D I G E N O V A

AREA LAVORI PUBBLICI E POLITICHE DELLA CASA

Coordinatore:
arch. Laura Petacchi

STRUTTURA DI STAFF **P R O G E T T A Z I O N E**

Dirigente:
arch. Mirco Grassi

Committente
DIREZIONE NUOVE E GRANDI OPERE

Direttore:
ing. Walter Rupalti

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO — ing. Walter Rupalti

progettazione architettonica integrata

5+1AA
Alfonso Femia Gianluca Peluffo
architectures

via interiano 3/11, 16124 genova tel. 010.540095 fax 010.5702094
via cadolini 32/38, 20137 milano tel. 02.54019701 fax 010.54115512
55 rue des petites écuries, 75010 paris tel +331.42462894
progettazione@5piu1aa.com www.5piu1aa.com
5+1AA agenzia di architettura alfonso femia gianluca peluffo srl

progettazione strutturale e viabilistica
I QUADRO INGEGNERIA SRL
ing. Stefano Migliaro - ing. Luca Romano
Via Interiano 3/11b, 16124 Genova, tel.010/8690578 fax 010/8690690
tecnico@iquadro.org www.iquadro.org

progettazione impiantistica
AI studio e AI Engineering s.r.l.
Via Lamarmora 80, 10128 Torino, tel.011/5814511 fax 011/5683482
info@aigroup.it www.aigroup.it

Computi Metrici CAPITOLATI — Ai Engineering, torino

Coordinatore per la SICUREZZA *(in fase di Progettazione)* — 5+1AA _ arch. Alfonso Femia

Studi e Indagini GEOLOGICHE — Geologo Enrico Verrando Terra s.r.l.

Progetto PREVENZIONE INCENDI — Ai Engineering, torino

Progetto VEGETAZIONALE — 5+1AA + dr.agr. Carlo Benelli

Rilievi — Geom. Umberto Barillari, Camogli (GE)
Geom. Severino Cipollina, Ufficio Topografico, Comune di Genova

Intervento Opera
P.O.R. LIGURIA 2007-2013 - Asse 3
Ambito di MOLASSANA
GENOVA

Municipio
IV - Valbisagno — **IV**

Quartiere
MOLASSANA — **19**

N° Progr.Tav. | N° TOT.Tav.

Scala | Data
LUG 2012

Oggetto

CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Tavola N°

02

E-Rel

LIVELLO DI PROGETTAZIONE — ESECUTIVO — **RELAZIONE**

serie elaborati
relazione

I DISEGNI E LE INFORMAZIONI IN ESSI CONTENUTE SONO PROPRIETA' ESCLUSIVA DEL COMUNE DI GENOVA E NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, RIPRODOTTI, RESI PUBBLICI O UTILIZZATI PER USI DIFFERENTI DA QUELLI PER CUI SONO STATI REDATTI, SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA.

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori
1	**AREA FISSA DI CANTIERE**	**30 g**	**lun 27/02/12**	**ven 06/04/12**	
2	installazione cantiere	30 g	lun 27/02/12	ven 06/04/12	
3	demolizioni preliminari	30 g	lun 27/02/12	ven 06/04/12	
4	**MONITORAGGIO EDIFICI**	**305 g**	**lun 27/02/12**	**ven 26/04/13**	
5	Installazione strumentazione	15 g	**lun 27/02/12**	ven 16/03/12	
6	Attività di monitoraggio	290 g	**lun 19/03/12**	ven 26/04/13	5
7	**POR-6**	0 g	ven 24/02/12	ven 24/02/12	
8	**PARCHEGGIO**	**305 g**	**lun 27/02/12**	**ven 26/04/13**	
9	area fissa di cantiere	10 g	lun 27/02/12	ven 09/03/12	
10	nuova rampa di accesso	7 g	lun 27/02/12	mar 06/03/12	9II
11	utilizzo rampa esistente	68 g	lun 25/06/12	mer 26/09/12	28
12	**ZONA DI MONTE**	**295 g**	**lun 12/03/12**	**ven 26/04/13**	
13	FASE 1-demolizione fabbricato esistente	30 g	lun 12/03/12	ven 20/04/12	10
14	FASE 2a-rilevato per posizionamento macchina (materiale da fase 3)	20 g	lun 23/04/12	ven 18/05/12	13
15	FASE 2b-realizzazione diaframmi	30 g	lun 23/04/12	ven 01/06/12	26;14II
16	FASE 2c-fognatura bianca utilizzando parte del rilevato della fase 2a	15 g	lun 04/06/12	ven 22/06/12	15
17	FASE 3-scavo per la realizzazione della platea nuovo parcheggio	45 g	lun 23/04/12	ven 22/06/12	13
18	FASE 4-platea in c.a. e fondazione muri tensiter	30 g	lun 25/06/12	ven 03/08/12	17
19	FASE 5-posa muri tensiter	30 g	lun 06/08/12	ven 14/09/12	18
20	FASE 6-struttura prefabbricata	40 g	lun 17/09/12	ven 09/11/12	19
21	FASE 7-primo reinterro e posa barre diwidag	65 g	lun 06/08/12	ven 02/11/12	19II
22	FASE 8-completamento reinterro	65 g	lun 06/08/12	ven 02/11/12	21II
23	FASE 9-finiture interne	120 g	lun 12/11/12	ven 26/04/13	20
24	FASE 10-finiture superficiali	120 g	lun 12/11/12	ven 26/04/13	20
25	**ZONA RAMPA**	**188 g**	**mer 29/02/12**	**ven 16/11/12**	
26	FASE 1-diaframmi lato strada	10 g	lun 19/03/12	ven 30/03/12	
27	FASE 2-diaframmi livello superiore	10 g	lun 04/06/12	ven 15/06/12	15
28	FASE 3-sbancamento-demolizioni primo livello	5 g	lun 18/06/12	ven 22/06/12	27
29	FASE 4- barre diwidag livello superiore	5 g	lun 25/06/12	ven 29/06/12	28
30	FASE 5-diaframmi livello inferiore	10 g	lun 02/07/12	ven 13/07/12	29
31	FASE 6-dismissione area attrezzatura	5 g	lun 16/07/12	ven 20/07/12	30
32	FASE 7-sbancamento secondo livello	5 g	lun 23/07/12	ven 27/07/12	31
33	FASE 8-barre diwidag livello inferiore	5 g	lun 30/07/12	ven 03/08/12	32
34	FASE 9-demolizione struttura	5 g	lun 30/07/12	ven 03/08/12	32
35	FASE 10-deviazione canale	10 g	lun 06/08/12	ven 17/08/12	34
36	FASE 11-muri tensiter	5 g	lun 20/08/12	ven 24/08/12	35
37	FASE 12-reinterro fascia 10m	10 g	lun 27/08/12	ven 07/09/12	36
38	FASE 13-barre diwidag	10 g	lun 10/09/12	ven 21/09/12	37
39	FASE 14-struttura prefabbricata	10 g	lun 24/09/12	ven 05/10/12	38
40	FASE 15-finiture interne	30 g	lun 08/10/12	ven 16/11/12	39
41	FASE 16-finiture superficiali	30 g	lun 08/10/12	ven 16/11/12	39
42	**POR-1**	0 g	mer 29/02/12	mer 29/02/12	
43	**PONTE**	**135 g**	**lun 27/02/12**	**ven 31/08/12**	
44	FASE 1-berlinese per sostegno scavi-pila centrale	15 g	lun 27/02/12	ven 16/03/12	
45	FASE 1b-micropali e platea (cantiere viabilità spondale)	60 g	lun 19/03/12	ven 08/06/12	44
46	FASE 2-demolizione argine sponda dx (dall'alveo)-savanella	3 g	lun 19/03/12	mer 21/03/12	44
47	FASE 3- scavi per fondazioni spalle	15 g	gio 22/03/12	mer 11/04/12	46
48	FASE 4a-pali spalla destra ponte	10 g	gio 12/04/12	mer 25/04/12	47
49	FASE 4b-pali pila centrale ponte ponte	10 g	gio 26/04/12	mer 09/05/12	48
50	FASE 4c-pali spalla sinistra ponte	10 g	gio 10/05/12	mer 23/05/12	49
51	FASE 5a-plinto della spalla dx	20 g	gio 26/04/12	mer 23/05/12	48
52	FASE 5b-plinto della pila centrale	20 g	gio 10/05/12	mer 06/06/12	49
53	FASE 5c-plinto della spalla sx	15 g	gio 24/05/12	mer 13/06/12	50
54	FASE 6-demolizione parziale del marciapiede del ponte esistente	1 g	gio 14/06/12	gio 14/06/12	53
55	FASE 7a-spalla dx	10 g	gio 24/05/12	mer 06/06/12	51
56	FASE 7b-spalla pila centrale	10 g	gio 07/06/12	mer 20/06/12	55
57	FASE 7c- spalla sinistra	10 g	gio 21/06/12	mer 04/07/12	56
58	FASE 7d-muri tensiter (cantiere viabilità spondale)	10 g	lun 11/06/12	ven 22/06/12	45
59	FASE 7e-rilevato stradale (cantiere viabilità spondale)	20 g	lun 25/06/12	ven 20/07/12	58
60	FASE 8-posa impalcato dx	10 g	lun 23/07/12	ven 03/08/12	59
61	FASE 9-assemblaggio ponte strallato	3 g	lun 06/08/12	mer 08/08/12	60
62	FASE 10-impalcato: varo e 1°tesatura stralli	2 g	gio 09/08/12	ven 10/08/12	61
63	FASE 11-impalcato: posa coppelle e getto	3 g	lun 13/08/12	mer 15/08/12	62
64	FASE 12-impalcato: opere di completamento	10 g	gio 16/08/12	mer 29/08/12	63
65	FASE 13-impalcato: 2° tesatura stralli	2 g	gio 30/08/12	ven 31/08/12	64
66	**VIABILITA' SPONDALE**	**90 g**	**lun 30/07/12**	**ven 30/11/12**	
67	sistemazione superficiale	90 g	lun 30/07/12	ven 30/11/12	
68	**ROTONDA**	**260 g**	**sab 10/03/12**	**ven 08/03/13**	
69	fase 1	30 g	lun 05/11/12	ven 14/12/12	
70	fase 2	30 g	lun 17/12/12	ven 25/01/13	69
71	fase 3	30 g	lun 28/01/13	ven 08/03/13	70
72	**POR-2**	0 g	sab 10/03/12	sab 10/03/12	
73	**VIA MOLASSANA**	**145 g**	**lun 11/03/13**	**ven 27/09/13**	
74	sistemazione superficiale	145 g	lun 11/03/13	ven 27/09/13	

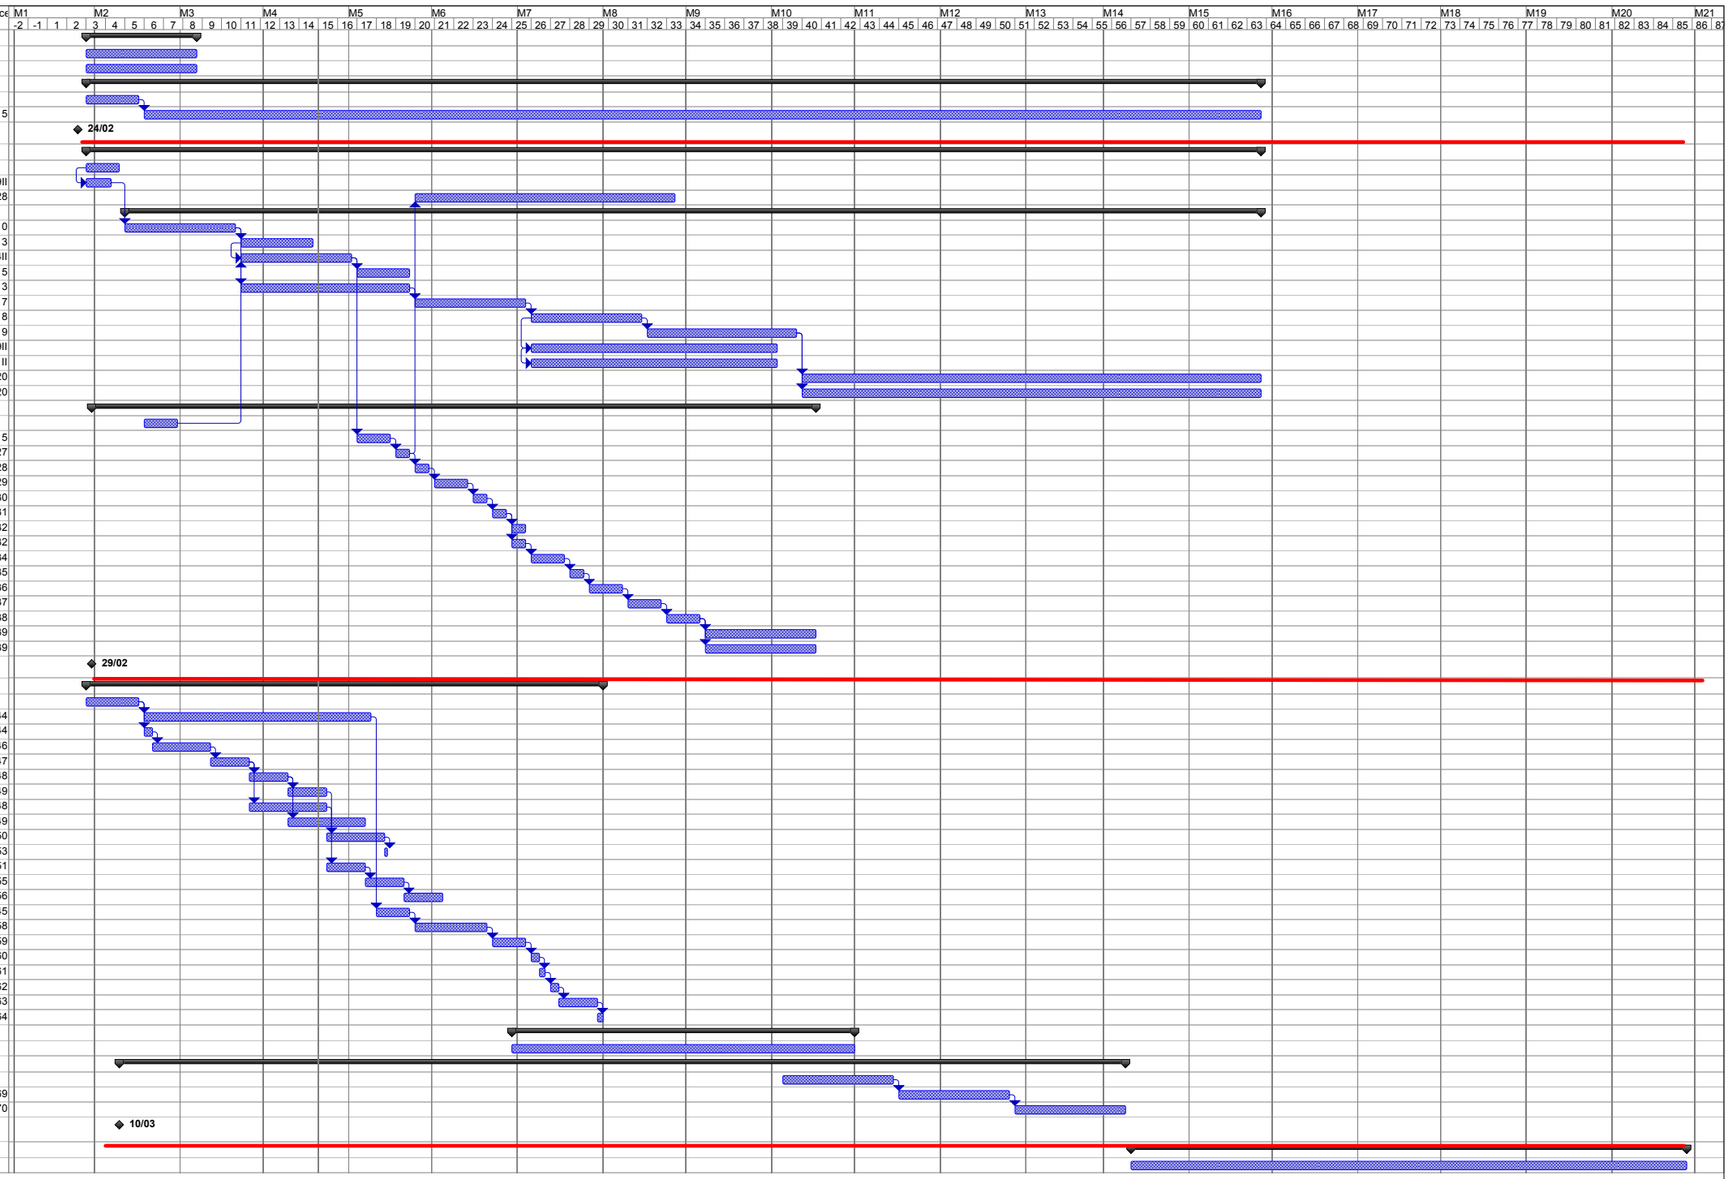

Progetto: GEMO-cronoprogramm
Data: lun 21/05/12

Attività · Divisione · Cardine · Riepilogo · Riepilogo progetto · Attività esterne · Cardine esterno · Attività inattiva · Attività inattiva · Cardine inattiva · Riepilogo inattiva · Attività manuale · Solo-durata · Riporto riepilogo manuale · Riepilogo manuale · Solo inizio · Solo-fine · Avanzamento · Scadenza
