ID	Nome attività	Durata
1	**durata totale lavori**	**90 g**
2	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	7 g
3	**DRENO L6**	**14 g**
4	realizzazione della perforazione e successivo alesaggio	4 g
5	preparazione dei materiali (tubo drenante e tubo camicia)	10 g
6	tiraggio	4 g
7	**DRENO L7**	**14 g**
8	realizzazione della perforazione e successivo alesaggio	4 g
9	preparazione dei materiali (tubo drenante e tubo camicia)	10 g
10	tiraggio	4 g
11	**DRENO L8**	**14 g**
12	realizzazione della perforazione e successivo alesaggio	4 g
13	preparazione dei materiali (tubo drenante e tubo camicia)	10 g
14	tiraggio	4 g
15	**DRENO L9**	**16 g**
16	preparazione della piazzola	2 g
17	realizzazione della perforazione e successivo alesaggio	4 g
18	preparazione dei materiali (tubo drenante e tubo camicia)	10 g
19	tiraggio	4 g
20	ripristino della piazzola	2 g
21	**DRENO L10**	**16 g**
22	preparazione della piazzola	2 g
23	realizzazione della perforazione e successivo alesaggio	4 g
24	preparazione dei materiali (tubo drenante e tubo camicia)	10 g
25	tiraggio	4 g
26	ripristino della piazzola	2 g
27	**DRENO L11**	**16 g**
28	preparazione della piazzola	2 g
29	realizzazione della perforazione e successivo alesaggio	4 g
30	preparazione dei materiali (tubo drenante e tubo camicia)	10 g
31	tiraggio	4 g
32	ripristino della piazzola	2 g
33	REALIZZAZIONE DELLE CONNESSIONI E DELLE LINEE DI CONVOGLIAMENTO	14 g
34	SMANTELLAMENTO CANTIERE	3 g

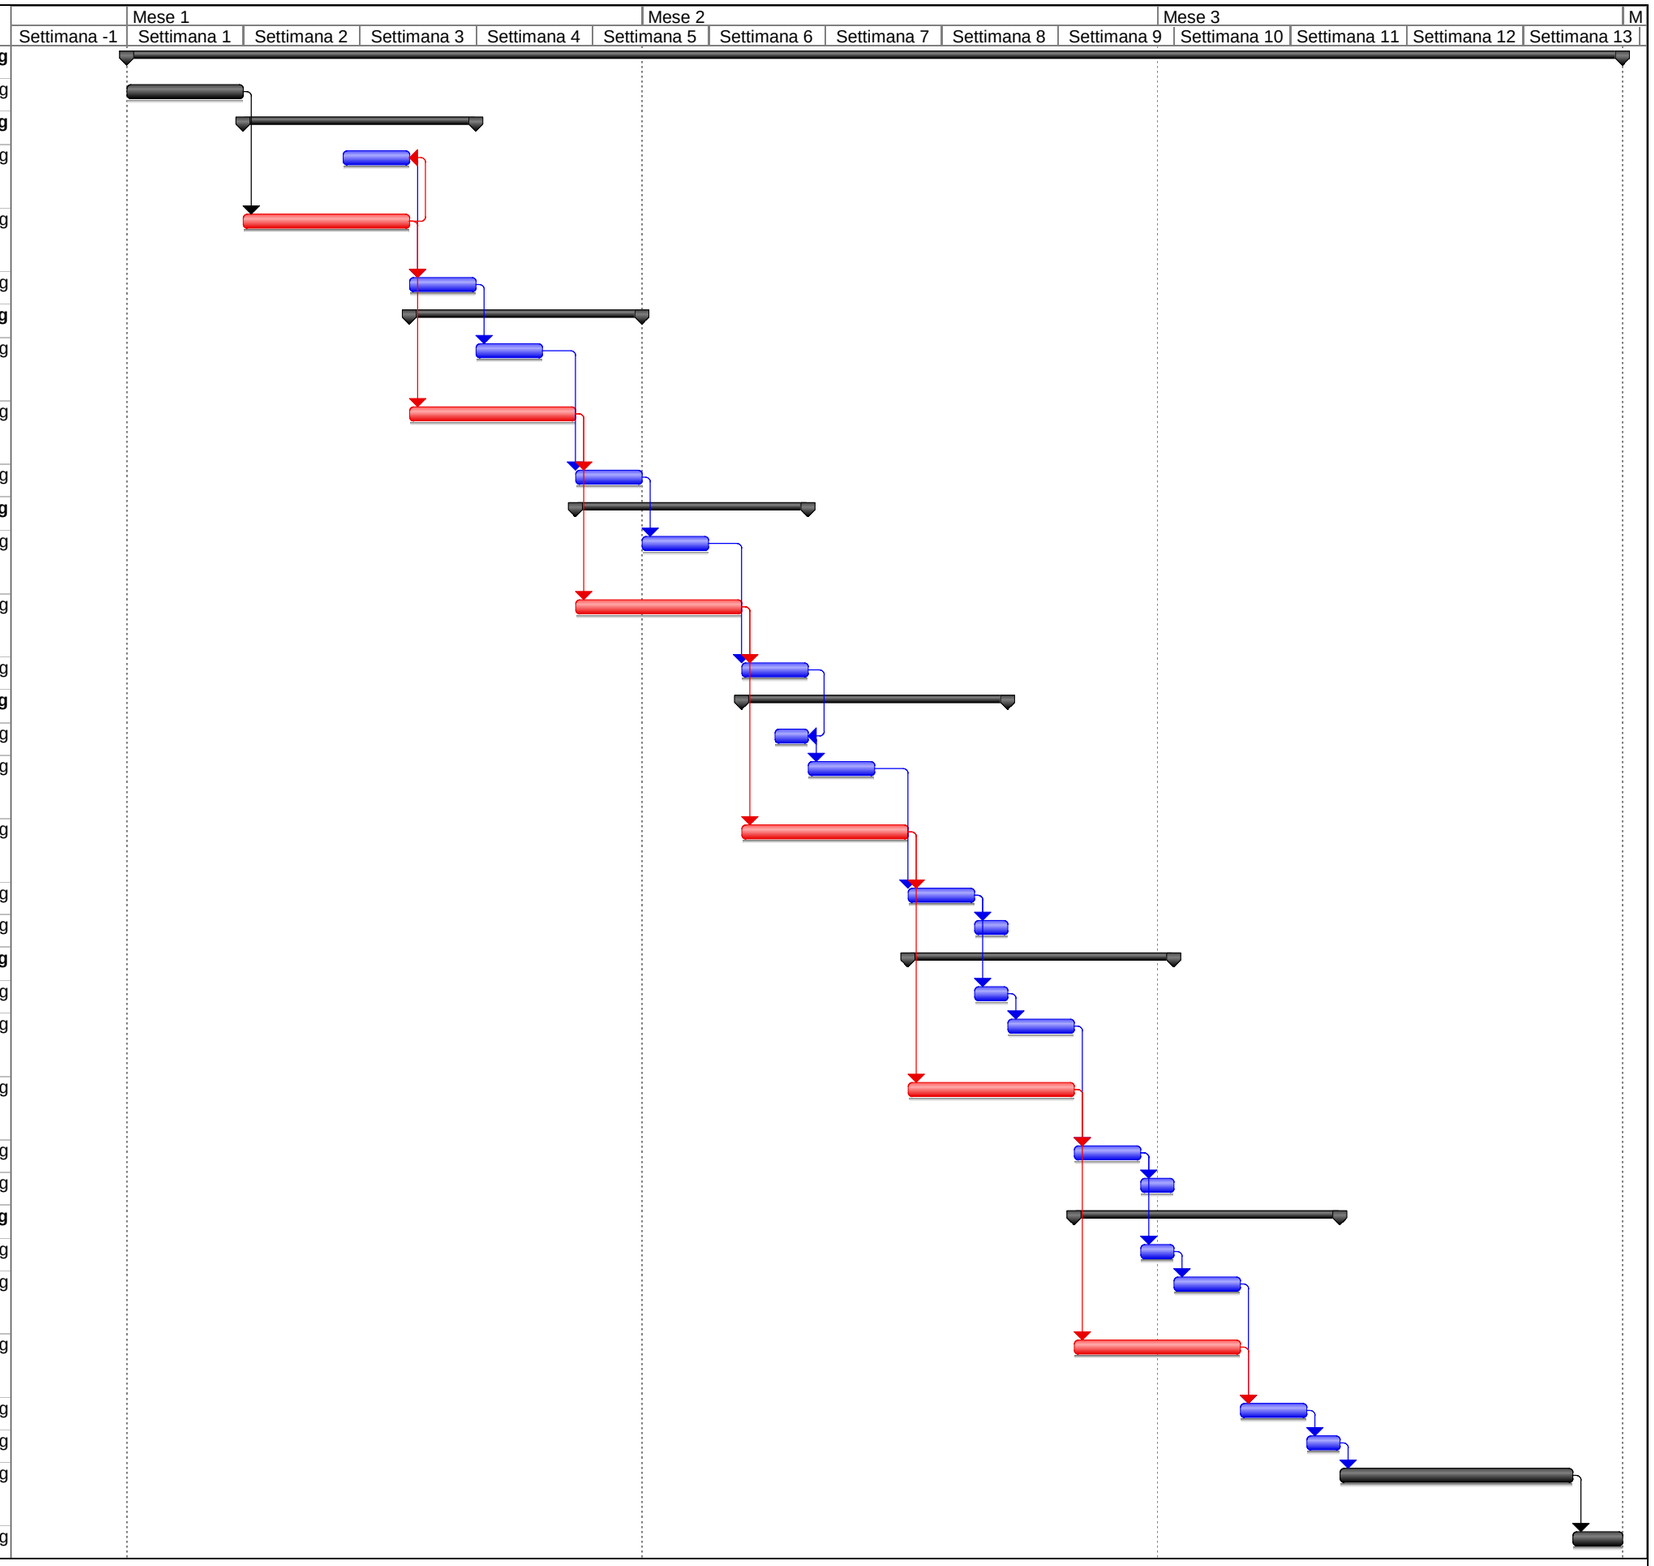

Progetto: Cronoprogramma E02
Data: mer 05/11/14

Attività | Avanzamento | Riepilogo | Attività esterne | Scadenza
Divisione | Cardine | Riepilogo progetto | Cardine esterno
